

【東日本大震災津波】社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

策定の趣旨

◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、身近な社会資本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・事業再開等を具体的に検討するためには、県民生活に身近な社会資本の復旧・復興の工程についての情報が不可欠です。

また、本格復興の着実な推進を、目に見える形で広く情報発信する必要があります。このため、県では、現時点における県民生活に身近な社会資本（主要8分野）の復旧・復興事業の動きや今後の見通しについて情報提供を行うものです。

なお、記載している工程等については、様々な要因により変更等が必要になる可能性があることから、定期的に最新のデータに更新していきます。

ロードマップの構成

◆ 主要8分野について掲載

- ① 海岸保全施設
- ② 復興まちづくり
- ③ 復興道路等
- ④ 災害公営住宅
- ⑤ 漁港
- ⑥ 港湾
- ⑦ 医療（病院、医科診療所）
- ⑧ 教育（小学校、中学校、高等学校）

◆ 総括と市町村別の2種類で構成

- 1 総括表
 - ① 復旧・復興事業の動き
 - ② 分野別の着工・完成箇所割合
 - ③ 事業計画掲載箇所一覧
 - ④ 復旧・復興ロードマップの見方
- 2 市町村別工程表
 - ① 各事業箇所の位置図
 - ② 年度別の整備スケジュール

ロードマップの更新

◆ 更新頻度

事業計画の策定や許認可に関する手続き、復旧・復興事業に係る工事が具体的に進捗してきていることから、その進捗状況を分かりやすくお知らせするため、四半期ごとに基準日を定め、定期的に最新のデータに更新していきます。

◆ 工程の主要な変更要因

- ① 自治体の職員の不足
 - ② 労働者と建設資材不足
 - ③ 用地取得期間の長期化
- 公表している工程を達成するためには、上記課題の解決が必要です。

◆ 情報発信


社会資本の復旧・復興ロードマップは、これまでに策定したものを併せ、県のホームページで公表しています。

(<http://www.pref.iwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html>)

復旧・復興事業の動き


◆ 前回の公表時点（基準日：平成25年12月31日）から、今回の更新までの期間の復興事業の進捗状況を『工事の着工と完成』に着目し整理しています。全箇所数：725箇所

◆ 着工箇所数

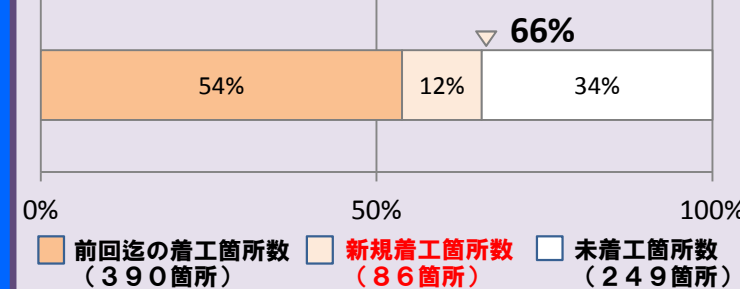

※ 着工：12%増加し、全箇所の66%


◆ 完成箇所数

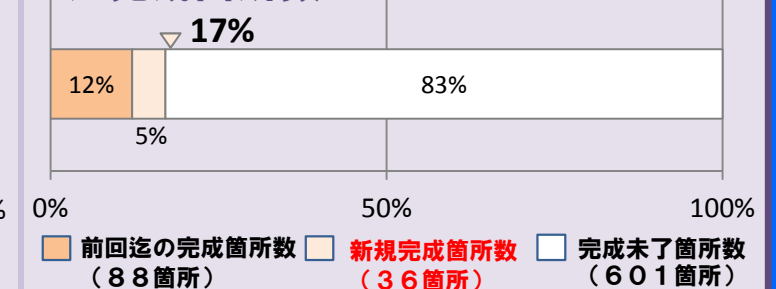

※ 完成：5%増加し、全箇所の17%

分野別の着工・完成箇所割合

◆ 社会資本の主要8分野における分野別の着工箇所と完成箇所の割合を整理しています。

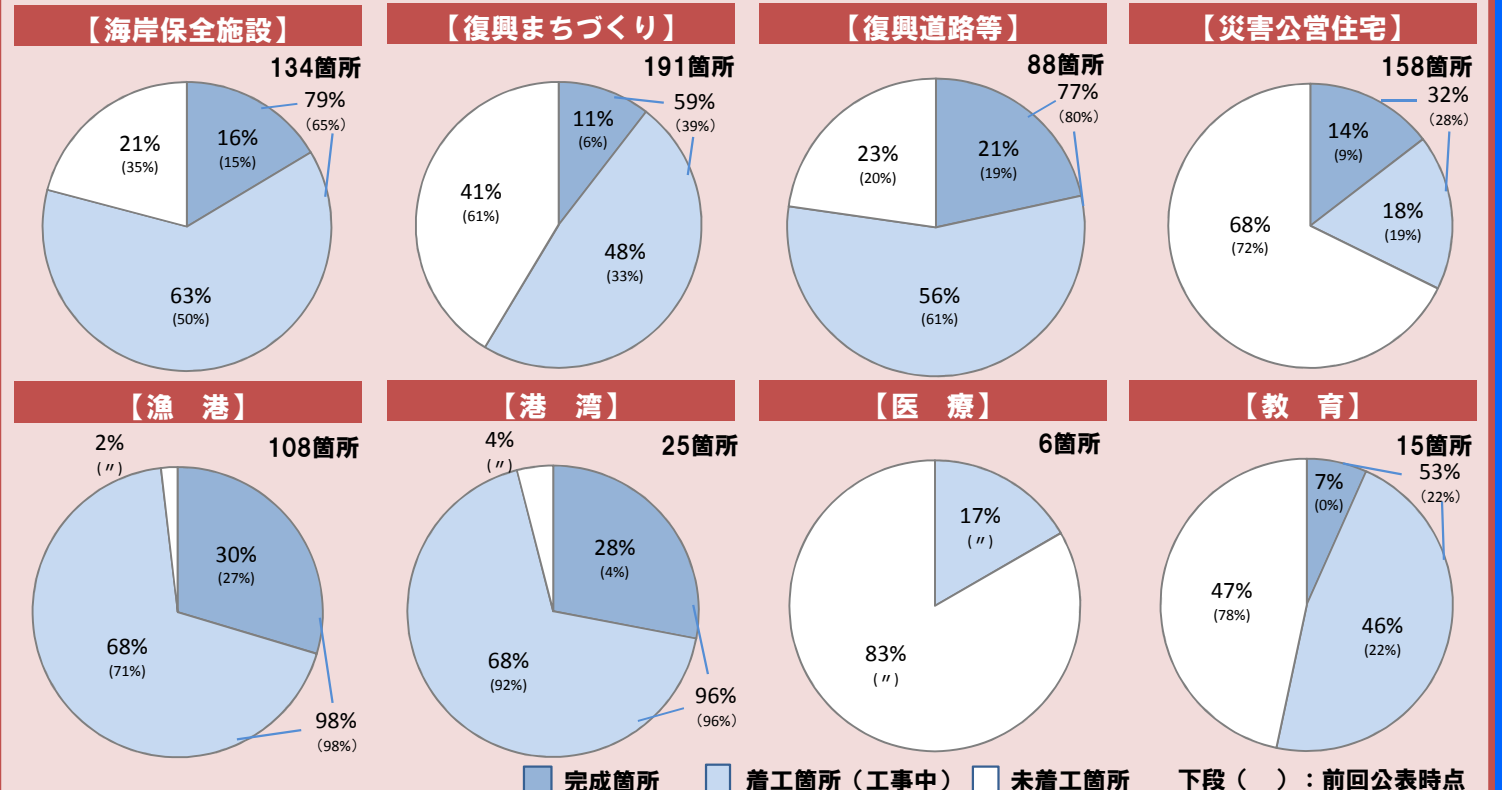

【お問い合わせ】岩手県復興局まちづくり再生課（019-629-6935）

【東日本大震災津波】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

社会資本の復旧・復興ロードマップ

住宅再建のトピックス

宅地供給区画数

8,291区画

（8,513区画から222区画の減少）

災害公営住宅戸数

5,969戸

（6,038戸から69戸の減少）

市町村別 事業計画掲載箇所一覧

※ 赤字は前回からの変更箇所


市町村名	事業 主体	海岸保全施設				復興まちづくり										復興道路等						災害公営住宅		漁 港	港 湾	医 療	教 育	
		一般海岸 港湾海岸	農地海岸 林野海岸	漁港海岸	計	土地区画整理		防災集団移転		漁業集落防災		津波復興 拠点	面整備計		街路整備	まちづくり 連携道路	復興道路		復興支援道路		復興関連道路							
		河川・海岸数	海岸数	海岸数	河川・海岸数	地区数	区画数	団地数	区画数	地区数	区画数	地区数	地区数	区画数	路線数	箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	箇所数	戸数	漁港数	地区数	箇所数	箇所数
洋野町	県	6	0	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	0	0	1	2	-	-
	町	-	-	0	0	0	0	0	0	1	17	0	1	17	-	-		(国)1	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-
	計	6	0	1	7	0	0	0	0	1	17	0	1	17	-	1		1	0	0	1	1	1	4	9	2	-	-
久慈市	県	5	0	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	1	1	2	2	0	0	1	4	-	-
	市	-	-	2	2	0	0	0	0	4	15	0	4	15	-	-		(国)2	-	-	-	-	3	11	9	(国)1	-	-
	計	5	0	3	8	0	0	0	0	4	15	0	4	15	-	-		2	1	1	2	2	3	11	10	5	-	-
野田村	県	6	2	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	2	2	26	1	-	-	-
	村	-	-	0	0	1	124	2	39	2	15	0	5	178	-	-		(国)1	-	-	-	-	5	75	2	-	-	-
	計	6	2	0	8	1	124	2	39	2	15	0	5	178	-	2		1	0	0	1	2	7	101	3	-	-	-
普代村	県	4	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-
	村	-	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	-	-		(国)3	-	-	-	-	0	0	3	-	-	-
	計	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	-	-		3	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-
田野畑村	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	3	0	0	1	-	-	-
	村	-	-	1	1	0	0	0	0	2	53	0	2	53	-	-		(国)3	-	-	-	-	5	63	3	-	-	-
	計	2	0	2	4	0	0	0	0	2	53	0	2	53	-	3		3	0	0	1	3	5	63	4	-	-	-
岩泉町	県	2	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	2	3	0	0	0	0	1	1	-	-
	町	-	-	1	1	0	0	0	0	1	60	0	1	60	-	-		(国)1	-	-	-	-	2	51	1	-	1	2
	計	2	0	2	4	0	0	0	0	1	60	0	1	60	-	-		1	2	3	0	0	2	51	2	1	1	2
宮古市	県	13	2	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸道 路、宮古盛 岡横断道路	1	1	3	3	3	12	363	3	7	-	-
	市	-	-	3	3	3	410	5	324	9	31	2	19	765	-	-		(国)7	-	-	-	-	15	430	15	(国)1	1	0
	計	13	2	4	19	3	410	5	324	9	31	2	19	765	-	7		8	1	3	3	3	27	793	18	8	1	0
山田町	県	4	3	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	三陸沿岸 道路	-	1	1	0	0	11	556	4	-	1	-
	町	-	-	1	1	4	322	4	461	2	152	1	11	935	-	-		(国)2	-	-	-	-	8	275	2	-	-	1
	計	4	3	5	12	4	322	4	461	2	152	1	11	935	0	1		2	1	1	0	0	19	831	6	-	1	1
大槌町	県	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	5	500	2	-	1	-
	町	-	-	0	0	4	1,168	17	723	4	12	2	27	1,903	-	-		(国)1	-	-	-	-	20	480	0	-	-	2
	計	2	1	2	5	4	1,168	17	723	4	12	2	27	1,903	0	1		1	0	0	1	1	25	980	2	-	1	2
釜石市	県	6	3	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	三陸沿岸道 路、東北横 断自動車道 釜石秋田線	-	1	1	3	3	4	210	6	1	-	-
	市	-	-	7	7	4	1,243	11	141	14	91	2	31	1,475	-	-		(国)3	-	-	-	-	27	1,135	9	(国)1	-	4
	計	6	3	12	21	4	1,243	11	141	14	91	2	31	1,475	0	5		3	1	1	3	3	31	1,345	15	2	-	4
大船渡市	県	7	3	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	三陸沿岸 道路	-	0	0	1	1	9	507	6	6	-	-
	市	-	-	8	8	1	250	23	388	1	30	1	26	668	-	-		(国)2	-	-	-	-	17	283	16	(国)1	-	3
	計	7	3	13	23	1	250	23	388	1	30	1	26	668	1	5		2	0	0	1	1	26	790	22	7	-	3
陸前高田市	県	8	2	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	三陸沿岸 道路	-	0	0	2	2	6	700	3	-	1	1
	市	-	-	6	6	2	1,725	26	497	0	0	2	30	2,222	-	-		(国)2	-	-	-	-	6	300	9	-	1	2
	計	8	2	9	19	2	1,725	26	497	0	0	2	30	2,222	0	7		2	0	0	2	2	12	1,000	12	-	2	3
全体	県	65	16	24	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32	3路線	1	6	9	15	18	49	2,862	31	21	3	1
	市町村	0	0	29	29	19	5,242	88	2,573	41	476	10	158	8,291	0	0		(国)28	-	-	-	-	109	3,107	77	(国)4	3	14
	計	65	16	53	134	19	5,242	88	2,573	41	476	10	158	8,291	1	32		35※	6	35※	15	18	158	5,969	108	25	6	15

※ 復興道路等の全体の箇所数には、その他の市町村の箇所数を含んでいます。

【東日本大震災津波】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

社会資本の復旧・復興ロードマップ

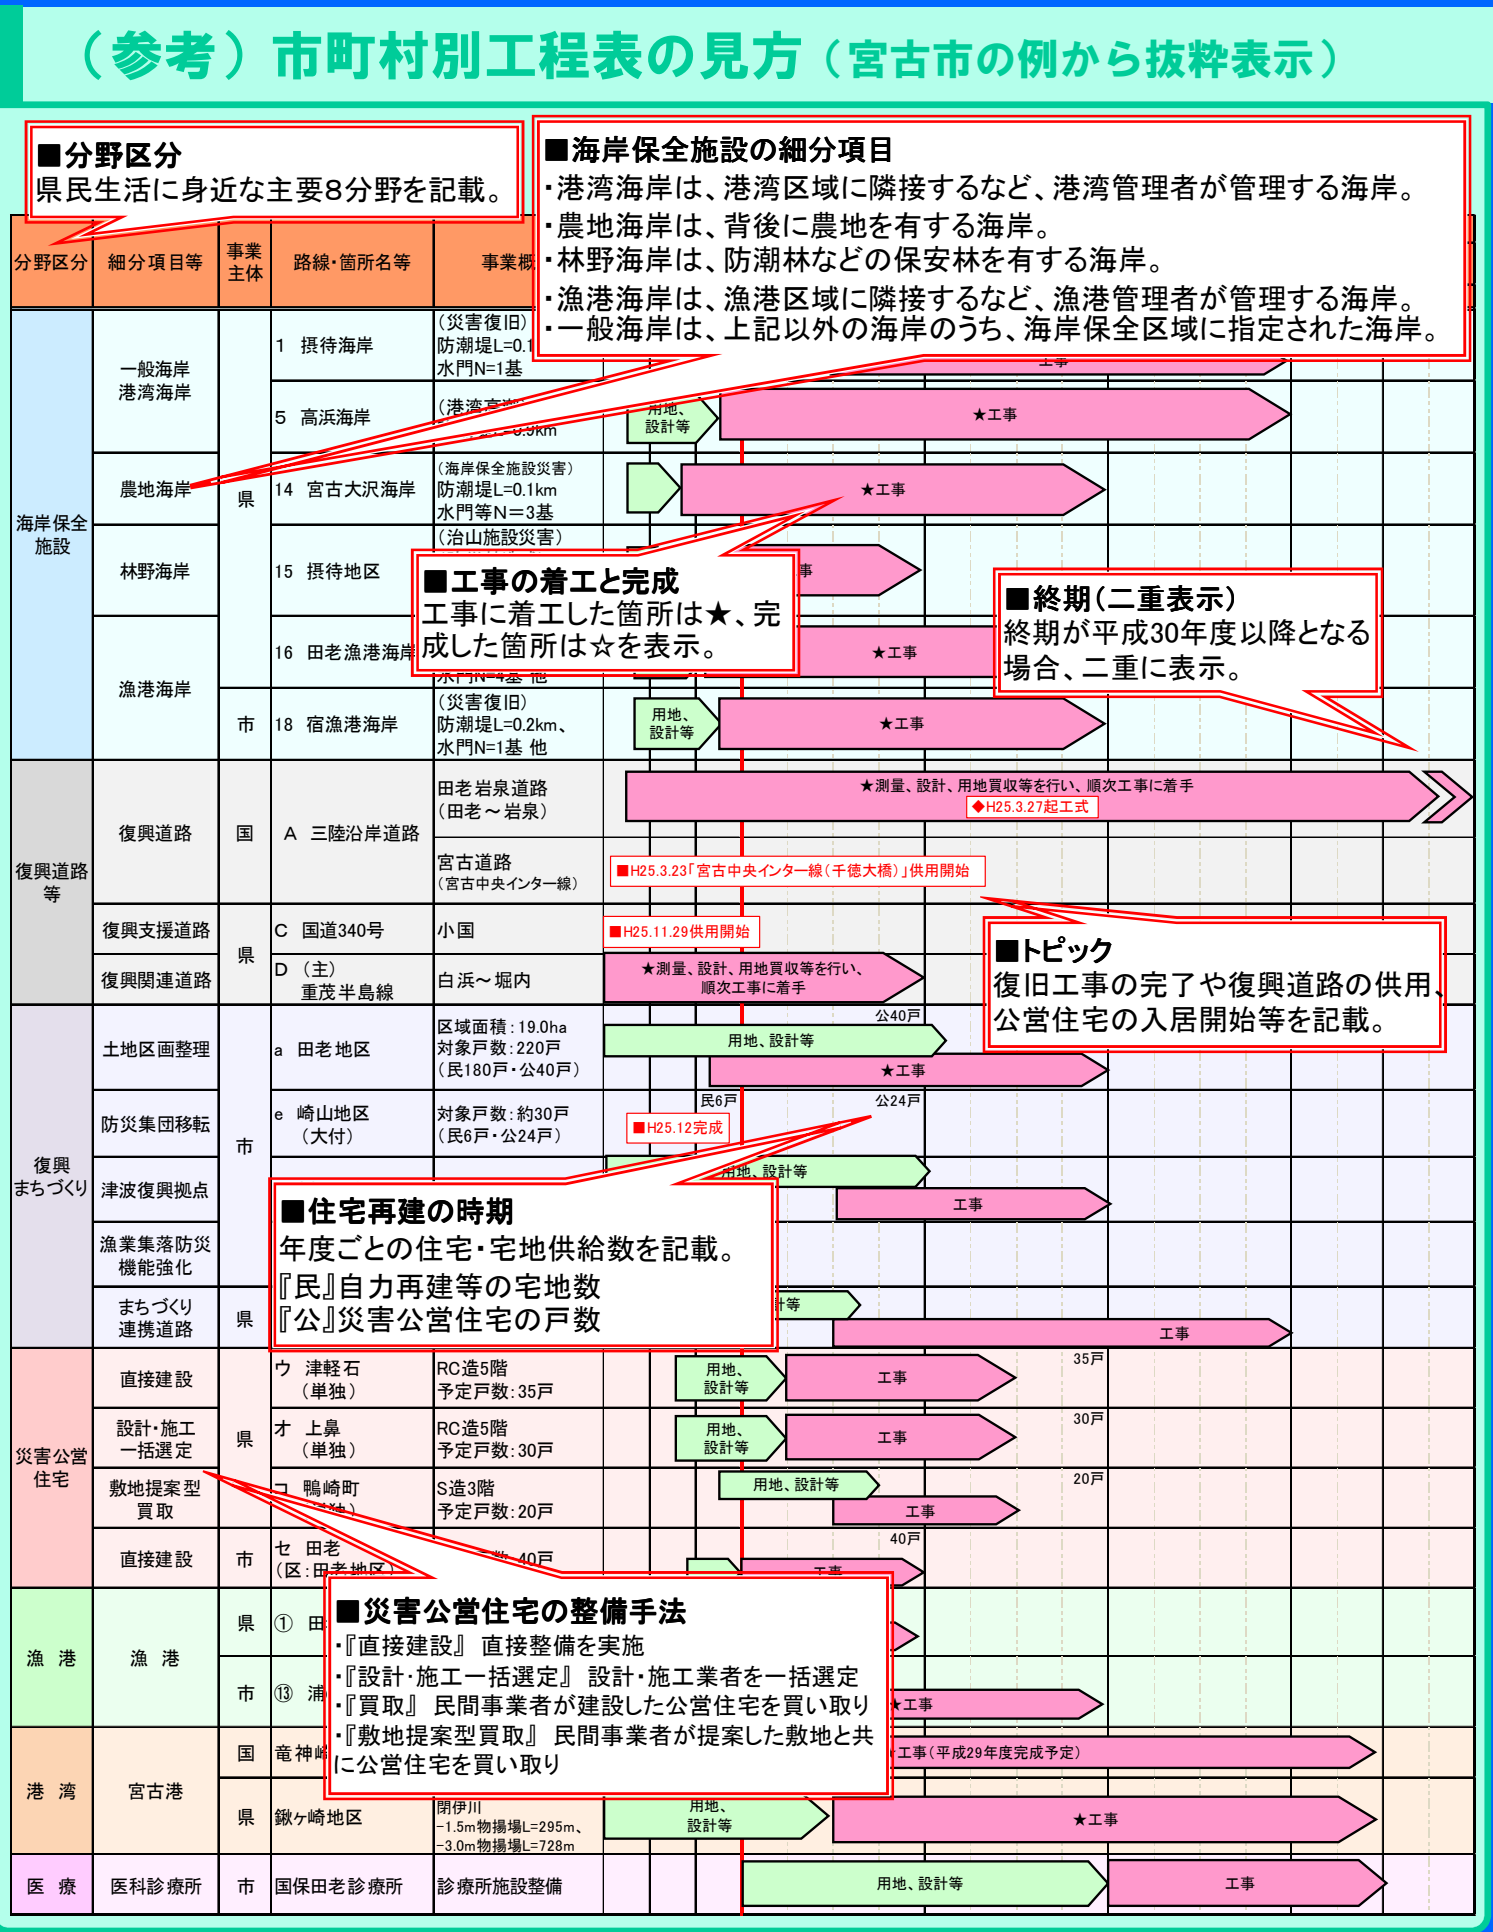

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

This map illustrates the proposed coastal road network in the Yamaguchi region, specifically along the coast from the top left to the bottom right. The network is composed of several segments, each identified by a label in a colored box:

- ①大谷地海岸** (Ohtani Coast) - Blue box
- ②角浜漁港** (Kakuhama Fishing Port) - Green box
- 2平内海岸** (Hirai Coast) - Blue box
- ③川尻漁港** (Kawajiri Fishing Port) - Green box
- 7種市漁港海岸** (Shu City Fishing Port Coast) - Blue box
- ①種市漁港** (Shu City Fishing Port) - Green box
- ④鹿糠漁港** (Kadonaka Fishing Port) - Green box
- 3玉川海岸** (Tamagawa Coast) - Blue box
- ⑤戸類家漁港** (Togorika Fishing Port) - Green box
- ⑥宿戸漁港** (Shukuto Fishing Port) - Green box
- a漁集(八木地区)** (A Fishing Collection (Yagi Area)) - Purple box
- 八木港** (Yagi Port) - Red box
- ⑦小子内漁港** (Koushiuchi Fishing Port) - Green box
- 4小子内海岸** (Koushiuchi Coast) - Blue box
- 5原子内海岸** (Oniuchi Coast) - Blue box
- ⑧有家漁港** (Yaka Fishing Port) - Green box
- ⑨高家漁港** (Takagaya Fishing Port) - Green box
- 6八木海岸** (Yagi Coast) - Blue box
- 1(一)八木港線(八木)** (1(一) Yagi Port Line (Yagi)) - Purple box
- ア災害公営(八木北)** (A Disaster Public (Yagi North)) - Red box

Key interchanges and landmarks are also marked:

- 階上IC** (Kaisu Interchange) - Top left
- 洋野IC(仮)** (Yonohi Interchange (Temporary)) - Middle left
- A三陸沿岸道路** (A Sanriku Coastal Road) - Middle left
- B(一)角ノ浜玉川線 玉川** (B(一) Kakuhama Tamagawa Line Tamagawa) - Middle left
- 洋野東IC(仮)** (Yonohi East Interchange (Temporary)) - Middle
- 洋野南IC(仮)** (Yonohi South Interchange (Temporary)) - Bottom middle
- 侍浜IC(仮)** (Saihin Interchange (Temporary)) - Bottom right


The map shows the coastline with various ports and fishing grounds. The proposed road network is shown as a dashed black line, with specific segments highlighted in blue, green, and purple. The background is a topographic map showing terrain and existing infrastructure.

[illegible]

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市1/2】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

新たな視点による 新たなまちづくり

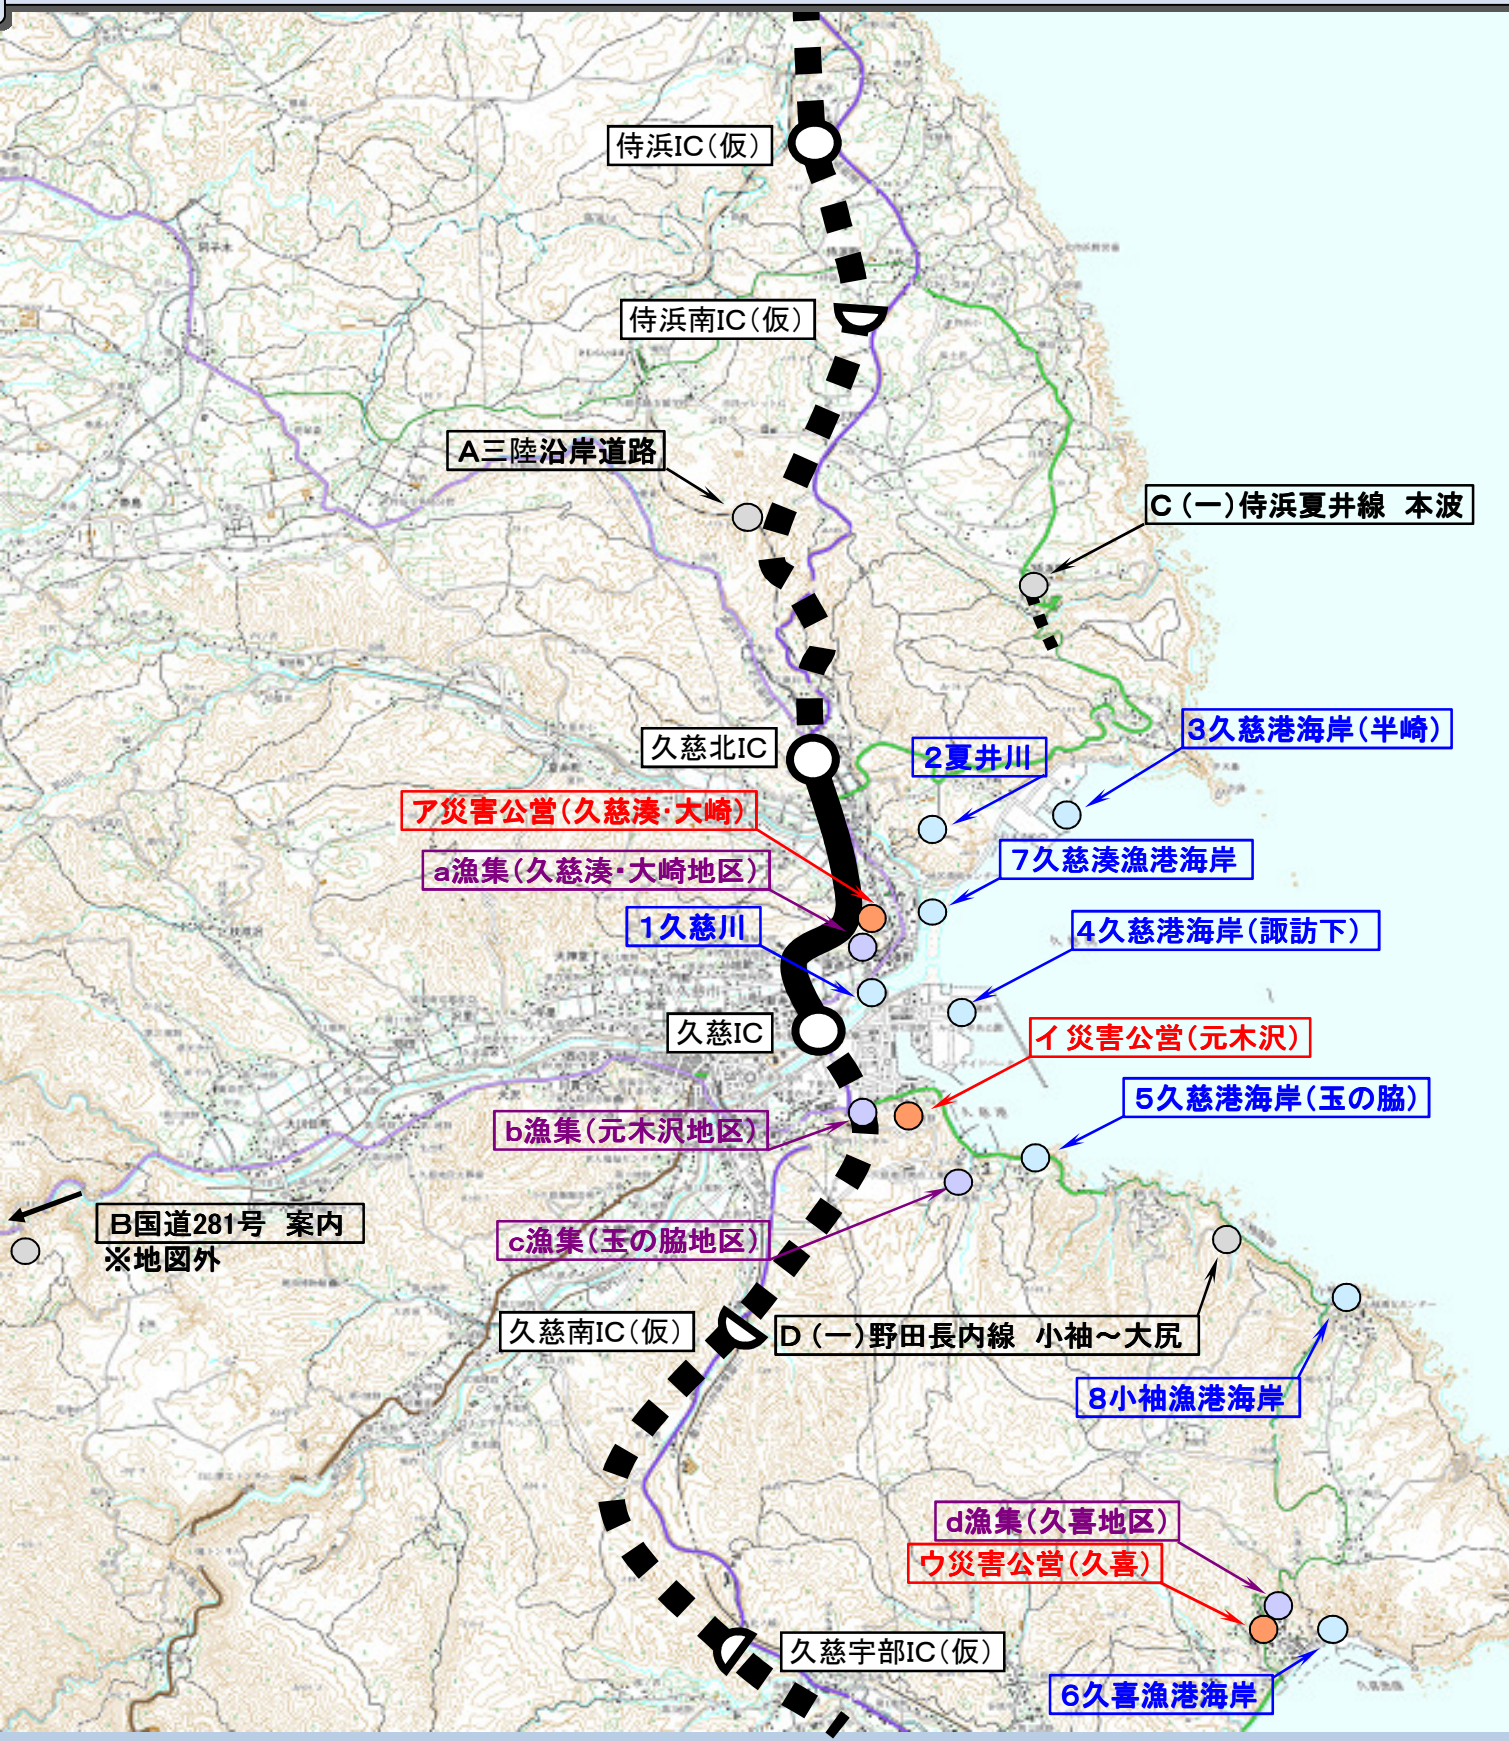


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	用地、設計等	★工事							
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	用地、設計等	★工事							
	港湾海岸		3 久慈港海岸 (半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	■H24.10完成								
			4 久慈港海岸 (諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、 陸間N=12基		★工事							
			5 久慈港海岸 (玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	■H24.10完成								
	漁港海岸		6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事							
			7 久慈湊 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=4基	用地、設計等	★工事							
			8 小袖漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事							
復興道路等	復興道路	国	久慈北道路	★用地・工事の推進									
			A 三陸沿岸道路	野田久慈道路 (普代～久慈)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式								
	復興支援道路	県	B 国道281号	案内	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.12着工								
	復興関連道路		C (一) 侍浜夏井線	本波	■H24.9.30供用開始								
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	D (一) 野田長内線	小袖～大尻	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
			a 久慈湊・大崎	集落道、避難施設、 用地造成 他 対象戸数:14戸 (民9戸・公5戸)	用地、設計等	★工事(用地造成はH25完了)							
			b 元木沢	集落道、避難施設、 用地造成 他 対象戸数:5戸 (民2戸・公3戸)	■H25.11完成								
			c 玉の脇	集落道、用地造成 他 対象戸数:3戸 (民3戸)	■H25.11完成								
			d 久喜	集落道、漁業集落排水、 用地造成 他 対象戸数:4戸 (民1戸・公3戸)	■H25.8完成								
災害公営住宅	直接建設	市	ア 久慈湊・大崎 (漁:久慈湊・大崎地区)	木造 予定戸数:5戸	■H26.3完成	5戸							
			イ 元木沢 (漁:元木沢地区)	木造 予定戸数:3戸	■H26.3完成	3戸							
			ウ 久喜 (漁:久喜地区)	木造 予定戸数:3戸	■H25.12完成	3戸							

社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

安全・安心で活力あるむらづくり

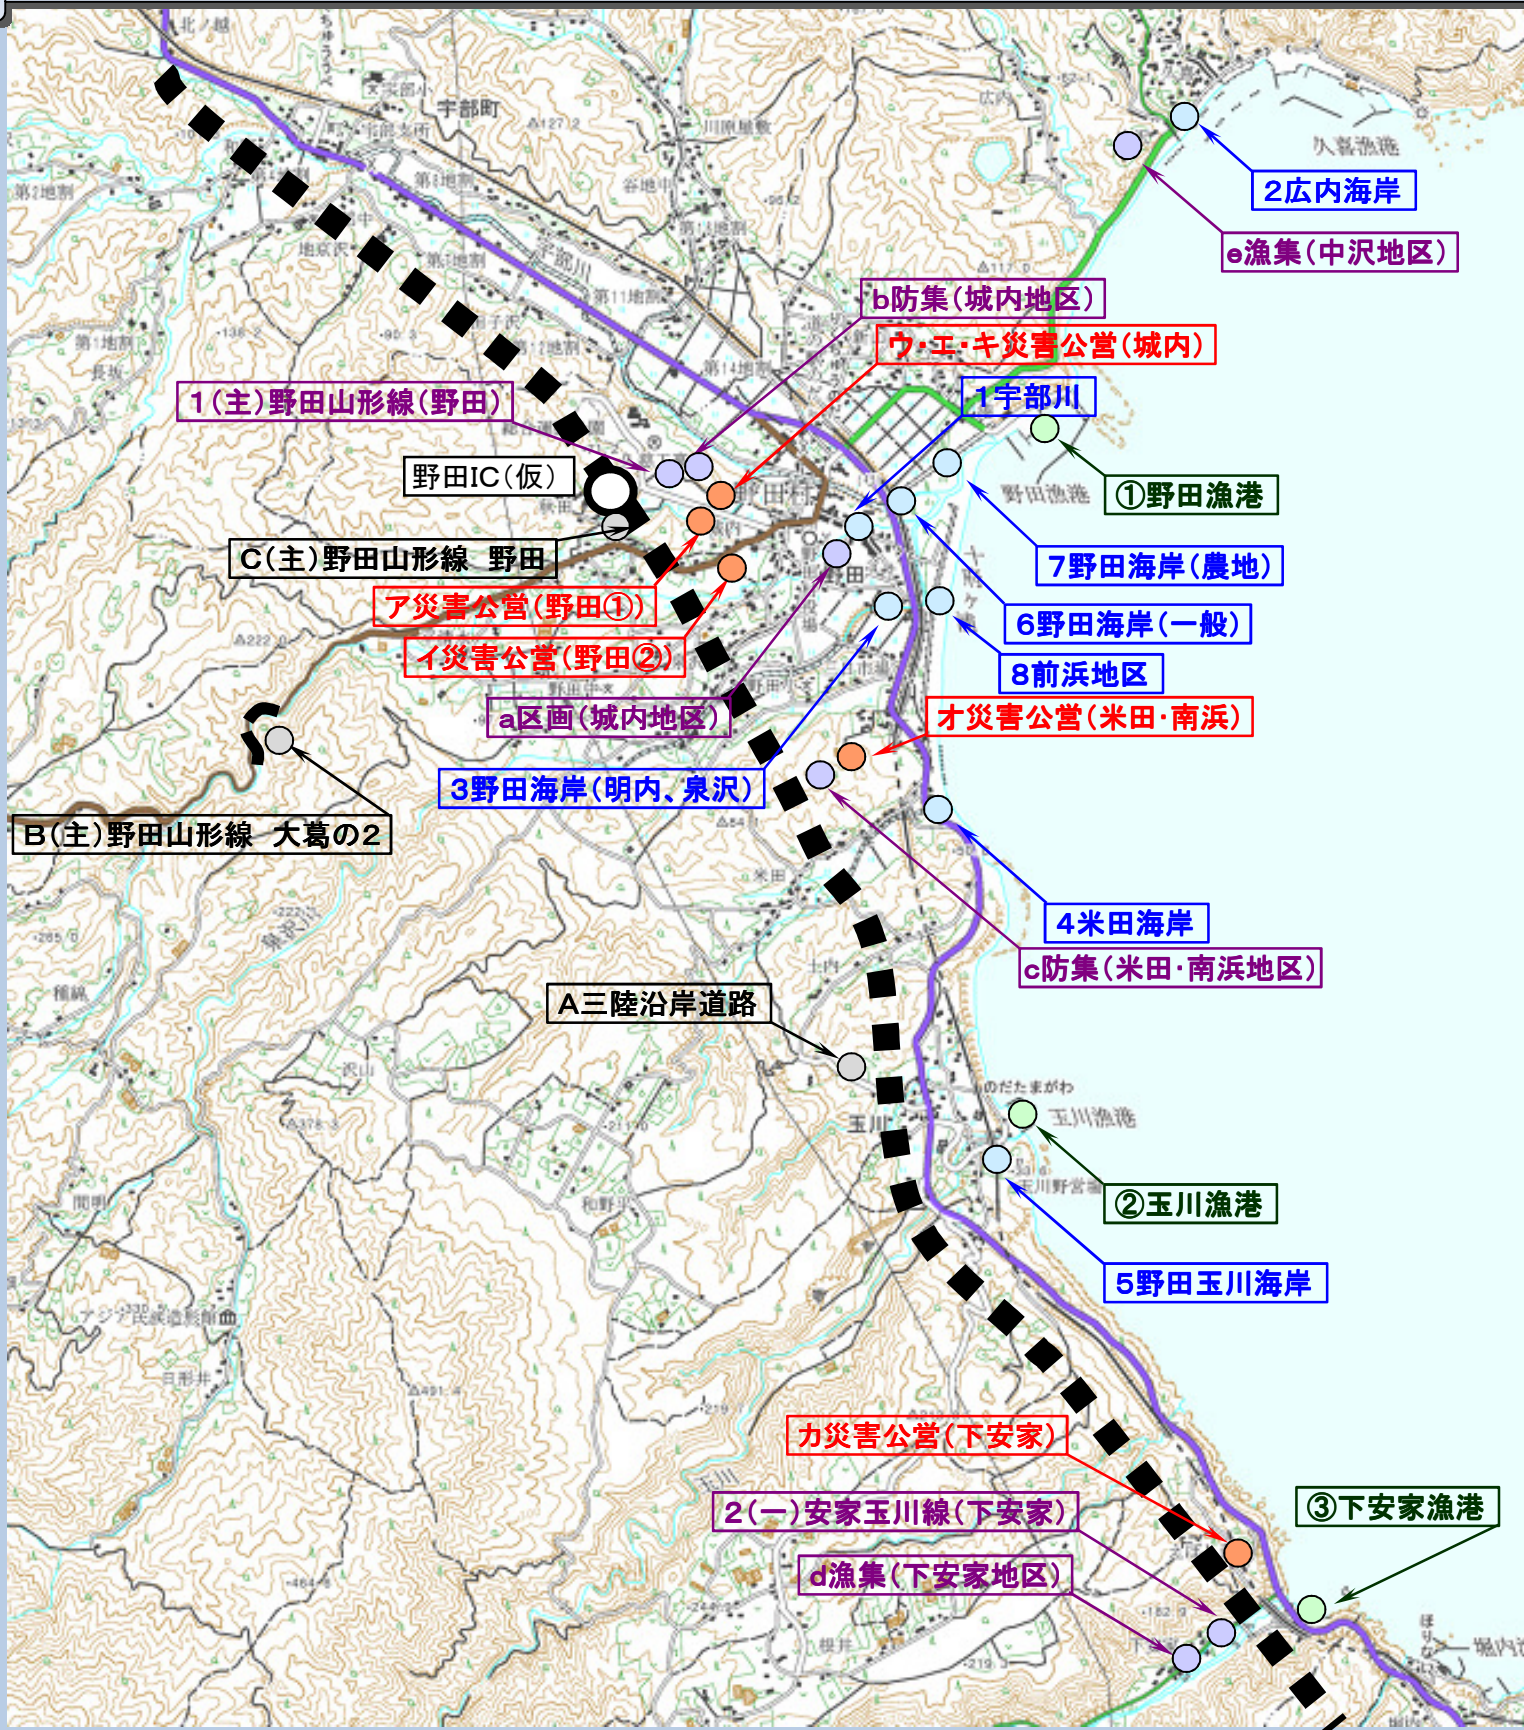


分野区分		細分項目等		事業主体		路線・箇所名等		事業概要		年度別整備スケジュール								
										第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		
										H23	H24	H25	H26		H27		H28	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	■H26.3完成													
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=4基他	用地、設計等	★工事												
			3 野田海岸 (明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	■H25.3完成													
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=2基他		★工事												
				(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等	工事												
			5 野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他	■H25.5完成													
	6 野田海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=1基		★工事														
	農地海岸	7 野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏法面 A=2,320m ² 、 水門操作室N=1棟	■H24.8完成														
林野海岸	8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km		★工事														
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	野田久慈道路 (菅代～久慈)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.27起工式													
	復興関連道路	県	B (主) 野田山形線	大葛の2	■H25.7.2供用開始													
			C (主) 野田山形線	野田	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手													
復興まちづくり	土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積：12.9ha 対象戸数：135戸 (民124戸・公11戸)	用地、設計等	民22戸		民49戸	民53戸・公11戸									
	防災集団移転		b 城内地区	対象戸数：76戸 (民21戸・公55戸)			民21戸	公55戸										
			c 米田・南浜地区	対象戸数：24戸 (民18戸・公6戸)	■H25.11完成		民18戸	公6戸										
			d 下安家地区	集落道、用地造成 他 対象戸数：14戸 (民13戸・公1戸)	用地、設計等	民9戸	民4戸・公1戸											
	漁業集落防災機能強化		e 中沢地区	用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	用地、設計等			民2戸										
	まちづくり連携道路		県	1 (主)野田山形線	野田	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.1着工												
				2 (一)安家玉川線	下安家	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.10着工												
災害公営住宅	直接建設	県	ア 野田① (単独)	木造2階 予定戸数：8戸	8戸 ■H25.3完成													
			イ 野田② (単独)	木造平屋 予定戸数：18戸	18戸 ■H26.1完成													
		村	ウ 城内 (区：城内地区)	木造 予定戸数：11戸	用地、設計等					11戸								
			エ 城内 (防：城内地区)	木造 予定戸数：55戸	用地、設計等					55戸								
			オ 米田・南浜 (防：米田・南浜地区)	木造 予定戸数：6戸					6戸	★工事								
			カ 下安家 (漁：下安家地区)	木造 予定戸数：1戸					1戸	★工事								
			キ 城内 (単独)	木造 予定戸数：2戸	用地、設計等					2戸	工事							
漁港	漁港	県	① 野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 崖壁L=307m 他	■H26.3完成													
		村	② 玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、 崖壁L=50m 他	■H24.9完成													
			③ 下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	■H24.9完成													

社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

心をひとつに 未来に向けた復興

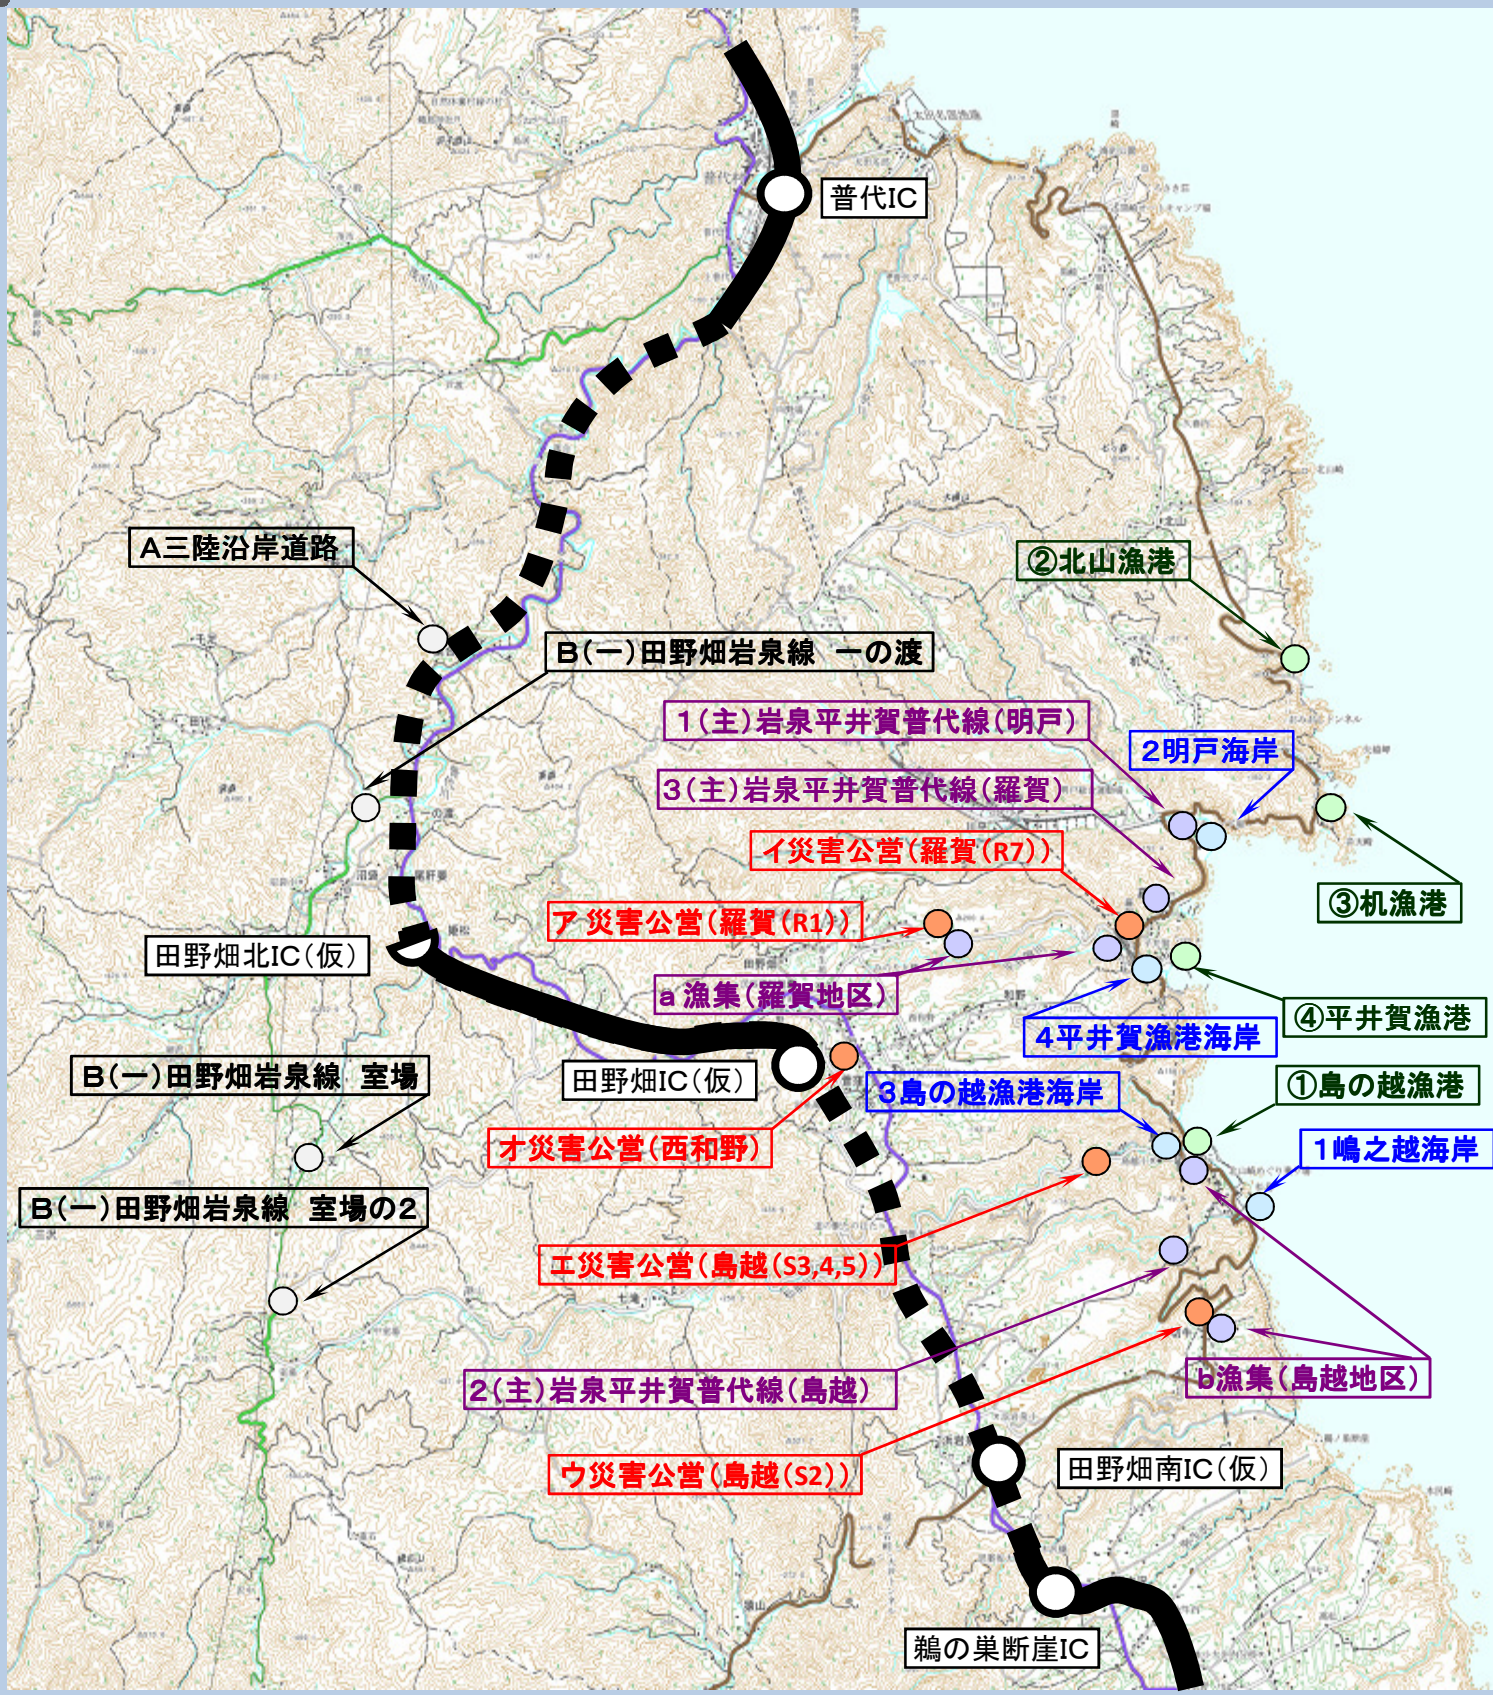


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)					第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30				
海岸保全施設	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、 水門等N=2基	★				工事(遠隔設備)								
			2 明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、 設計等		★工事										
	漁港海岸		3-1 島の越 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km 他	用地、 設計等		★工事										
			3-2 島の越 (松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.03km 水門N=1基 他		用地、 設計等	工事										
			4 平井賀 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基 他	用地、 設計等	工事											
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	尾肝要普代道路 (尾肝要～普代)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.18起工式												
			尾肝要道路	■H26.3.2供用開始													
			田野畑道路 (田野畑南～尾肝要)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.7起工式													
	復興関連道路	県	B (一) 田野畑岩泉線	室場	■H24.3.27供用開始												
			室場の2	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.3 着工													
			一の渡	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手													
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 羅賀地区	集落道、用地造成 対象戸数:45戸 (民18戸・公27戸)	他	民6戸・公7戸		民12戸・公20戸									
			b 島越地区	集落道、用地造成 対象戸数:69戸 (民35戸・公34戸)	他	民35戸・公10戸		公24戸									
	まちづくり連携道路	県	1 (主)岩泉 平井賀普代線	明戸		★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.10着工											
			2 (主)岩泉 平井賀普代線	島越	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手												
			3 (主)岩泉 平井賀普代線	羅賀	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手												
	災害公営住宅	買取	村	ア 羅賀R1地区 (漁:羅賀地区)	木造 予定戸数:20戸		用地、設計等		20戸								
イ 羅賀R7地区 (漁:羅賀地区)				木造 予定戸数:7戸			7戸										
ウ 島越S2地区 (漁:島越地区)				木造 予定戸数:24戸				★工事		24戸							
エ 島越S3,4,5地区 (漁:島越地区)				木造 予定戸数:10戸			10戸										
オ 西和野地区 (単独)				木造 予定戸数:2戸				工事		2戸							
漁港	漁港	県	① 島の越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、 岸壁L=561m 他			★工事										
			② 北山漁港	(漁港災害) 臨港道路L=155m			■H25.3完成										
		村	③ 机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=101m 他			★工事										
			④ 平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、 岸壁L=193m 他			★工事										

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市1/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

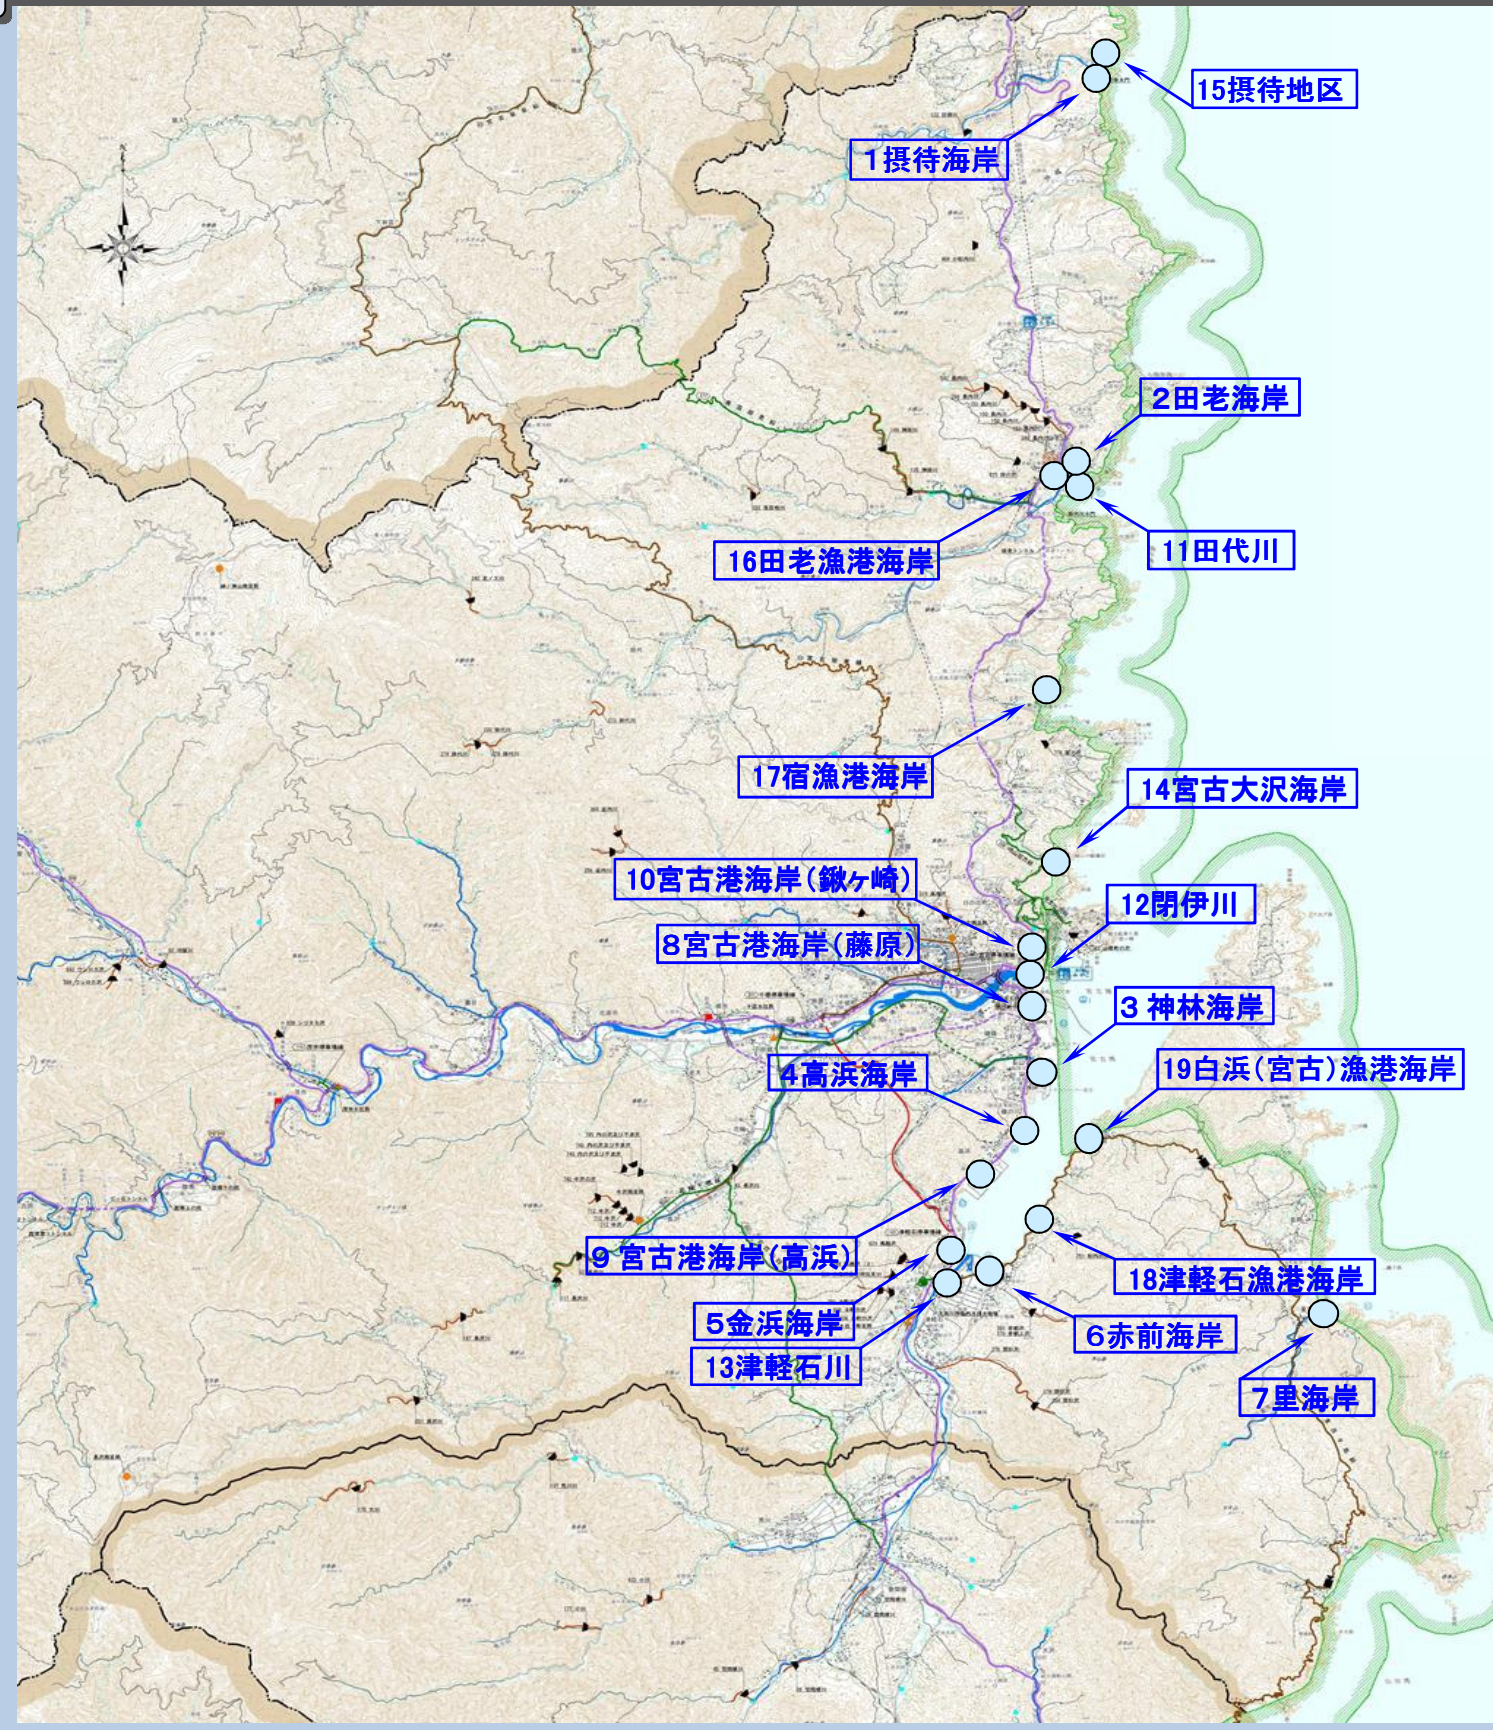


分野区分	細分項目等	事業 主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30
海岸保全 施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	用地、設計等		工事						
			2 田老海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門等N=4基 (海岸危機) 水門等遠隔操作化N =1基	用地、設計等	★工事							
			3 神林海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門等N=7基 (海岸危機) 陸閘等遠隔操作化N =1基	用地、設計等	★工事							
			4 高浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 陸閘等N=4基	★工事								
				(港湾高潮) 防潮堤L=0.9km (海岸危機) 陸閘等遠隔操作化N =4基	用地、設計等	★工事							
			5 金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 陸閘等N=5基	用地、設計等	★工事							
			6 赤前海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 樋門N=1基	★工事								
			7 里海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 樋門N=1基	★工事								
			8 宮古港海岸 (藤原)	(港湾高潮・災害) 防潮堤L=2.2km、 陸閘N=4基	用地、 設計等	★工事							
			9 宮古港海岸 (高浜)	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 陸閘N=1基	用地、 設計等	★工事							
			10 宮古港海岸 (鍛ヶ崎)	(港湾高潮) 防潮堤L=0.7km	用地、設計等	★工事							
			11 田代川	(災害復旧) 水門N=1基	用地、 設計等	★工事							
			12 閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	用地、設計等	★工事							
	13 津軽石川		(三陸高潮) 防潮堤L=0.9km	★工事									
	農地海岸		14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基	★工事								
	林野海岸		15 摂待地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=0.3km	★工事								
	漁港海岸		市	16 田老漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門N=4基 他	用地、 設計等	★工事						
				17 宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	用地、 設計等	★工事						
				18 津軽石 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=1基 他	用地、 設計等	★工事						
19 白浜(宮古) 漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他		用地、 設計等	★工事								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市2/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

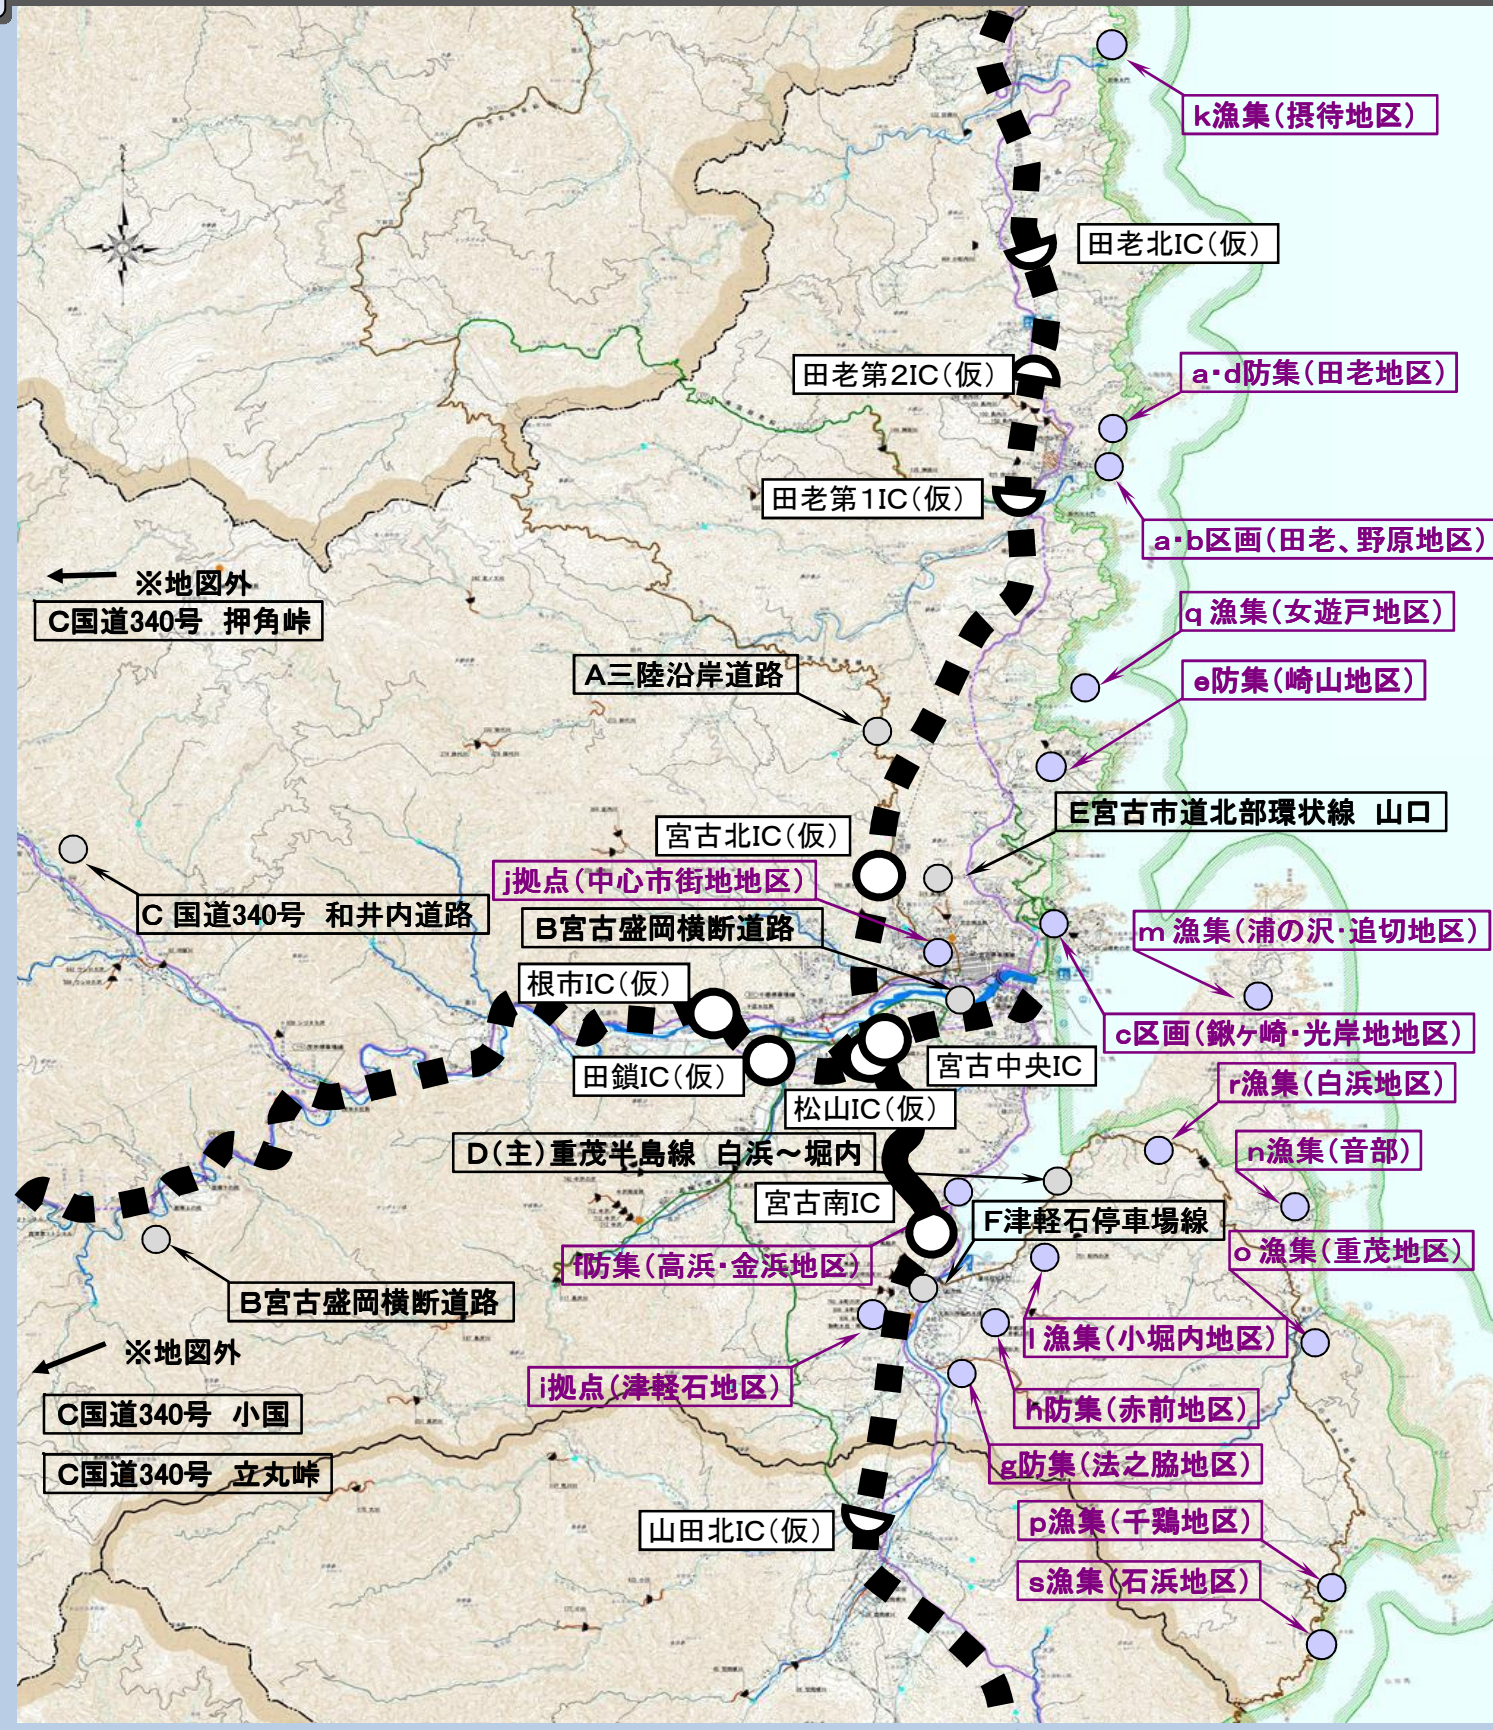


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30	
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路 (田老～岩泉)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.3.27起工式									
				宮古田老道路 (宮古中央～田老)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.11.18起工式									
				宮古道路 (宮古中央インター線)	■H25.3.23「宮古中央インター線(千徳大橋)」供用開始									
				山田宮古道路 (山田～宮古南)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.17起工式									
			B 宮古盛岡横断道路	宮古箱石道路 (宮古～箱石)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.11.30起工式									
				平津戸松草道路 (平津戸・岩井～松草)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
				区界道路 (区界～築川)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
				宮古西道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
				C 国道340号	小国	■H25.11.29供用開始								
					和井内道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
	立丸峠	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.3着工												
	押角峠	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手												
	※岩泉町の復興支援道路・国道340号押角峠と同一箇所													
	復興関連道路	県	D (主) 重茂半島線	白浜～堀内	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
			E 宮古市道北部環状線	山口	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
			F (一) 津軽石停車場線	津軽石	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
	復興まちづくり	土地地区画整理	市	a 田老地区	区域面積：19.0ha 対象戸数：220戸 (民180戸・公40戸)	用地、設計等		公40戸		民180戸				
				★工事										
				b 野原地区	区域面積：15.8ha	用地、設計等		公40戸		民230戸				
工事														
c 鍛ヶ崎・光岸地区				区域面積：23.8ha 対象戸数：270戸 (民230戸・公40戸)	用地、設計等		民203戸・公82戸							
★工事														
d 田老地区				対象戸数：285戸 (民203戸・公82戸)	用地、設計等		民6戸		公24戸					
★工事														
e 崎山地区(大付)				対象戸数：約30戸 (民6戸・公24戸)	■H25.12完成									
f 高浜・金浜地区				対象戸数：63戸 (民47戸・公16戸)	用地、設計等		民12戸		民47戸		公16戸			
★工事														
g 法之脇地区(津軽石)		対象戸数：12戸 (民12戸)	■H26.3完成											
h 赤前地区		対象戸数：56戸 (民56戸)	用地、設計等		民19戸		民37戸							
★工事														
i 津軽石地区		区域面積：約1.2ha	用地、設計等				工事							
j 中心市街地地区		区域面積：検討中	用地、設計等											
漁業集落防災機能強化		市	k 摂待地区	集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	■H25.7完成		民3戸							
			l 小堀内地区	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	■H26.3完成		民2戸							
			m 浦の沢・追切地区	集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	■H25.3完成		民2戸							
			n 音部地区	集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	用地、設計		★工事		民3戸					
	o 重茂地区		集落道、用地造成他 対象戸数：20戸 (民16戸・公4戸)	用地、設計等		★工事		民16戸・公4戸						
	p 千鶴地区		集落道、用地造成他 対象戸数：3戸 (民3戸)	■H25.12完成		民3戸								
	q 女遊戸地区		集落道他	用地、設計等		工事								
	r 白浜地区		集落道他	用地、設計等		工事		民2戸						
	s 石浜地区		集落道、用地造成他 対象戸数：2戸 (民2戸)	用地、設計等		★工事								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市3/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

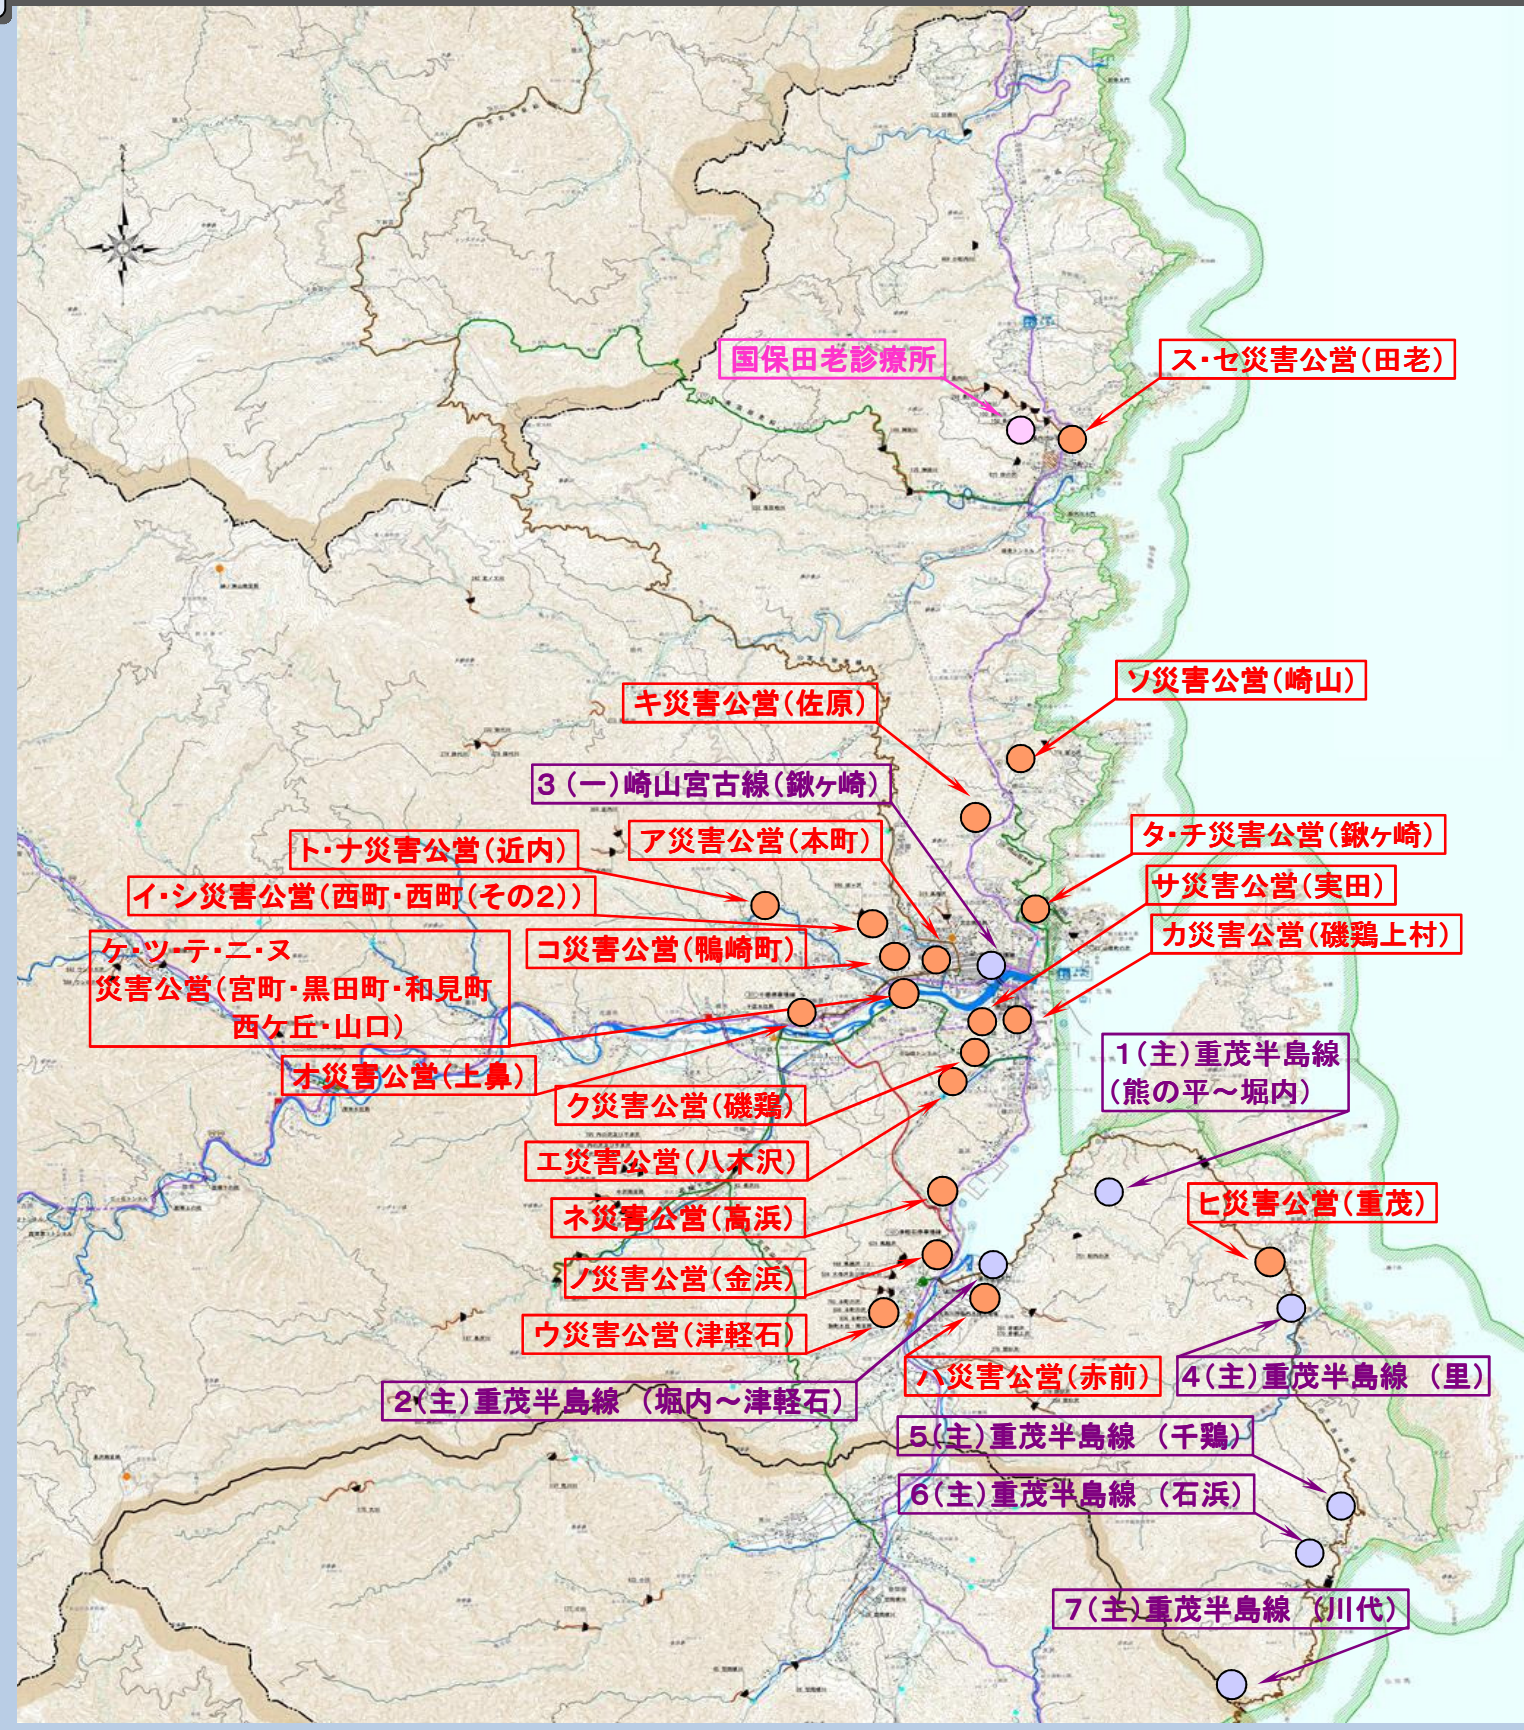


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30		
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	熊の平～堀内		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
			2 (主)重茂半島線	堀内～津軽石		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
			3 (一)崎山宮古線	鍛ヶ崎		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
			4 (主)重茂半島線	里		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
			5 (主)重茂半島線	千鷲		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
			6 (主)重茂半島線	石浜		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
			7 (主)重茂半島線	川代		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
災害公営 住宅	直接建設	県	ア 本町 (単独)	RC造8階 予定戸数:34戸		用地、 設計等	工事				34戸						
			イ 西町 (単独)	RC造4階 予定戸数:23戸			★工事				23戸						
			ウ 津軽石 (単独)	RC造5階 予定戸数:35戸		用地、 設計等	工事				35戸						
	設計・施工 一括選定	県	エ 八木沢 (単独)	RC造5階 予定戸数:50戸			★工事				50戸						
			オ 上鼻 (単独)	RC造5階 予定戸数:30戸		用地、 設計等	工事				30戸						
			カ 磯鶏上村 (単独)	予定戸数:24戸		用地、 設計等	工事				24戸						
	敷地提案型 買取	県	キ 佐原 (単独)	RC造 予定戸数:50戸			工事				50戸						
			ク 磯鶏 (単独)	S造 予定戸数:30戸			工事				30戸						
			ケ 宮町 (単独)	S造 予定戸数:20戸			工事				20戸						
			コ 鴨崎町 (単独)	S造3階 予定戸数:20戸		用地、設計等	工事				20戸						
			サ 実田 (単独)	S造3階 予定戸数:17戸		用地、設計等	工事				17戸						
			シ 西町(その2) (単独)	RC造5階 予定戸数:30戸			工事				30戸						
			直接建設	市	ス 田老(高台) (防:田老地区)	RC造 予定戸数:82戸		用地、設計等				工事		82戸			
					セ 田老 (区:田老地区)	予定戸数:40戸						工事		40戸			
					ソ 崎山 (防:崎山地区)	予定戸数:24戸			★工事				24戸				
	タ 鍛ヶ崎 (単独)	予定戸数:26戸				用地、設計等	工事				26戸						
	チ 鍛ヶ崎 (区:鍛ヶ崎地区)	予定戸数:40戸					工事				40戸						
	ツ 黒田町 (単独)	予定戸数:24戸					★工事				24戸						
	テ 和見町 (単独)	予定戸数:23戸					★工事				23戸						
	ト 近内 (単独)	RC造 予定戸数:40戸					40戸				■H26.3完成						
	ナ 近内 (単独)	RC造 予定戸数:40戸					工事				40戸						
	ニ 西ヶ丘 (単独)	予定戸数:24戸					★工事				24戸						
	ヌ 山口 (単独)	予定戸数:21戸				用地、設計等	工事				21戸						
	ネ 高浜 (単独)	予定戸数:12戸					★				12戸						
	ノ 金浜 (防:金浜地区)	予定戸数:16戸				用地、設計等				工事		16戸					
	ハ 赤前 (単独)	予定戸数:14戸					★工事				14戸						
	ヒ 重茂 (漁:重茂地区)	予定戸数:4戸					工事				4戸						
医 療	医科診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備		用地、設計等				工事							

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市4/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

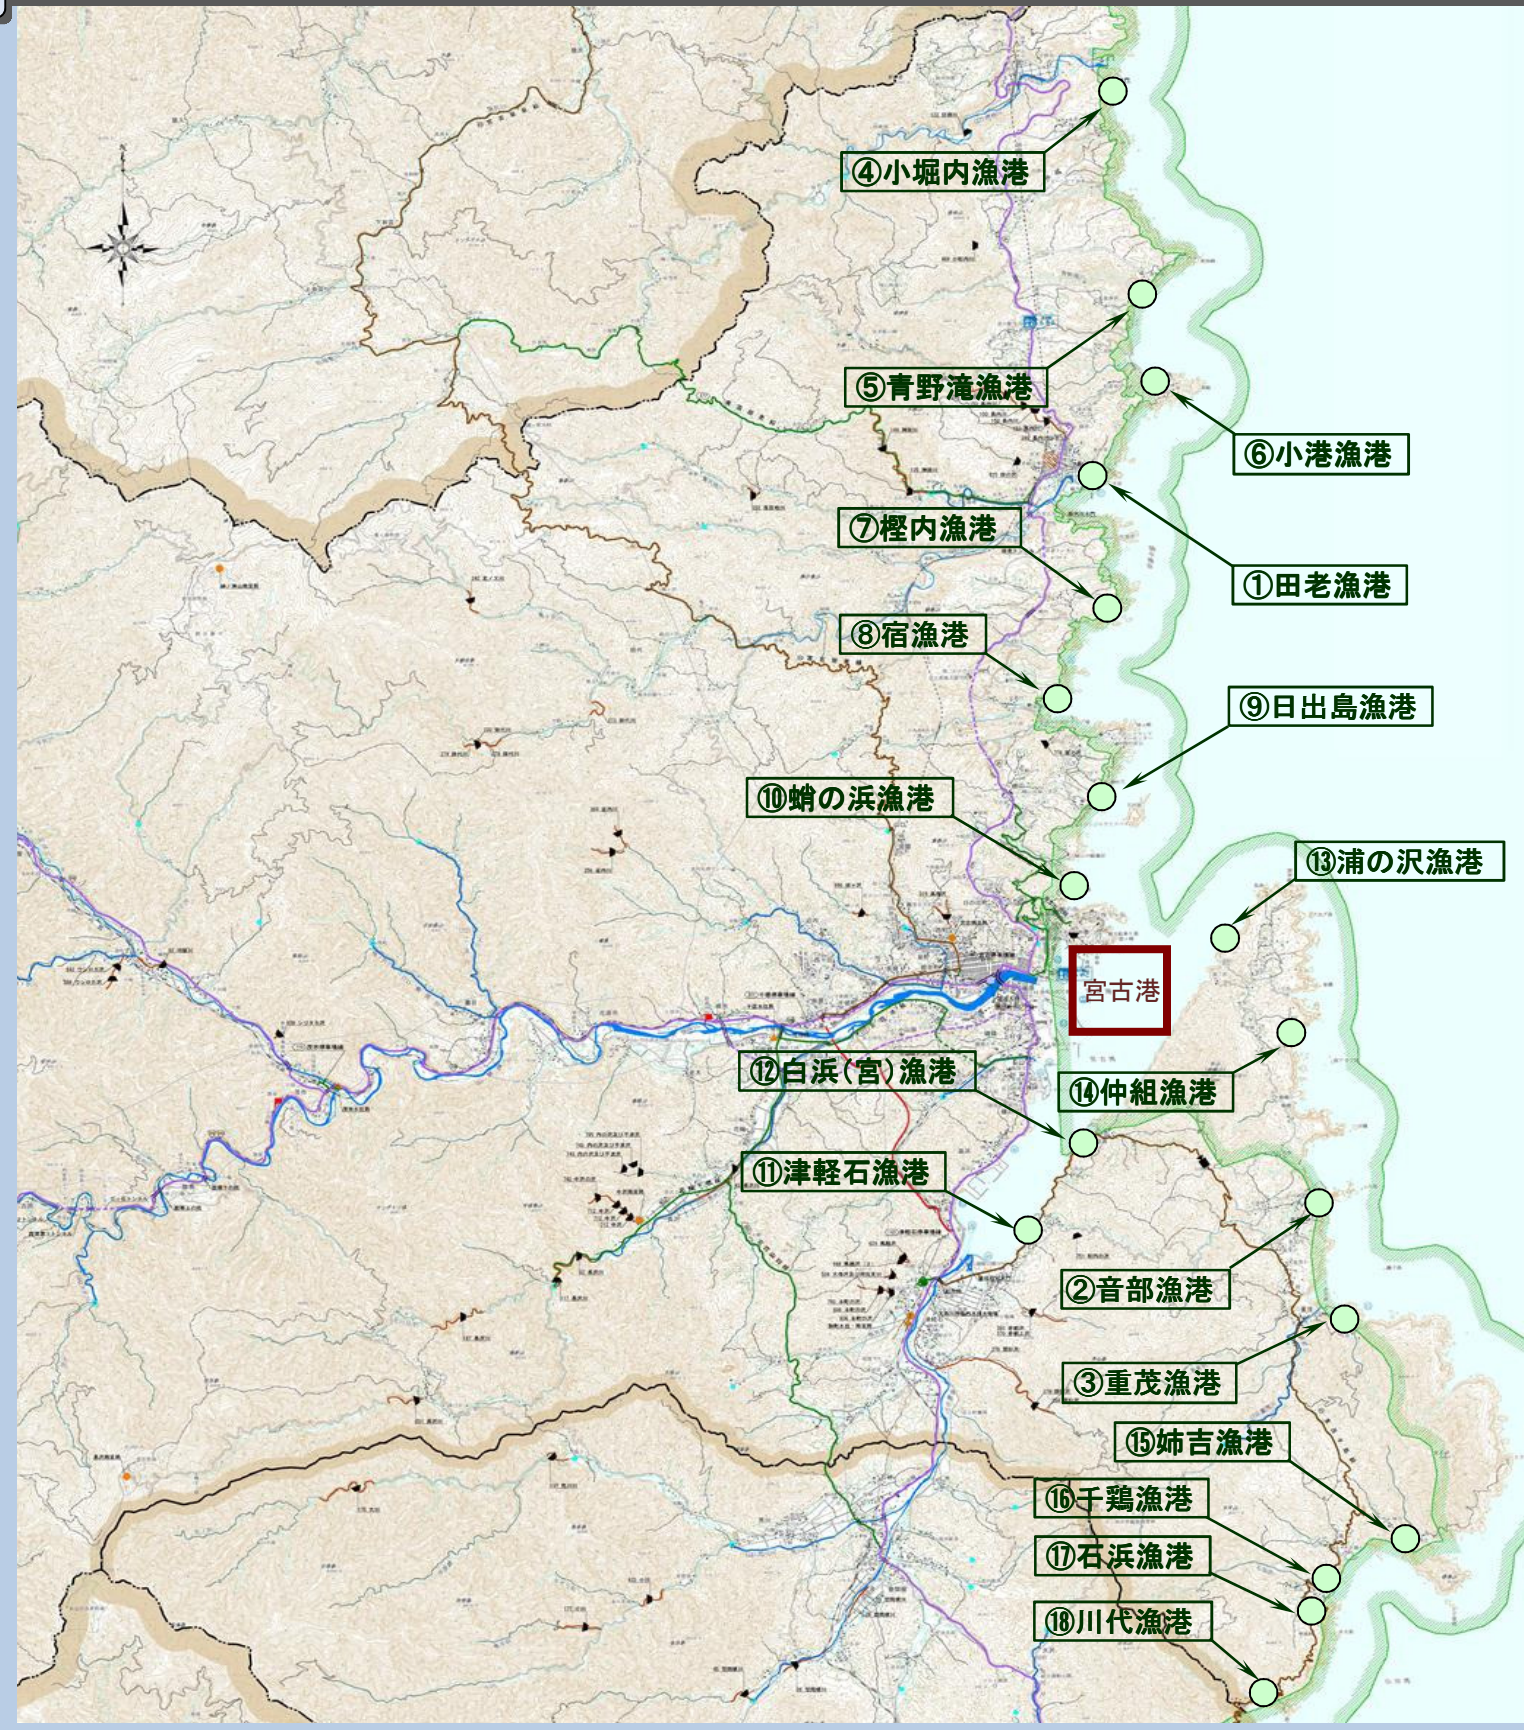


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												
					第1期 （基準復興期間）			第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）					
					H23	H24	H25	H26		H27	H28		H29	H30			
漁 港	漁 港	県	① 田老漁港	（漁港災害） 防波堤L=689m、 岸壁L=1,133m 他				★工事									
			② 音部漁港	（漁港災害） 防波堤L=352m、 岸壁L=206m 他				★工事									
			③ 重茂漁港	（漁港災害） 防波堤L=373m、 岸壁L=663m 他				★工事									
		市	④ 小堀内漁港	（漁港災害） 防波堤L=121m、 岸壁L=127m 他				★工事									
			⑤ 青野滝漁港	（漁港災害） 防波堤L=46m 他				■H25.10完成									
			⑥ 小港漁港	（漁港災害） 防波堤L=139m 他				★工事									
			⑦ 榎内漁港	（漁港災害） 防波堤L=72m、 岸壁L=52m 他				■H25.10完成									
			⑧ 宿漁港	（漁港災害） 防波堤L=85m、 岸壁L=215m 他				★工事									
			⑨ 日出島漁港	（漁港災害） 防波堤L=526m、 岸壁L=320m 他				★工事									
			⑩ 蛸の浜漁港	（漁港災害） 防波堤L=260m 他				★工事									
			⑪ 津軽石漁港	（漁港災害） 防波堤L=196m、 岸壁L=50m 他				★工事									
			⑫ 白浜（宮）漁港	（漁港災害） 防波堤L=110m、 岸壁L=200m 他				★工事									
			⑬ 浦の沢漁港	（漁港災害） 防波堤L=139m、 岸壁L=101m 他				用地、設計等			工事						
			⑭ 仲組漁港	（漁港災害） 防波堤L=157m、 岸壁L=145m 他				★工事									
			⑮ 姉吉漁港	（漁港災害） 防波堤L=86m、 岸壁L=40m 他				用地、設計等			★工事						
			⑯ 千鷲漁港	（漁港災害） 防波堤L=428m、 岸壁L=260m 他				★工事									
			⑰ 石浜漁港	（漁港災害） 防波堤L=345m、 岸壁L=100m 他				■H26.1完成									
			⑱ 川代漁港	（漁港災害） 防波堤L=73m、 岸壁L=45m 他				★工事									
港 湾	宮古港	国	竜神崎防波堤	（防波堤整備・直轄災害復旧）防波堤L=400m	★工事（平成29年度完成予定）												
		県	出崎地区	（災害復旧） 出崎防波堤(2)L=20m			★工事										
			鎌ヶ崎地区	（災害復旧） 閉伊川 ～1.5m物揚場L=295m、 ～3.0m物揚場L=728m			用地、設計等			工事							
			日立浜地区	（災害復旧） ～4.5m岸壁L=240m、 ～2.0m物揚場L=101m、 船揚場(1)L=228m、 船揚場(2)L=84m			★工事										
			高浜地区	（災害復旧） 防波堤(北)L=250.2m、 防波堤(南)L=200m、 ～2.0m物揚場(1)、 (2)L=200m他			★工事										
			藤原地区	（災害復旧） 船揚場L=50m、埠頭保安 設備L=1,250m			★工事										
			神林地区	（災害復旧） 南防波堤L=112m、 防波堤L=31m、～2.0m物 揚場L=181m 他			用地、 設計等			★工事							
			浄土ヶ浜地区	（災害復旧） 防波堤L=89m、 ～2.0m物揚場L=44m、 さん橋L=70m				■H25.7完成									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

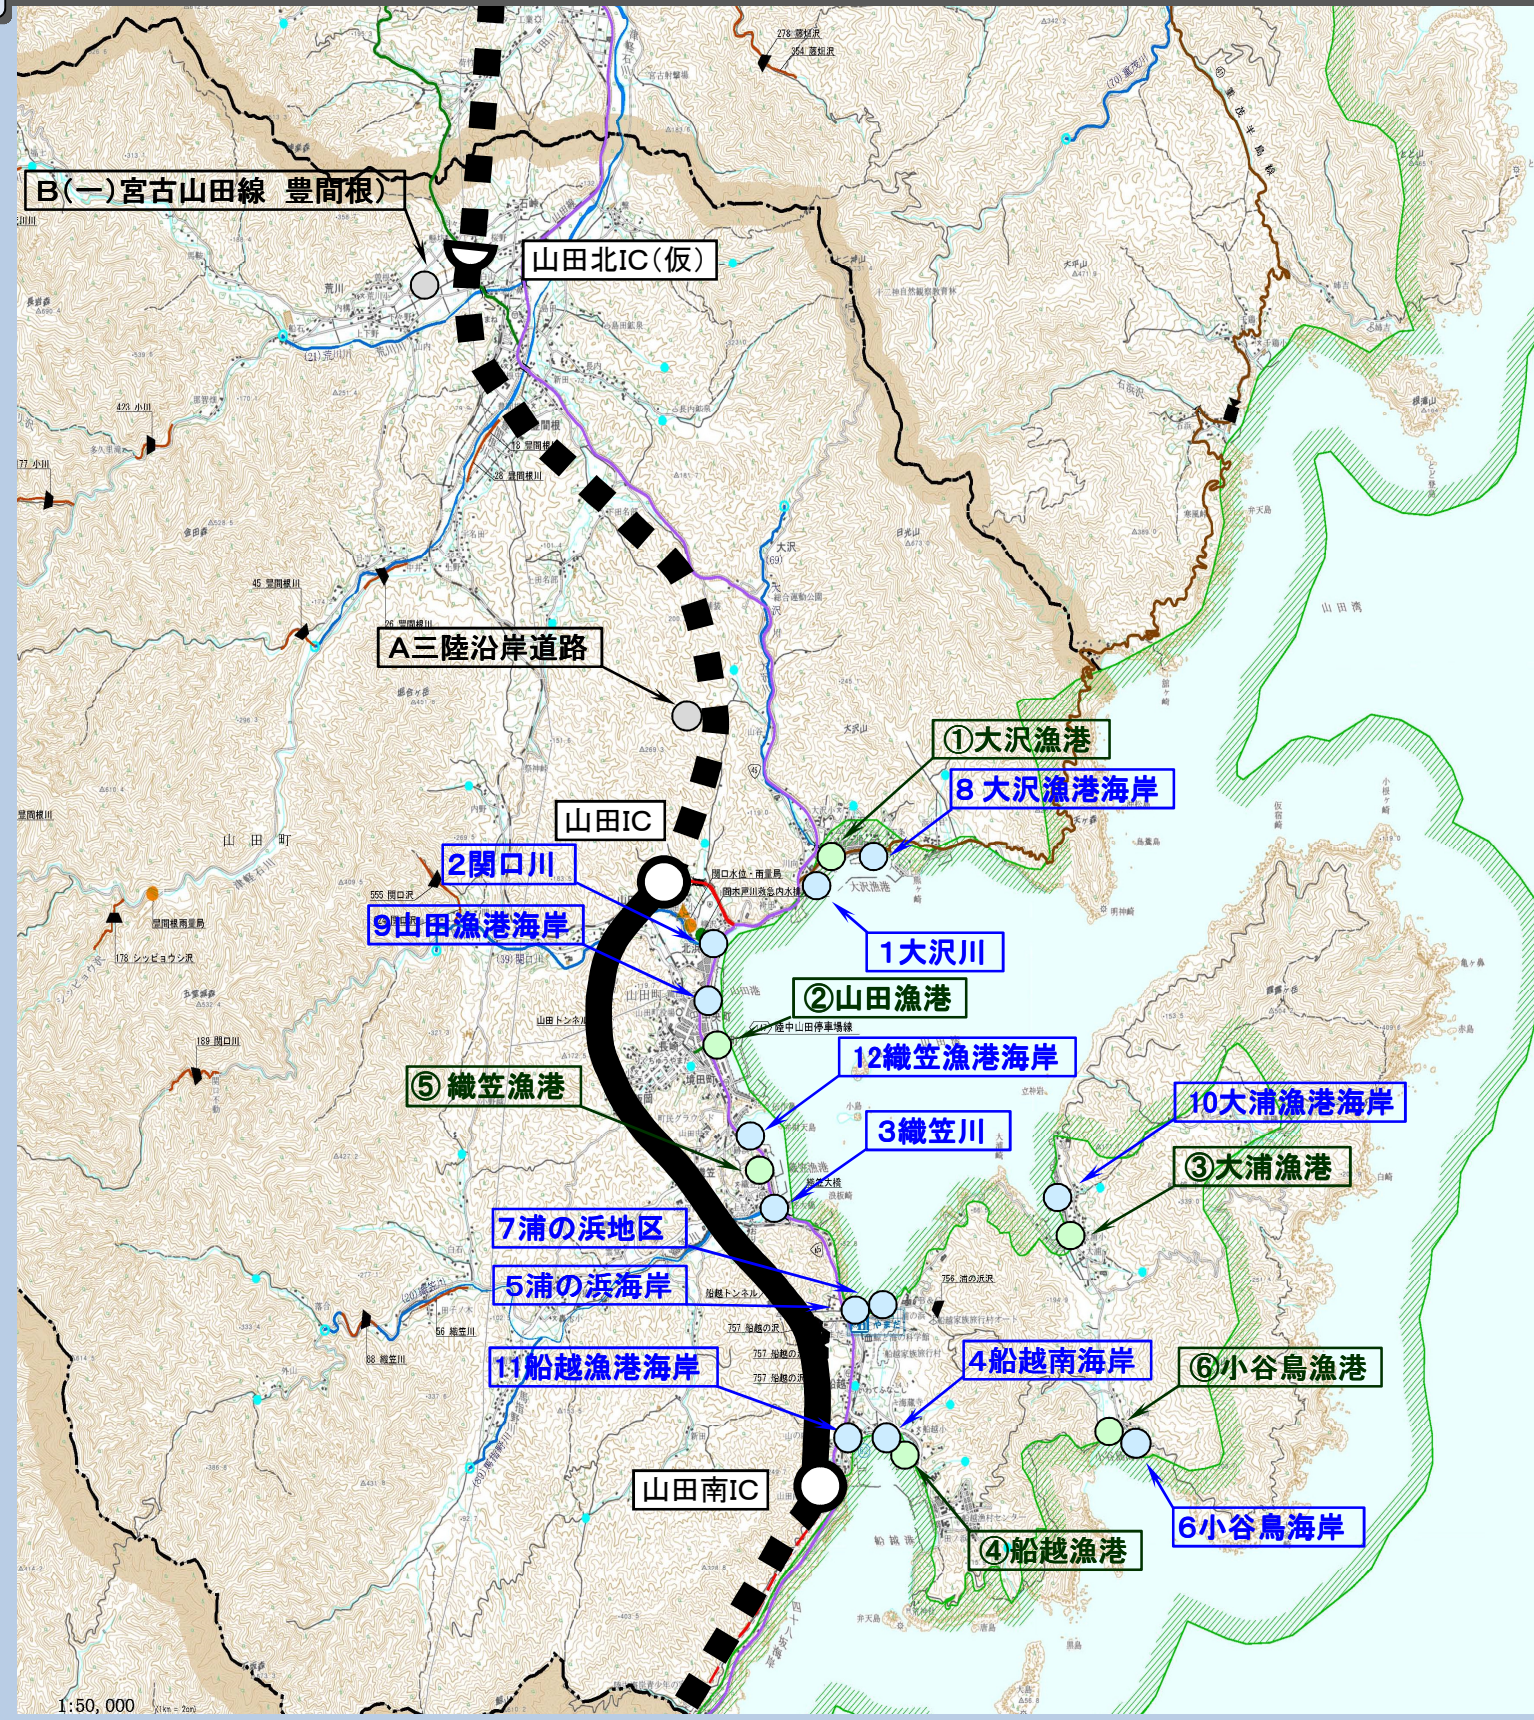


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）				
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30			
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	（三陸高潮） 水門N=1基	用地、設計等		工事									
			2 関口川	（三陸高潮） 水門N=1基			★工事									
			3 織笠川	（三陸高潮） 水門N=1基			★工事									
			4 船越南海岸	（災害復旧） 防潮堤L=0.4km	用地、設計等		★工事									
	農地海岸		5 浦の浜海岸	（海岸保全施設災害） 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基			★工事									
			6 小谷鳥海岸	（海岸保全施設災害） 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基			★工事									
	林野海岸		7 浦の浜地区	（治山施設災害） 防潮堤L=0.4km	■H25.3完成											
	漁港海岸		8－1 大沢漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=2.7km、 水門N=9基 他	用地、設計等		工事									
			8－2 大沢（熊ヶ崎地区）	（海岸高潮） 防潮堤L=0.4km			用地、設計等		工事							
			9－1 山田漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=1.9km、 水門N=1基 他	用地、設計等		★工事									
			9－2 山田（柳沢地区）	（海岸高潮） 防潮堤L=0.5km			用地、設計等		★工事							
			10 大浦漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=1.7km、 水門N=6基 他	用地、設計等		★工事									
			11－1 船越漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=1.4km、 水門N=6基 他	用地、設計等		★工事									
			11－2 船越（山ノ内地区）	（海岸高潮） 防潮堤L=0.4km			用地、設計等		工事							
			町	12 織笠漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=1.3km、 水門N=2基 他	用地、設計等		★工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	山田宮古道路（山田～宮古南）	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.17起工式											
				釜石山田道路	★用地・工事の推進											
	復興支援道路	県	B（一）宮古山田線	豊間根	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
漁港	漁港	県	① 大沢漁港	（漁港災害） 防波堤L=1,360m、 岸壁L=1,417m 他			★工事									
			② 山田漁港	（漁港災害） 防波堤L=913m、 岸壁L=2,376m 他			★工事									
			③ 大浦漁港	（漁港災害） 防波堤L=424m、 岸壁L=1,286m 他			★工事									
			④ 船越漁港	（漁港災害） 防波堤L=1,398m、 岸壁L=2,346m 他			★工事									
		町	⑤ 織笠漁港	（漁港災害） 防波堤L=628m、 岸壁L=675m 他			★工事									
			⑥ 小谷鳥漁港	（漁港災害） 防波堤L=348m、 岸壁L=176m 他			★工事									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

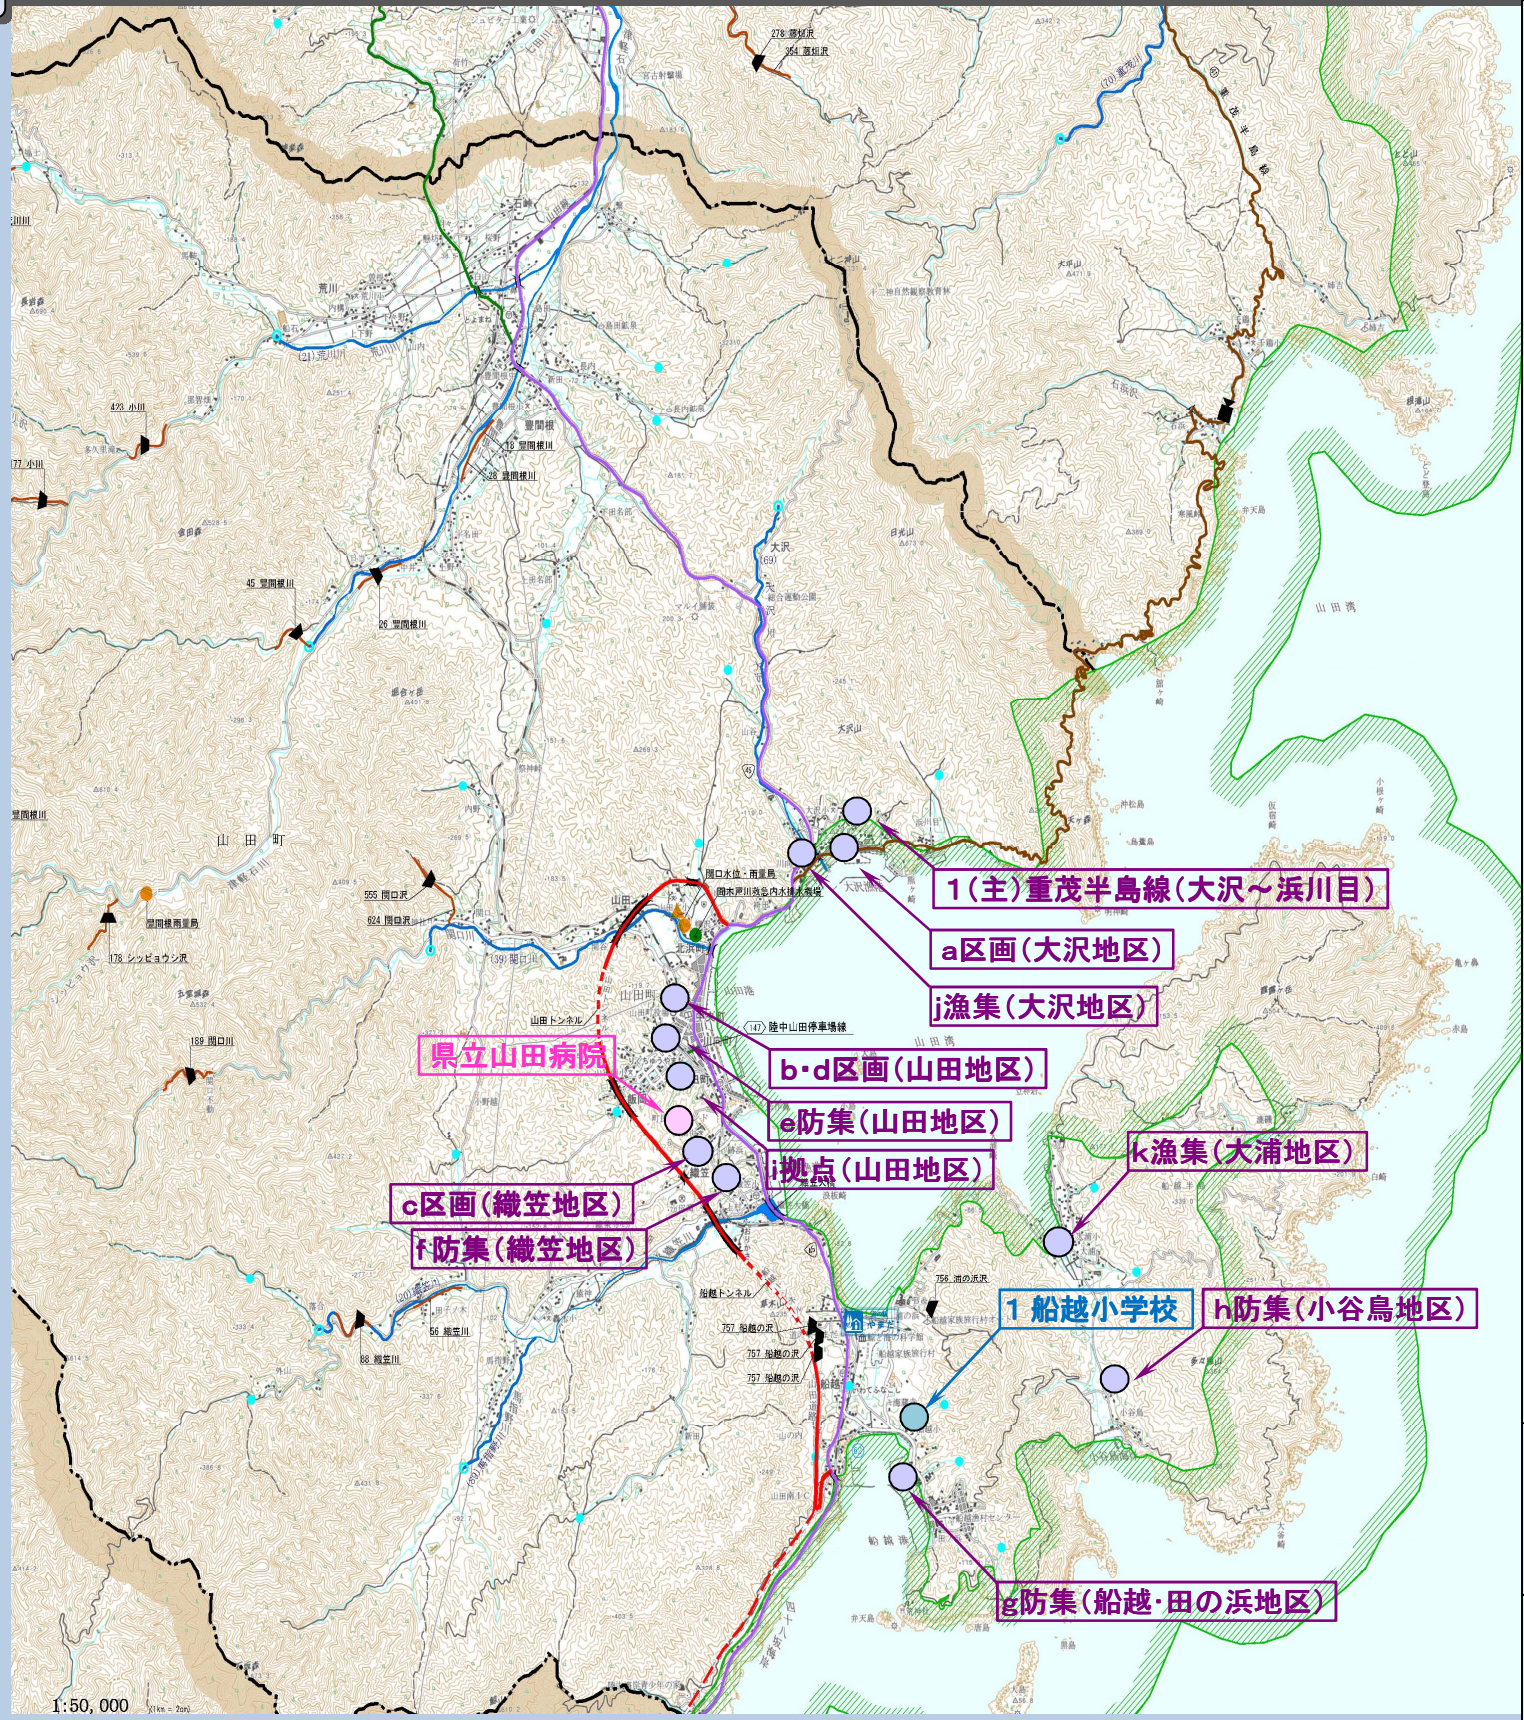


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積:6.5ha 対象戸数:90戸 (民90戸)	用地、設計等		工事				民90戸			
			b 山田地区	区域面積:20.3ha 対象戸数:345戸 (民205戸・公140戸)	用地、設計等		★工事				H28以降-民205戸	公140		
			c 織笠地区	区域面積:2.5ha 対象戸数:27戸 (民27戸)	用地、設計等		★工事				民27戸			
			d 山田 (低地部)地区	未定										
	防災集団移転	町	e 山田地区	対象戸数:339戸 (民154戸・公185戸)	用地、設計等		工事				民154戸・公185戸			
			f 織笠地区	対象戸数:165戸 (民143戸・公22戸)	用地、設計等		★工事				民143戸・公22戸			
			g 船越・ 田の浜地区	対象戸数:224戸 (民160戸・公64戸)	用地、設計等		★工事				民160戸	公64戸		
			h 小谷鳥地区	対象戸数:4戸 (民4戸)	用地、設計等		★工事				民4戸			
	津波復興拠点	町	i 山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積:2.3ha	用地、設計等		★工事							
				(公共防災エリア) 区域面積:2.7ha	用地、設計等		★工事							
			j 大沢地区	集落道、用地造成他 対象戸数:177戸 (民144戸・公33戸)	用地、設計等		★工事				民3戸	民31戸・公33戸	民110戸	
			k 大浦地区	集落道、用地造成他 対象戸数:30戸 (民8戸・公22戸)	用地、設計等		★工事(用地造成はH26完了)				民8戸	公22戸		
	まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
医療	病院	県	県立山田病院	織笠地区山田中学校北側町有地	用地、設計等		工事							
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧)移転	■H26.3完成									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町3/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

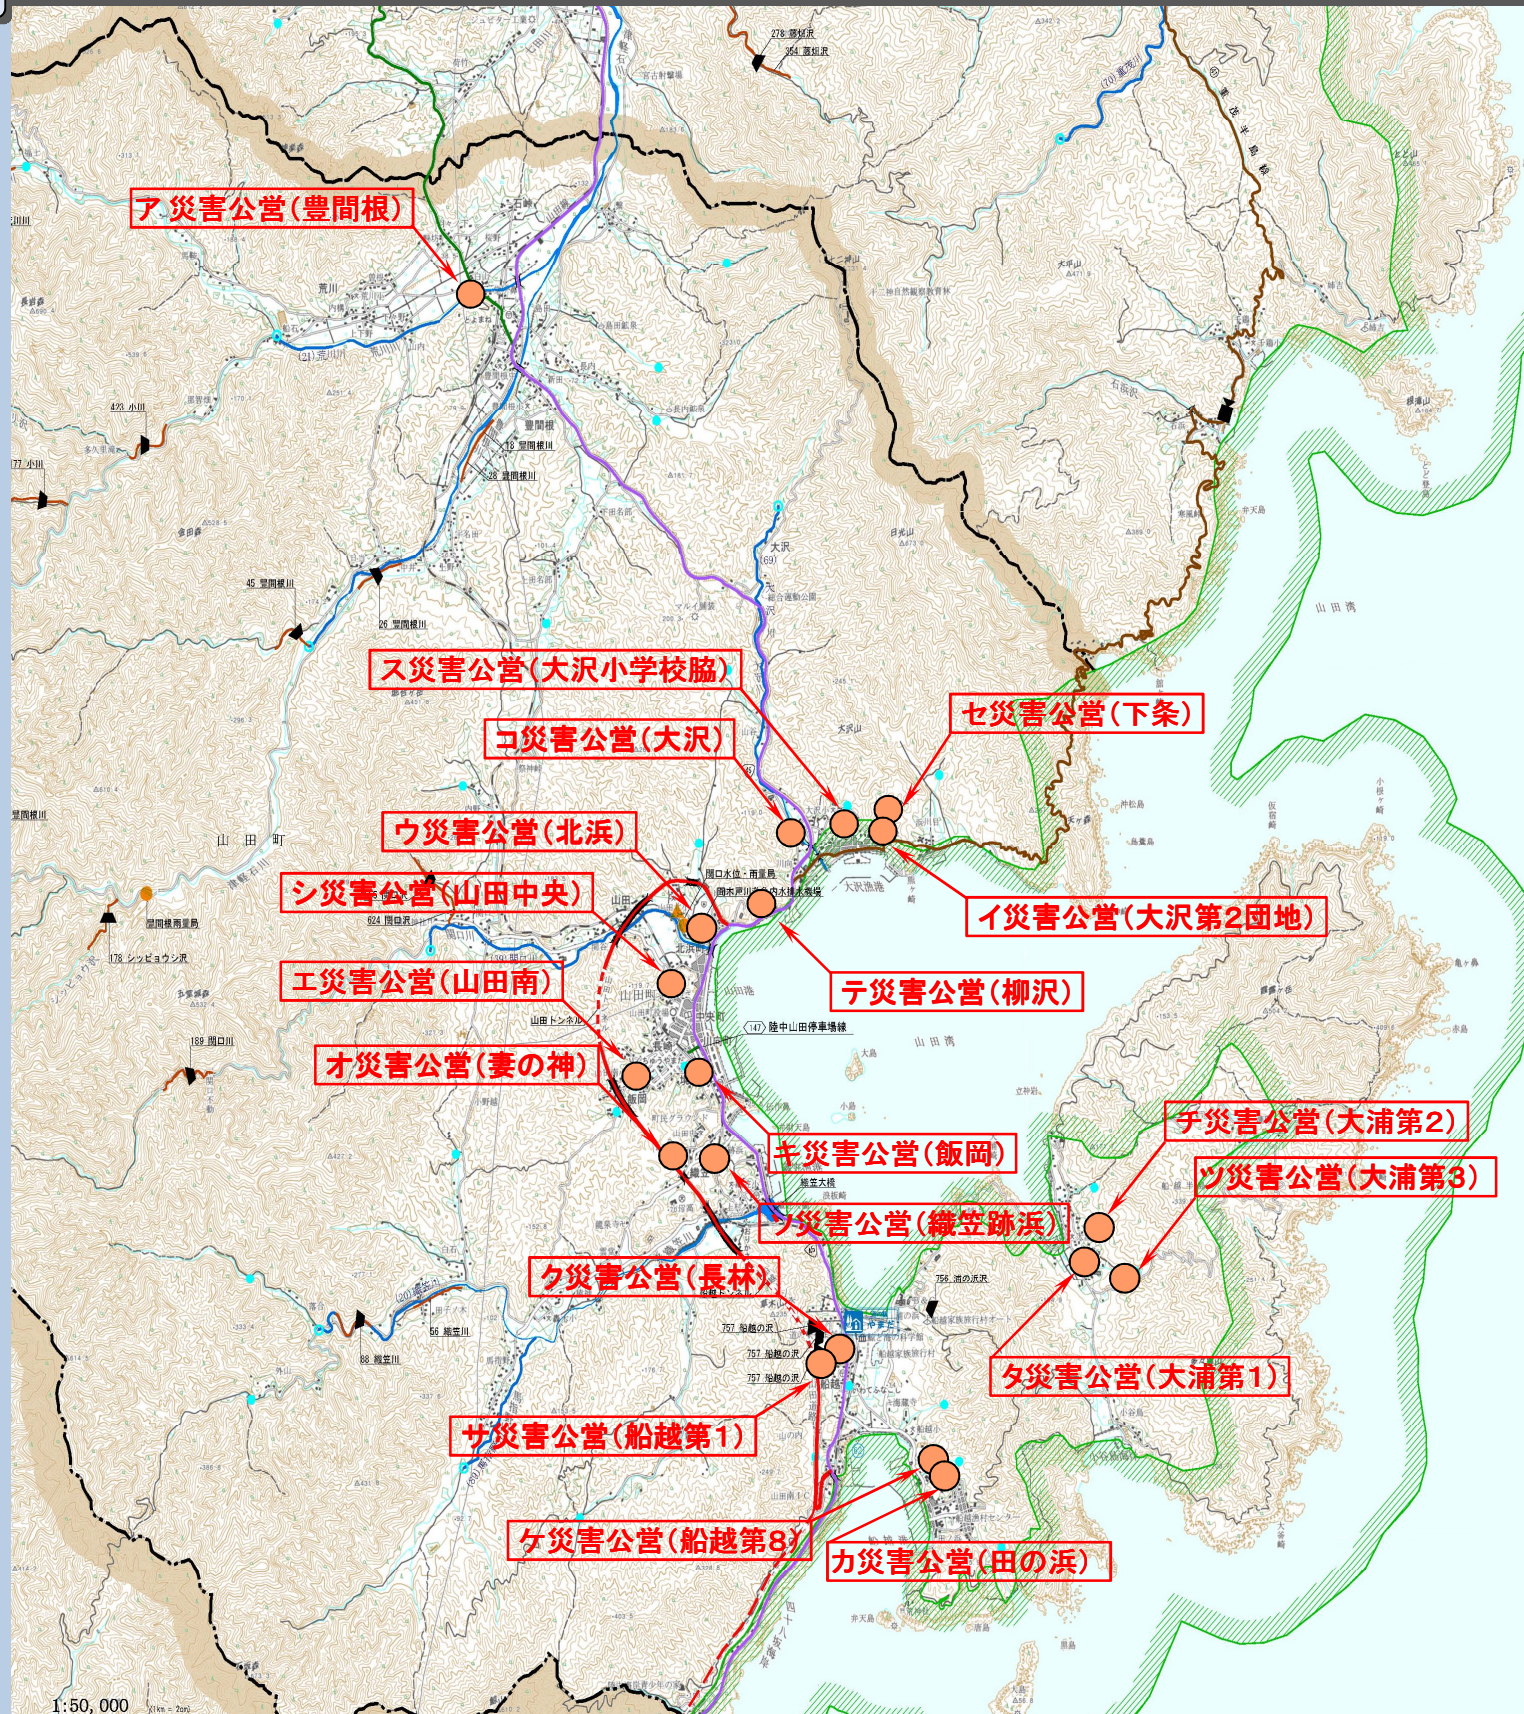


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 豊間根 (単独)	S造3階 予定戸数: 72戸			★工事	72戸						
			イ 大沢第2団地 (単独)	RC造 予定戸数: 20戸				用地、設計等・工事				20戸		
			ウ 北浜 (単独)	RC造5階 予定戸数: 90戸		用地、設計等		工事		90戸				
			エ 山田南 (防: 山田地区)	RC造 予定戸数: 70戸				用地、設計等・工事				70戸		
	設計・施工一括選定	県	オ 妻の神 (単独)	RC造 予定戸数: 70戸		用地、設計等		工事		70戸				
			カ 田の浜 (単独)	予定戸数: 20戸				用地、設計等・工事				20戸		
	直接建設	県	キ 飯岡 (防: 山田地区)	木造 予定戸数: 115戸				用地、設計等・工事				115戸		
			ク 長林 (防: 船越・田の浜地区)	木造 予定戸数: 21戸				用地、設計等・工事				21戸		
			ケ 船越第8 (防: 船越・田の浜地区)	木造 予定戸数: 13戸				用地、設計等・工事				13戸		
			コ 大沢 (単独)	RC造5階 予定戸数: 35戸		用地、設計等		工事		35戸				
			サ 船越第1 (防: 船越地区)	予定戸数: 30戸				用地、設計等・工事				30戸		
			シ 山田中央 (区: 山田地区)	RC造 予定戸数: 140戸				用地、設計等				140戸		
			ス 大沢小学校脇 (漁: 大沢地区)	木造 予定戸数: 17戸		用地、設計等				17戸				
			セ 下条 (漁: 大沢地区)	木造 予定戸数: 16戸		用地、設計等				16戸				
	直接建設	町	ソ 織笠跡浜 (防: 織笠地区)	木造 予定戸数: 22戸		用地、設計等				22戸				
			タ 大浦第1 (単独)	木造 予定戸数: 9戸		用地、設計等				9戸				
			チ 大浦第2 (漁: 大浦地区)	木造 予定戸数: 11戸		用地、設計等				11戸				
			ツ 大浦第3 (漁: 大浦地区)	木造 予定戸数: 11戸		用地、設計等				11戸				
			テ 柳沢(改修) (単独)	予定戸数: 49戸						49戸				
			ト 柳沢(改修) (単独)	予定戸数: 49戸				工事						
			ナ 柳沢(改修) (単独)	予定戸数: 49戸				工事						
			ネ 柳沢(改修) (単独)	予定戸数: 49戸				工事						
改修	町	町	ト 柳沢(改修) (単独)	予定戸数: 49戸				工事						
			ナ 柳沢(改修) (単独)	予定戸数: 49戸				工事						

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町1/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」

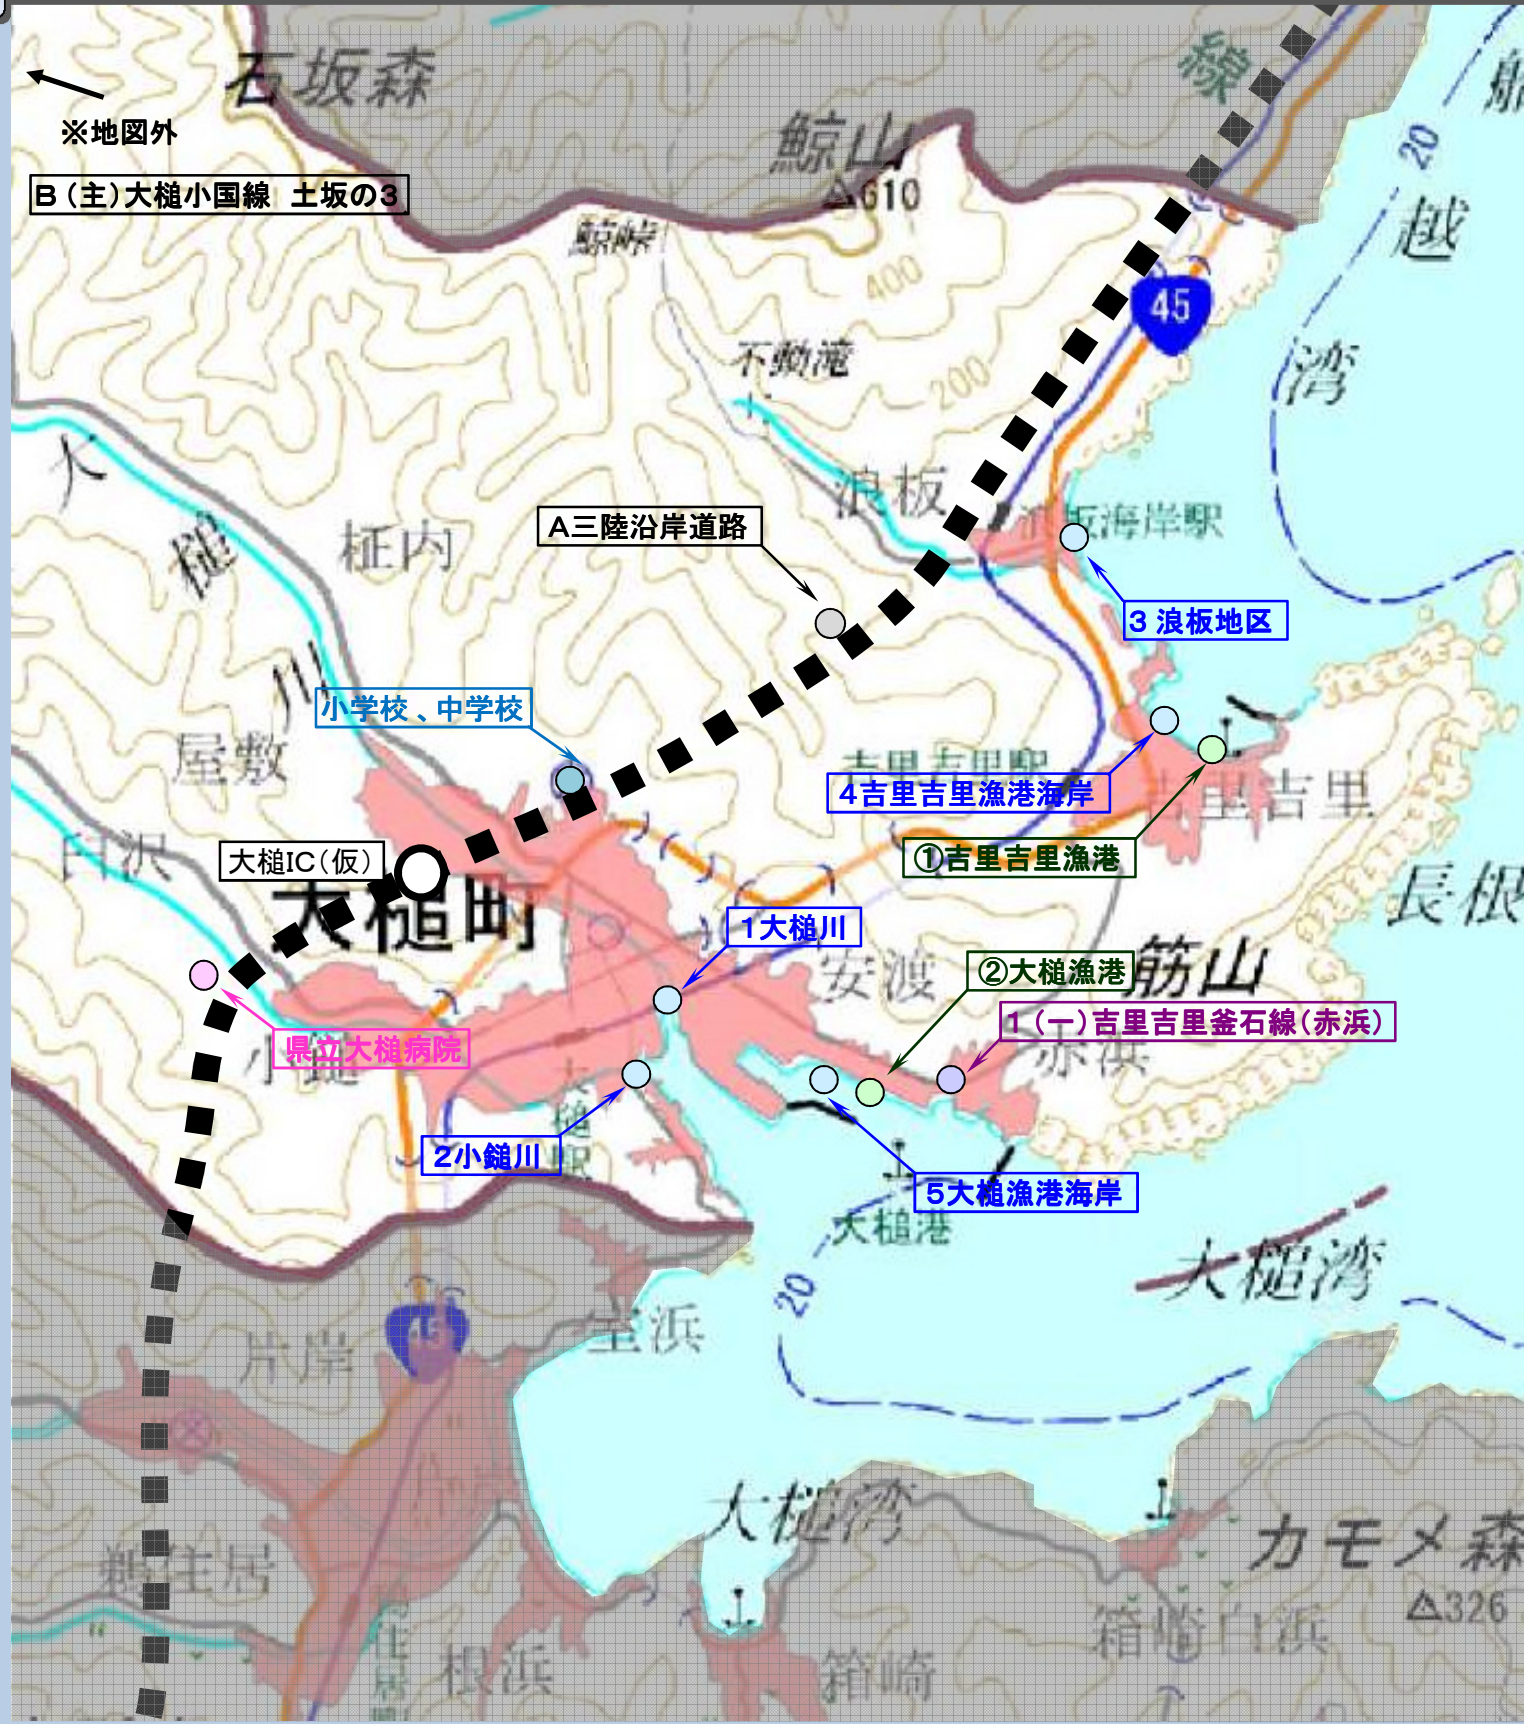

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=1基	用地、設計等			★工事							
			2 小槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=1基	用地、設計等			★工事							
	林野海岸		3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H24.10完成										
	漁港海岸		4 吉里吉里 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=4基 他	用地、設計等			工事							
			5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=3基 他	用地、設計等			★工事							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路			★用地・工事の推進								
	復興関連道路	県	B (主) 大槌小国線	土坂の3			★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
漁 港	漁 港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=753m 他	用地、設計等			★工事							
			② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、 岸壁L=2,582m 他	用地、設計等			★工事							
医 療	病院	県	県立大槌病院	寺野地区ふれあい 運動公園内	用地、設計等			工事							
教 育	小学校	町	大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等			工事							
	中学校		大槌中学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等			工事							
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (一)吉里吉里 釜石線	赤浜			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								

H25 小学校4校統合(新校名:大槌小学校)
移転場所について、協議・調整中であるため、大よその予定を掲載。
移転完了まで仮設校舎を使用。

移転場所について、協議・調整中であるため、大よその予定を掲載。
移転完了まで仮設校舎を使用。

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町2/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (豪雪復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる復興への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
土地区画整理			a 町方地区	区域面積：29.7ha 対象戸数：808戸 (民651戸・公157戸)	用地、設計等			★工事		公38戸	公67戸			
			b 安渡地区	区域面積：6.0ha 対象戸数：191戸 (民104戸・公87戸)	用地、設計等			★工事		民104・公66戸	公21戸			
			c 赤浜地区	区域面積：7.6ha 対象戸数：150戸 (民150戸)	用地、設計等			★工事		民150戸				
			d 吉里吉里地区	区域面積：9.1ha 対象戸数：292戸 (民263戸・公29戸)	用地、設計等			★工事		民263・公29戸				
津波復興拠点			e 町方地区	区域面積 町方地区(3.0ha)	用地、設計等			★工事						
			f 安渡地区	区域面積 安渡地区(18.7ha)	用地、設計等			★工事						
復興まちづくり	防災集団移転	町	g 赤浜地区 (赤浜①団地)	対象戸数：38戸 (民24戸・公14戸)	用地、設計等			★工事		民24戸・公14戸				
			h 赤浜地区 (赤浜②団地)	対象戸数：40戸 (民34戸・公6戸)	用地、設計等			★工事		民34戸	公6戸			
			i 赤浜地区 (赤浜⑥団地)	対象戸数：44戸 (民25戸・公19戸)	用地、設計等			★工事		民25戸	公19戸			
			j 吉里吉里地区 (吉里吉里①団地)	対象戸数：21戸 (民21戸)	用地、設計等			★工事		民2戸				
			k 吉里吉里地区 (吉里吉里②団地)	対象戸数：38戸 (民38戸)	用地、設計等			★工事		民19戸				
			l 吉里吉里地区 (吉里吉里③団地)	対象戸数：14戸 (民14戸)	用地、設計等			★工事		民38戸				
			m 浪板地区 (浪板①団地)	対象戸数：13戸 (民13戸)	用地、設計等			★工事		民14戸				
			n 安渡地区	対象戸数：35戸 (民35戸)	用地、設計等			★工事		民13戸				
			o 安渡地区 (安渡①団地)	対象戸数：77戸 (民77戸)	用地、設計等			★工事		民35戸				
			p 安渡地区 (安渡②団地)	対象戸数：18戸 (民18戸)	用地、設計等			★工事		民77戸				
			q 安渡地区 (安渡③団地)	対象戸数：27戸 (民27戸)	用地、設計等			★工事		民18戸				
			r 安渡地区 (安渡④団地)	対象戸数：19戸 (民19戸)	用地、設計等			★工事		民27戸				
			s 町方・小枕・伸松地区 (寺野団地)	対象戸数：182戸 (民155戸・公27戸)	用地、設計等			★工事		民19戸				
			t 町方・小枕・伸松地区 (大ケ口、沢山、夏木、 榎内、屋敷前団地)	対象戸数：77戸 (民77戸)	用地、設計等			★工事		民42戸 民28戸・公27戸	民85戸			
			u 町方・小枕・伸松地区 (町方団地)	対象戸数：100戸 (民100戸)	用地、設計等			★工事		民4戸 民38戸 民35戸				
			v 町方・小枕・伸松地区 (小枕団地)	対象戸数：36戸 (民36戸)	用地、設計等			★工事		民20戸 H28以降-民80戸				
			w 町方・小枕・伸松地区 (花輪田地区)	対象戸数：10戸 (民10戸)	用地、設計等			工事		民36戸 民10戸				
漁業集落防災機能強化			x 吉里吉里地区	漁業集落排水施設他	用地、設計等			工事						
			y 浪板地区	漁業集落排水施設、 用地造成、集落道他 対象戸数：21戸 (民10戸・公11戸)	用地、設計等			工事		民10戸 公11戸				
			z 安渡地区	集落道他	用地、設計等			工事						
			aa 赤浜地区	用地造成、集落道他 対象戸数：2戸 (民2戸)	用地、設計等			工事		民2戸				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町3/3】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
直接建設	県	ア	吉里吉里 (単独)	RC造5階 予定戸数:34戸			34戸 ■H25.8完成							
		イ	大槌(桎内) (単独)	RC造 予定戸数:90戸			用地、設計等			90戸				
		ウ	大槌(屋敷前) (単独)	RC造5階 予定戸数:151戸				151戸 ★工事						
		エ	安渡二丁目 (区:安渡地区)	予定戸数:46戸						用地、設計等・工事	46戸			
		オ	大槌 (その他地区)	予定戸数:179戸						用地、設計等・工事	179戸			
買取	町	カ	大ケロ (単独)	木造 予定戸数:70戸			70戸 ■H25.8完成							
		キ	屋敷前 (単独)	木造 予定戸数:21戸			21戸 ■H25.11完成							
		ク	大ケロ2丁目 (単独)	木造 予定戸数:23戸				23戸 ★工事						
		ケ	桎内 (単独)	木造 予定戸数:13戸				13戸 工事						
		コ	桎内 (単独)	木造 予定戸数:18戸				用地、設計等			18戸 工事			
		サ	三枚堂 (単独)	木造 予定戸数:27戸				用地、設計等		27戸 工事				
		シ	町方 (区:町方地区)	予定戸数:52戸				用地、設計等		52戸 工事				
		ス	町方 (区:町方地区)	予定戸数:18戸				用地、設計等			18戸 工事			
		セ	町方 (区:町方地区)	予定戸数:20戸				用地、設計等			20戸 工事			
		ソ	町方 (区:町方地区)	木造 予定戸数:67戸				用地、設計等			67戸 工事			
		タ	吉里吉里 (区:吉里吉里地区)	木造 予定戸数:29戸				用地、設計等			29戸 工事			
		チ	赤浜 (防:赤浜地区 赤浜①団地)	木造 予定戸数:14戸				用地、設計等			14戸 工事			
		ツ	赤浜 (防:赤浜地区 赤浜②団地)	木造 予定戸数:6戸				用地、設計等			6戸 工事			
		テ	赤浜 (防:赤浜地区 赤浜⑥団地)	木造 予定戸数:19戸				用地、設計等			19戸 工事			
		ト	浪板 (漁:浪板地区)	木造 予定戸数:11戸				用地、設計等			11戸 工事			
		ナ	浪板(1) (単独)	木造 予定戸数:4戸				用地、設計等			4戸 工事			
		ニ	安渡 (区:安渡地区)	木造 予定戸数:20戸				用地、設計等			20戸 工事			
		ヌ	安渡 (区:安渡地区)	木造 予定戸数:21戸				用地、設計等			21戸 工事			
		ネ	町方 (防:寺野地区)	木造 予定戸数:16戸				用地、設計等			16戸 工事			
		ノ	町方 (防:寺野地区)	木造 予定戸数:11戸				用地、設計等			11戸 工事			

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市1/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

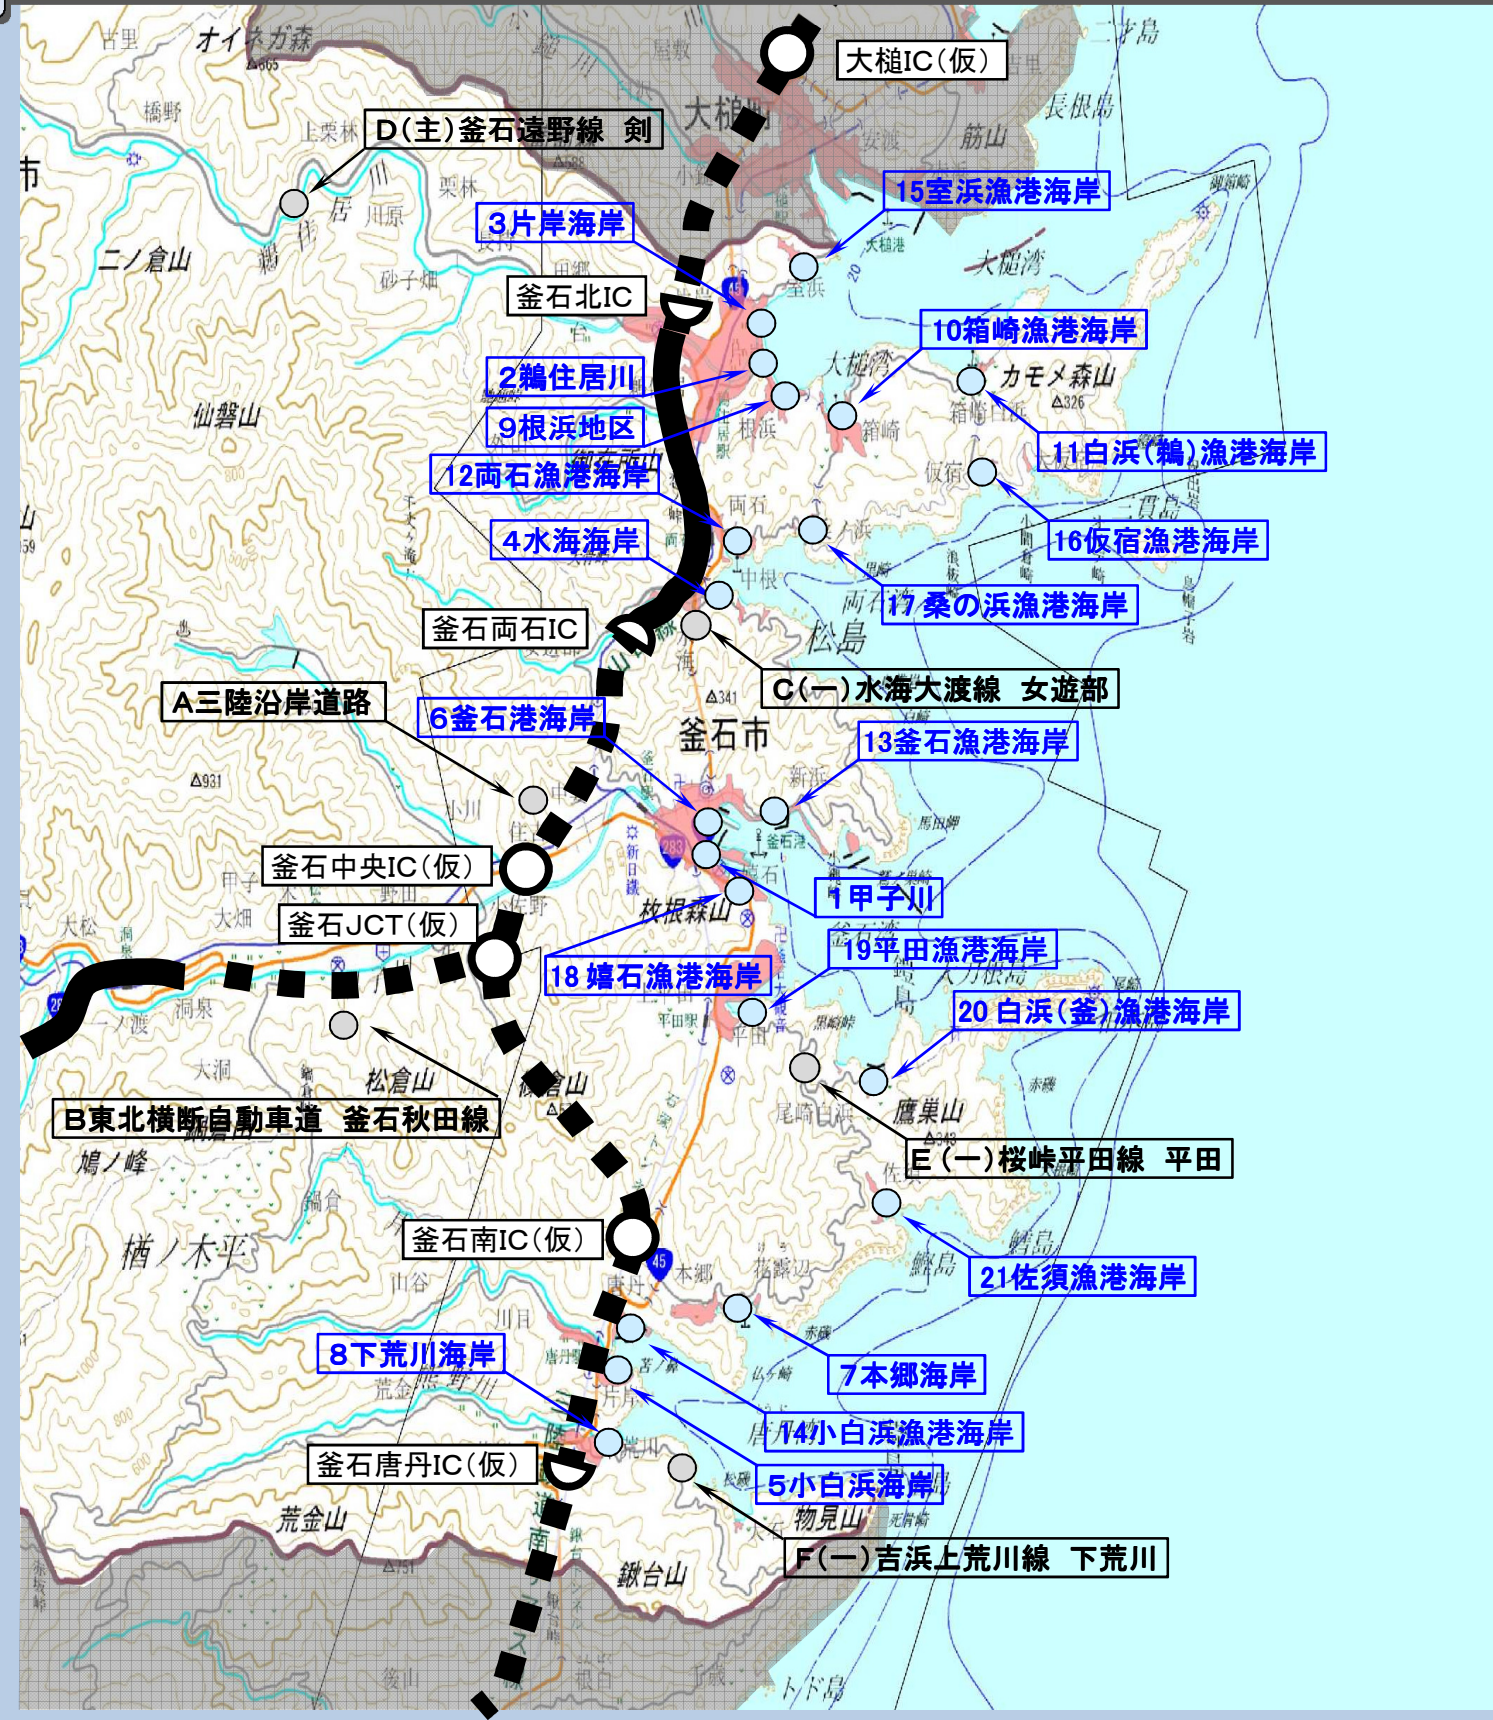

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等	★工事										
			2 鶴住居川	(災害復旧) 水門等N=1基	用地、設計等	★工事										
			3 片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 陸間等N=1基	用地、設計等	★工事										
			4 水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基、 離岸堤L=280m		★工事										
			5 小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=2基	用地、設計等	★工事										
			6 釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、 水門等N=19基		★工事										
	農地海岸		7 本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基		★工事										
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	用地、設計等	★工事										
	林野海岸		9 根浜地区	(治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km	用地、設計等	★工事										
	漁港海岸		10 箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事										
			11 白浜(鶴) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=3基 他	用地、設計等	工事										
			12 両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基 他	用地、設計等	工事										
			13 釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.8km、 水門N=6基 他	用地、設計等	★工事										
			14 小白浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事										
			市	15 室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等	用地、設計等 工事									
				16 仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	用地、設計等	工事									
				17 桑の浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等	工事									
				18 壙石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等	工事									
				19 平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	用地、設計等	工事									
				20 白浜(釜石) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等	工事									
	21 佐須漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	用地、設計等	工事										
復興道路等	復興道路	国	A 釜石山田道路	★用地・工事の推進												
			吉浜釜石道路 (吉浜～釜石)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.25起工式												
			B 東北横断自動車道 釜石秋田線	釜石道路 (釜石～釜石西)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H24.11.4起工式											
	復興支援道路	県	C (一) 水海大渡線	女遊部	■H24.3完成											
			復興関連道路	D (主) 釜石遠野線	剣	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.9着工										
				E (一) 桜峠平田線	平田	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.10着工										
F (一) 吉浜上荒川線				下荒川	★測量、設計、用地買収等を行い、 順次工事に着手 ◆H24.10着工											


基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30				
復興 まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	r 室浜地区	集落道 他 対象戸数:17戸 (民11戸・公6戸)	用地、設計等		民11戸		公6戸								
						工事											
			s 仮宿地区	集落道、用地造成 他 対象戸数4戸 (民4戸)	用地、設計等		民4戸										
					工事												
			t 桑ノ浜地区	集落道 他 対象戸数:10戸 (民5戸・公5戸)	用地、設計等				民5戸		公5戸						
					工事												
			u 花露辺地区	集落道 他	用地、設計等		★工事										
			v 大石地区	集落道 他	用地、設計等				工事								
			w 新浜町地区	用地造成他	用地、設計等				工事								
			x 佐須地区	用地造成他 対象戸数:6戸 (民4戸・公2戸)	用地、設計等		民4戸		公2戸								
					工事												
			y 根浜地区	用地造成他 対象戸数:8戸 (民4戸・公4戸)	用地、設計等		民4戸		公4戸								
					工事												
			z 箱崎地区	用地造成他 対象戸数:35戸 (民18戸・公17戸)	用地、設計等				民18戸・公17戸								
					工事												
	aa 箱崎白浜地区	集落道 他 対象戸数:3戸 (民3戸)	用地、設計等				民3戸										
			★工事														
	ab 両石地区	用地造成他 対象戸数:57戸 (民36戸・公21戸)	用地、設計等				民36戸		公21戸								
			工事														
	ac 尾崎白浜地区	避難路 他 対象戸数:2戸 (民2戸)	用地、設計等		民2戸												
		工事															
ad 本郷地区	用地造成他 対象戸数9戸 (民4戸・公5戸)	用地、設計等				民4戸・公5戸											
		工事															
ae 唐丹地区	集落排水施設整備 L=3.353m 処理施設整備1式	用地、設計等				工事											
まちづくり 連携道路	県	1 (一) 吉里吉里釜石線	室浜の2	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手													
		2 (一) 吉浜上荒川線	下荒川の2	測量、設計、用地買収等を行い、 順次工事に着手													
		3 (一) 吉里吉里釜石線	室浜	測量、設計、用地買収等を行い、 順次工事に着手													
		4 (一) 唐丹日頃市線	荒川	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手													
		5 (国)283号	松原	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.10着工													

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市4/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

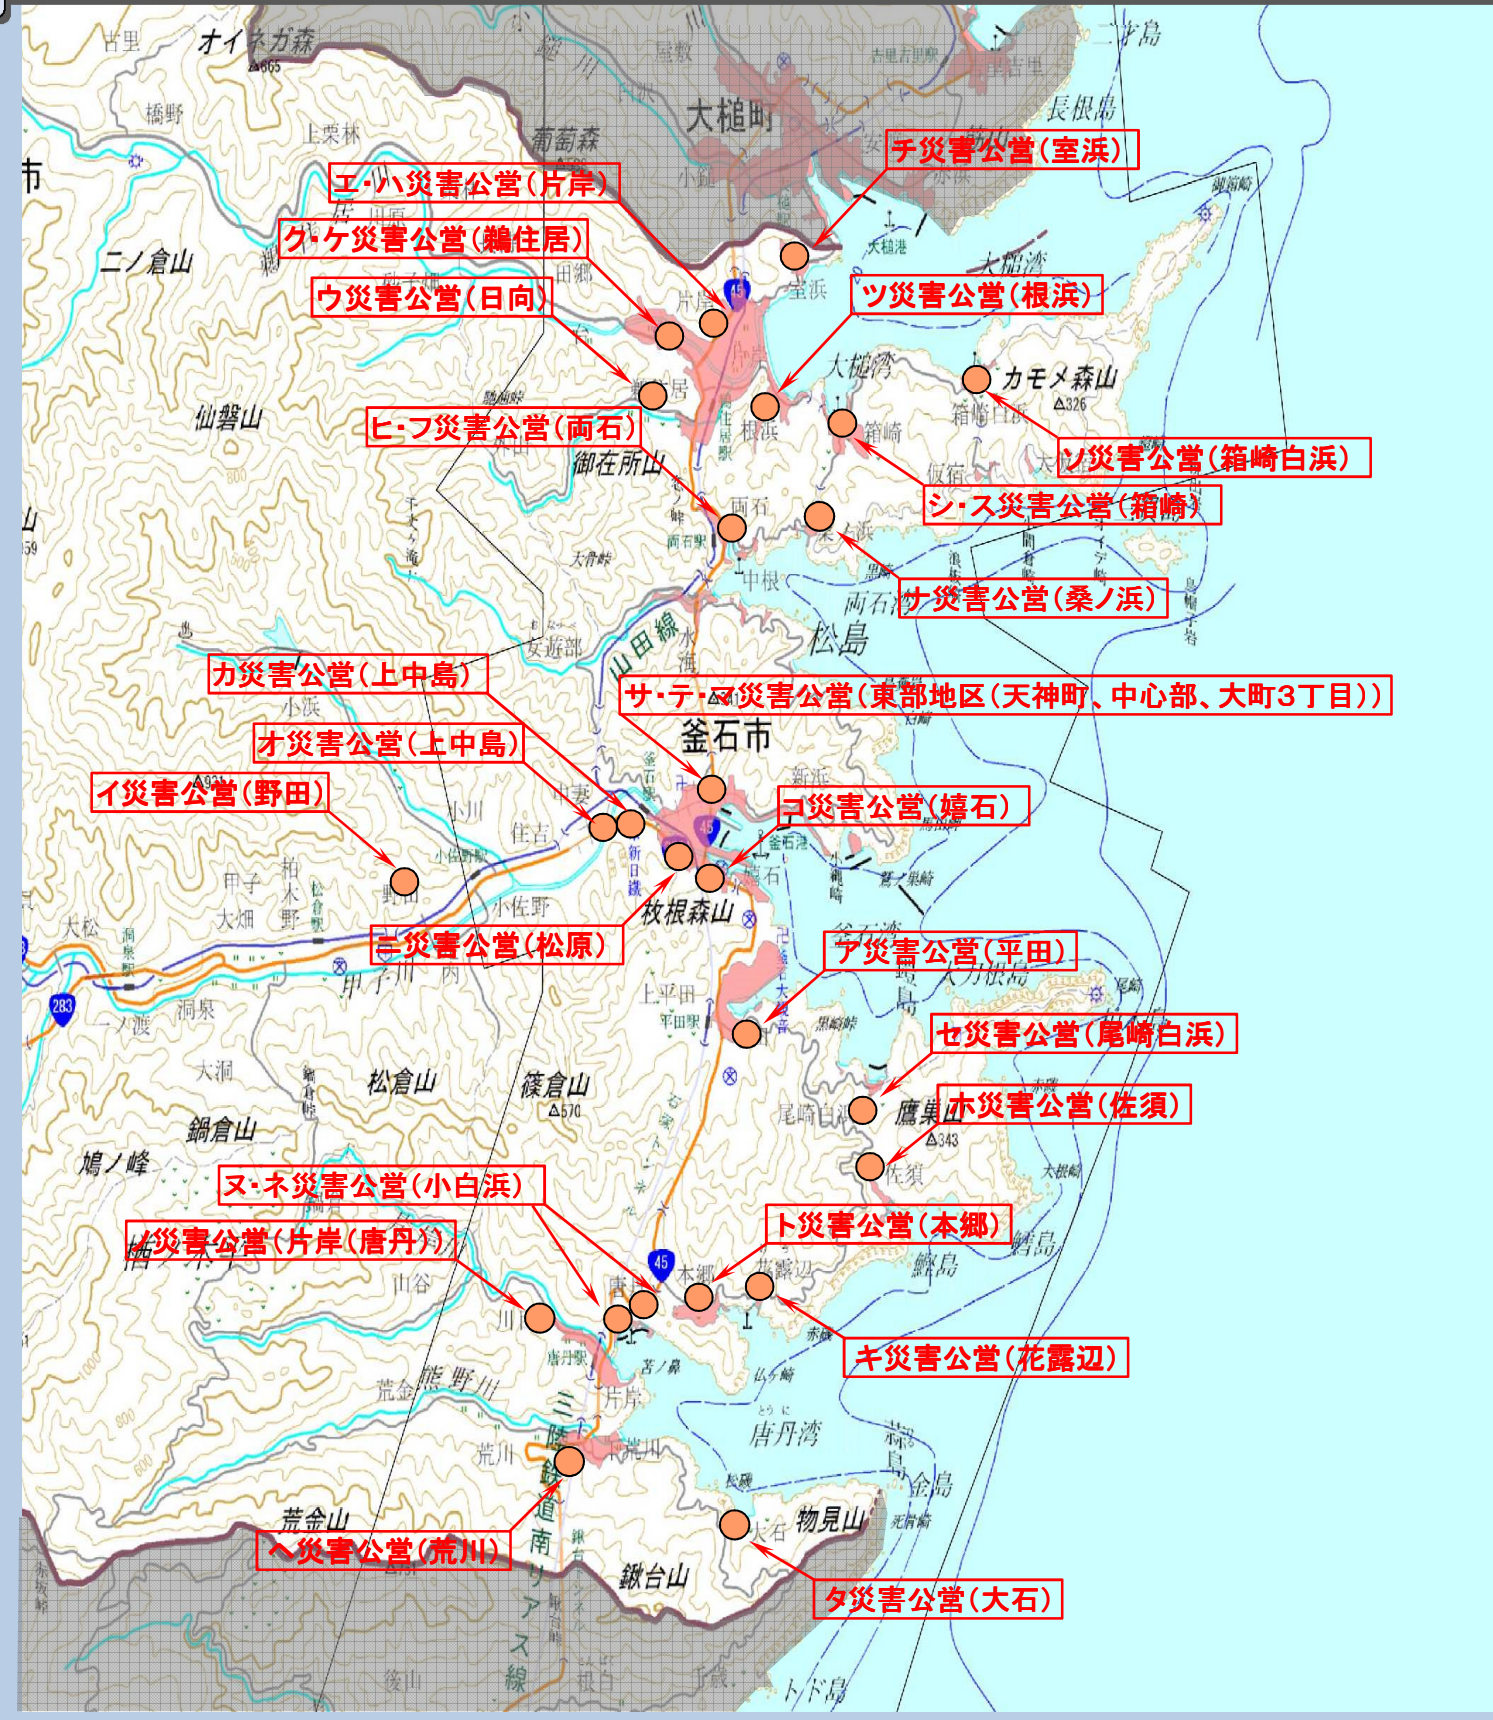


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基準復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 平田 (単独)	RC造7階 予定戸数: 126戸			126戸 ■H26.1完成							
			イ 野田 (単独)	RC造5階 予定戸数: 32戸			32戸 ■H25.10完成							
			ウ 日向 (単独)	RC造5階 予定戸数: 30戸				30戸 用地、設計等						
			エ 片岸 (単独)	RC造 予定戸数: 22戸					22戸 工事					
	買収	市	オ 上中島 (単独)	S造 予定戸数: 54戸			54戸 ■H25.3完成							
			カ 上中島 (単独)	S造 予定戸数: 156戸				156戸 ★工事						
			キ 花露辺 (防: 花露辺地区)	RC造 予定戸数: 13戸			13戸 ■H25.12完成							
			ク 鶴住居 (区: 鶴住居地区)	RC造 予定戸数: 80戸				用地、設計等		80戸 工事				
			ケ 鶴住居 (区: 鶴住居地区)	木造 予定戸数: 40戸				用地、設計等		40戸 工事				
			コ 嬉石 (区: 嬉石・松原地区)	RC造 予定戸数: 86戸				用地、設計等		86戸 工事				
			サ 東部地区 (天神町) (単独)	S造 予定戸数: 50戸				用地、設計等		50戸 工事				
			シ 箱崎 (防: 箱崎地区)	木造 予定戸数: 17戸				用地、設計等		17戸 工事				
			ス 箱崎 (防: 箱崎地区)	木造 予定戸数: 12戸				用地、設計等			12戸 工事			
			セ 尾崎白浜 (単独)	木造 予定戸数: 5戸				用地、設計等		5戸 工事				
			ソ 箱崎白浜 (単独)	木造 予定戸数: 9戸			9戸 ■H26.3完成							
			タ 大石 (単独)	木造 予定戸数: 3戸			3戸 ■H25.12完成							
			チ 室浜 (防: 室浜地区)	木造 予定戸数: 9戸				用地、設計等		9戸 工事				
			ツ 根浜 (防: 根浜地区)	木造 予定戸数: 13戸				用地、設計等		13戸 工事				
災害公営住宅	直接建設	市	テ 東部地区 (中心部) (単独)	RC造 予定戸数: 336戸				用地、設計等		336戸 工事				
			ト 本郷 (防: 本郷地区)	木造 予定戸数: 12戸				用地、設計等		12戸 工事				
			ナ 桑ノ浜 (防: 桑ノ浜地区)	木造 予定戸数: 12戸				用地、設計等			12戸 工事			
			ニ 松原 (区: 嬉石・松原地区)	RC造 予定戸数: 64戸				用地、設計等		64戸 工事				
			ヌ 小白浜 (単独)	S造 予定戸数: 27戸				用地、設計等		27戸 工事				
			ネ 小白浜 (単独)	木造 予定戸数: 3戸						3戸 工事				
			ノ 唐丹片岸 (単独)	木造 予定戸数: 6戸					6戸 工事					
			ハ 片岸 (防: 両石地区) (漁: 両石地区)	木造 予定戸数: 19戸				用地、設計等		19戸 工事				
			ヒ 両石 (防: 両石地区) (漁: 両石地区)	RC造 予定戸数: 30戸				用地、設計等			30戸 工事			
			フ 両石 (防: 両石地区) (漁: 両石地区)	木造 予定戸数: 25戸				用地、設計等			25戸 工事			
			ヘ 荒川 (防: 荒川地区)	木造 予定戸数: 8戸				用地、設計等		8戸 工事				
			ホ 佐須 (漁: 佐須地区)	木造 予定戸数: 2戸				用地、設計等		2戸 工事				
			マ 東部 (大町3丁目) (単独)	予定戸数: 44戸					44戸 工事					

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市5/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

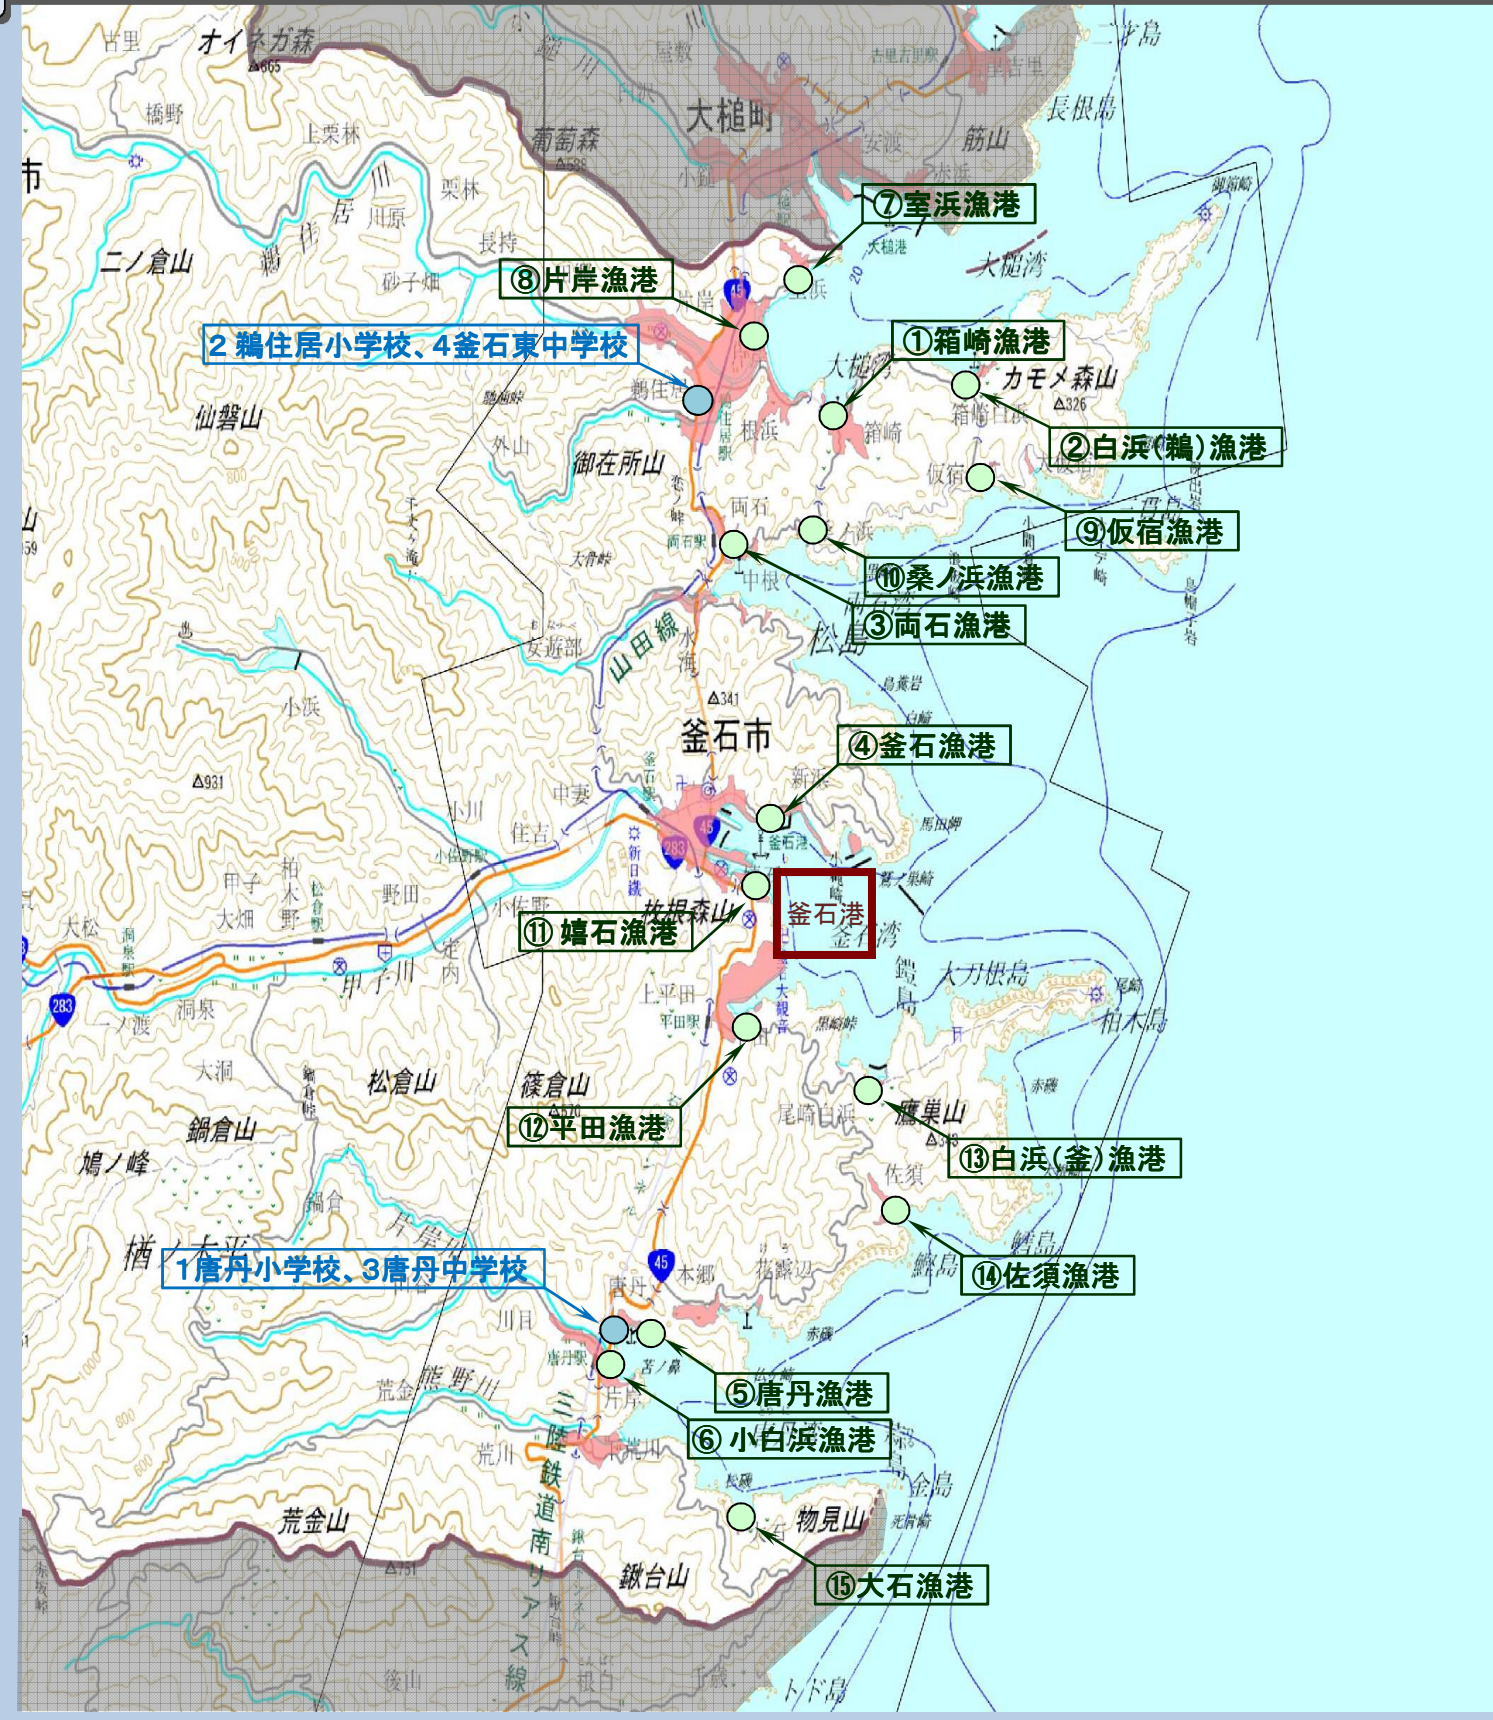


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30	
漁 港	漁 港	県	① 箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、 岸壁L=889m 他				★工事						
			② 白浜(鵜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、 岸壁L=504m 他				★工事						
			③ 両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=834m 他				★工事						
			④ 釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、 岸壁L=1,898m 他				★工事						
			⑤ 唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、 岸壁L=572m 他				★工事						
			⑥ 小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、 岸壁L=834m 他				★工事						
		市	⑦ 室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、 岸壁L=190m 他				★工事						
			⑧ 片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=135m 他				工事						
			⑨ 仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、 岸壁L=60m 他				★工事						
			⑩ 桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、 岸壁L=250m 他				★工事						
			⑪ 嬉石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、 岸壁L=304m 他				★工事						
			⑫ 平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、 岸壁L=598m 他				★工事						
			⑬ 白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、 岸壁L=378m 他				★工事						
			⑭ 佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、 岸壁L=103m 他				★工事						
			⑮ 大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、 岸壁L=233m 他				★工事						
港 湾	釜石港	国 A 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=1,660m				★工事(平成27年度完成予定)							
		県 B 須賀地区	(災害復旧) 南防波堤L=266m、 -4.0m1号物揚場 L=200m、 -7.5m岸壁L=152m他				★工事							
教 育	小学校	市	1 唐丹小学校	(災害復旧) 移転				工事			〔 4校とも移転完了まで仮設校舎を使用 〕			
			2 鵜住居小学校	(災害復旧) 移転				★工事						
	中学校		3 唐丹中学校	(災害復旧) 現敷地で新築				工事						
			4 釜石東中学校	(災害復旧) 移転				★工事						

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市2/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

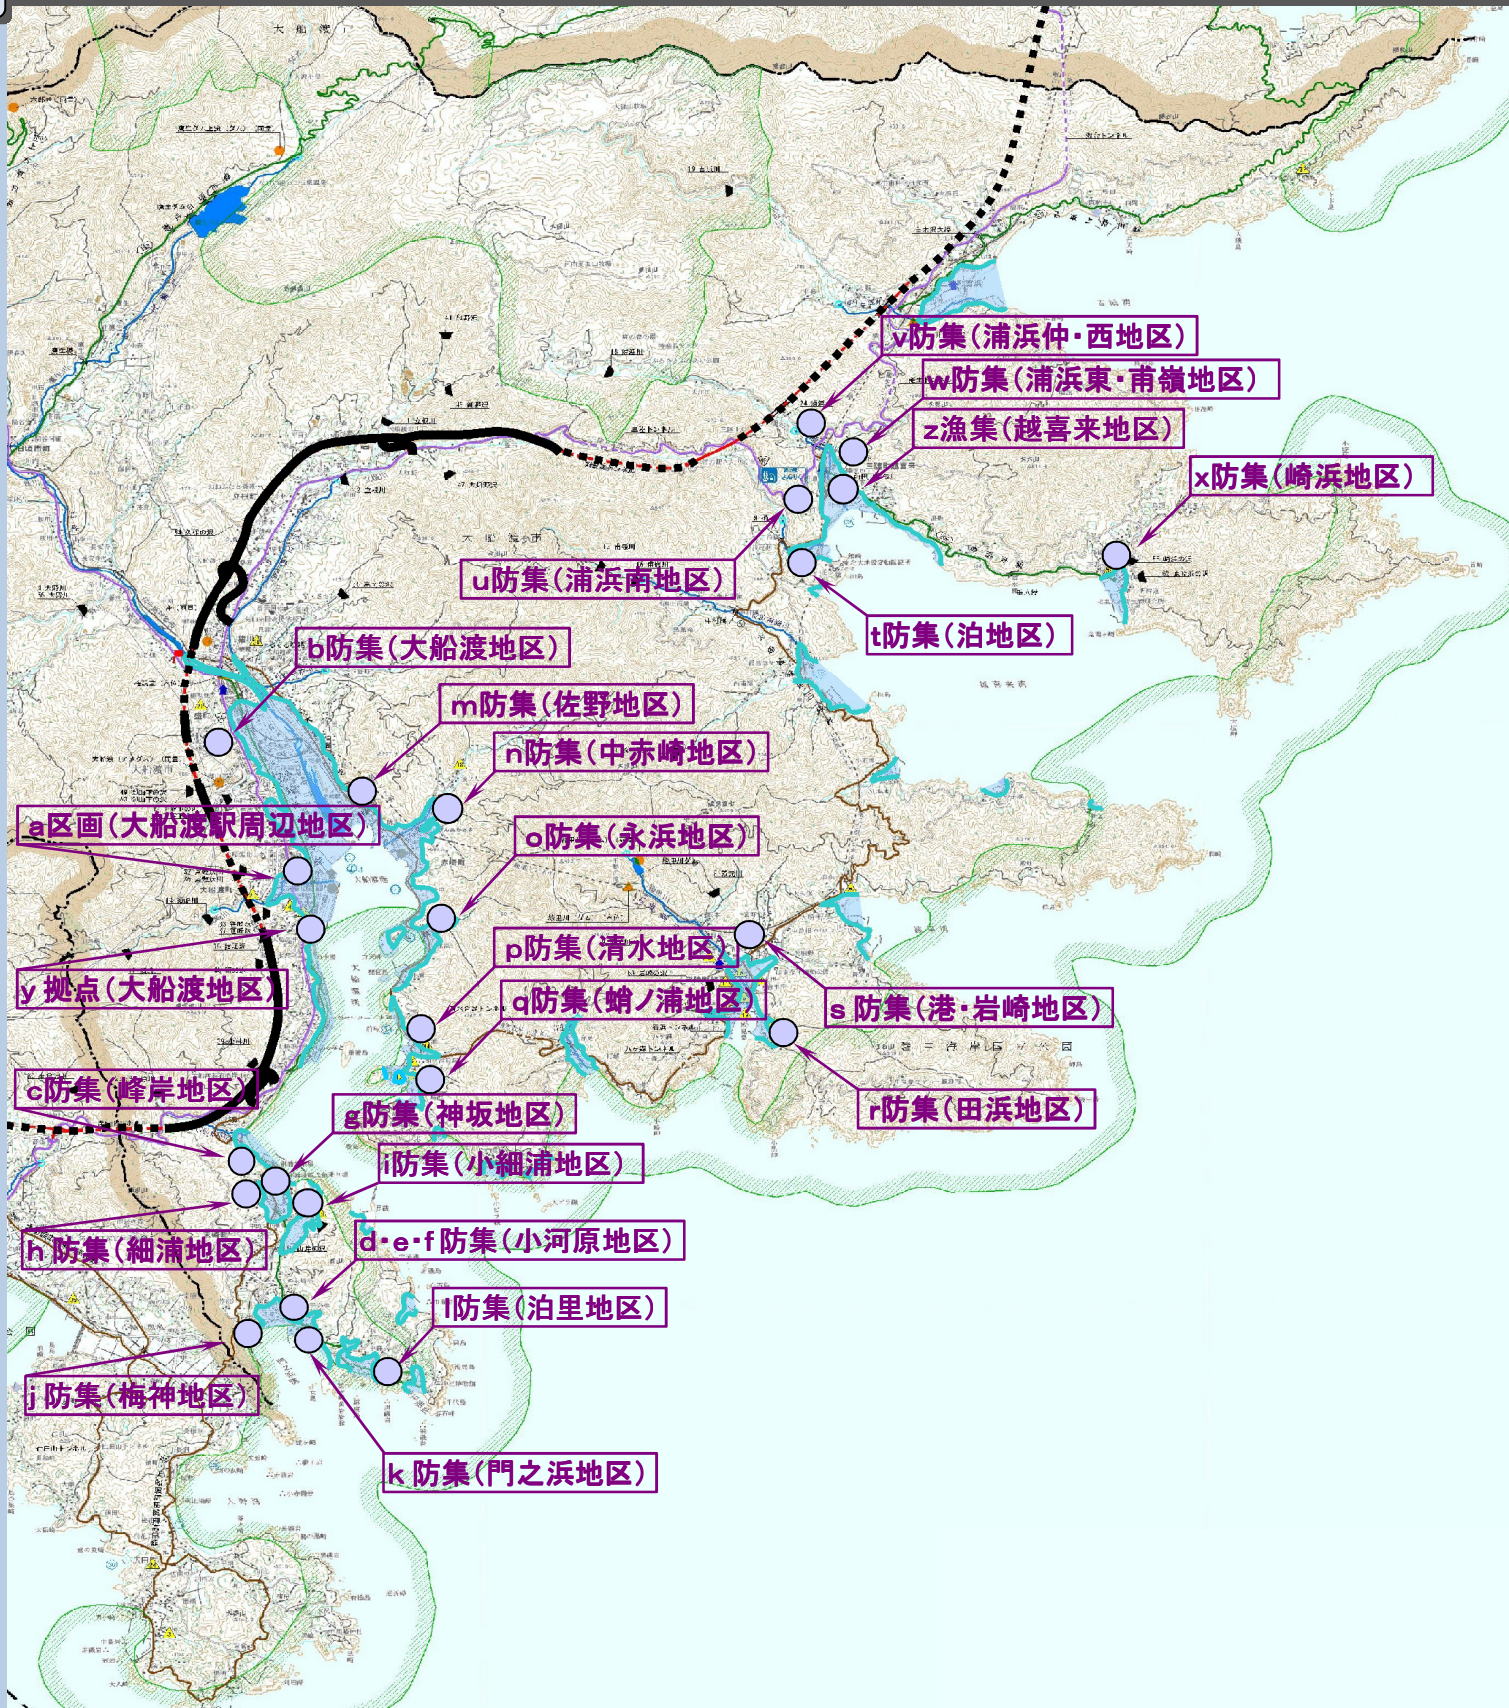

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール													
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)						
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30			
復興 まちづくり	土地区画整理	市	a 大船渡 駅周辺地区	区域面積：約33.8ha 対象戸数300戸 (民250戸・公50戸)	用地、設計等							民35戸	公50戸 H28以降-民215戸					
			工事															
			b 大船渡地区	対象戸数：18戸 (民18戸)	用地、設計等		工事				民18戸							
			c 峰岸地区	対象戸数：21戸 (民21戸)	用地、設計等		★工事				民21戸							
			d 小河原地区 (平林)	対象戸数：29戸 (民29戸)	用地、設計等		工事				民29戸							
			e 小河原地区 (上山)	対象戸数：6戸 (民6戸)	用地、設計等		工事				民6戸							
			f 小河原地区 (鶴巻)	対象戸数：6戸 (民6戸)	用地、設計等		★工事				民6戸							
			g 神坂地区	対象戸数：9戸 (民9戸)	用地、設計等		工事				民9戸							
			h 細浦地区	対象戸数：13戸 (民13戸)			★工事				民13戸							
			i 小細浦地区	対象戸数：8戸 (民8戸)	■H25.12完了													
			j 梅神地区	対象戸数：13戸 (民13戸)	用地、設計等		★工事				民13戸							
			k 門之浜地区	対象戸数：13戸 (民13戸)	■H26.3完了													
			l 泊里地区	対象戸数：17戸 (民17戸)	用地、設計等		工事				民17戸							
			m 佐野地区	対象戸数：5戸 (民5戸)			★						民5戸					
			n 中赤崎地区	対象戸数：77戸 (民77戸)	用地、設計等		工事				民77戸							
			o 永浜地区	対象戸数：32戸 (民32戸)	用地、設計等		★工事				民32戸							
			p 清水地区	対象戸数：6戸 (民6戸)			★						民6戸					
			q 蛸ノ浦地区	対象戸数：16戸 (民16戸)	用地、設計等		工事				民16戸							
			r 田浜地区	対象戸数：12戸 (民12戸)			★工事						民12戸					
			s 港・岩崎地区	対象戸数：23戸 (民23戸)			★工事						民23戸					
			t 泊地区	対象戸数：13戸 (民13戸)	■H26.1完了													
			u 浦浜南地区	対象戸数：11戸 (民11戸)			★工事						民11戸					
			v 浦浜仲・西地区	対象戸数：10戸 (民10戸)			★工事						民10戸					
			w 浦浜東・ 甫嶺地区	対象戸数：9戸 (民9戸)	用地、設計等		工事				民9戸							
	x 崎浜地区	対象戸数：21戸 (民21戸)			★工事						民21戸							
	津波復興拠点	市	y 大船渡地区	区域面積：約2.3ha (先行整備区域)			★工事											
				区域面積：約5.4ha (第2段階整備区域)	用地、設計等		工事											
漁業集落防災 機能強化	市	z 越喜来地区	集落道、用地造成他 対象戸数：30戸 (民30戸)	用地、設計等		工事				民30戸								


基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	街路整備	県	路線数:1路線	整備延長:約3km	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	まちづくり 連携道路		1 (一)横浜港線	越喜来	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
			2 (主)大船渡広田 陸前高田線	船河原	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
			3 (一)碓石海岸線	末崎～碓石	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
			4 (主)大船渡 綾里三陸線	越喜来	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
			5 (主)大船渡 綾里三陸線	赤崎	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	吉浜釜石道路 (吉浜～釜石)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.2.25起工式										
			吉浜道路	★用地・工事の推進											
	復興関連道路	県	B (主)大船渡 綾里三陸線	小石浜	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.4着工										
港 湾	大船渡港	国	1 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=535m	★工事(平成27年度完成予定)										
		県	2 野々田地区	(災害復旧) 防波堤L=170m、 須崎防波堤L=60m、 -4.5m岸壁L=150m、 -3.0m物揚場L=87m他	★工事										
			3 茶屋前地区	(災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、 -6.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、 -4.0m物揚場L=197m他	用地、 設計等	★工事									
			4 山口地区	(災害復旧) 防波堤L=64m、 さん橋(-2.0m)L=32m、 物揚場L=70m他	★工事										
			5 永浜地区	(災害復旧) 防波堤L=192m、 -2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場138m	★工事										
			6 清水地区	(災害復旧) 防波堤L=109m、 物揚場L=285m、 船揚場L=98m	★工事										
			7 赤土倉地区	(災害復旧) 南防波堤L=79m、 北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場 L=104m他	★工事										
教 育	小学校	市	1 赤崎小学校	(災害復旧) 移転	用地、 設計等	工事				移転完了まで蛸ノ浦小を使用					
			2 越喜来小学校	(災害復旧) 移転	用地、 設計等	★工事				H24 甫嶺小、崎浜小と統合 移転完了まで旧甫嶺小を使用					
	中学校	3 赤崎中学校	(災害復旧) 移転	用地、 設計等	工事				移転完了まで仮設校舎を使用						

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市4/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

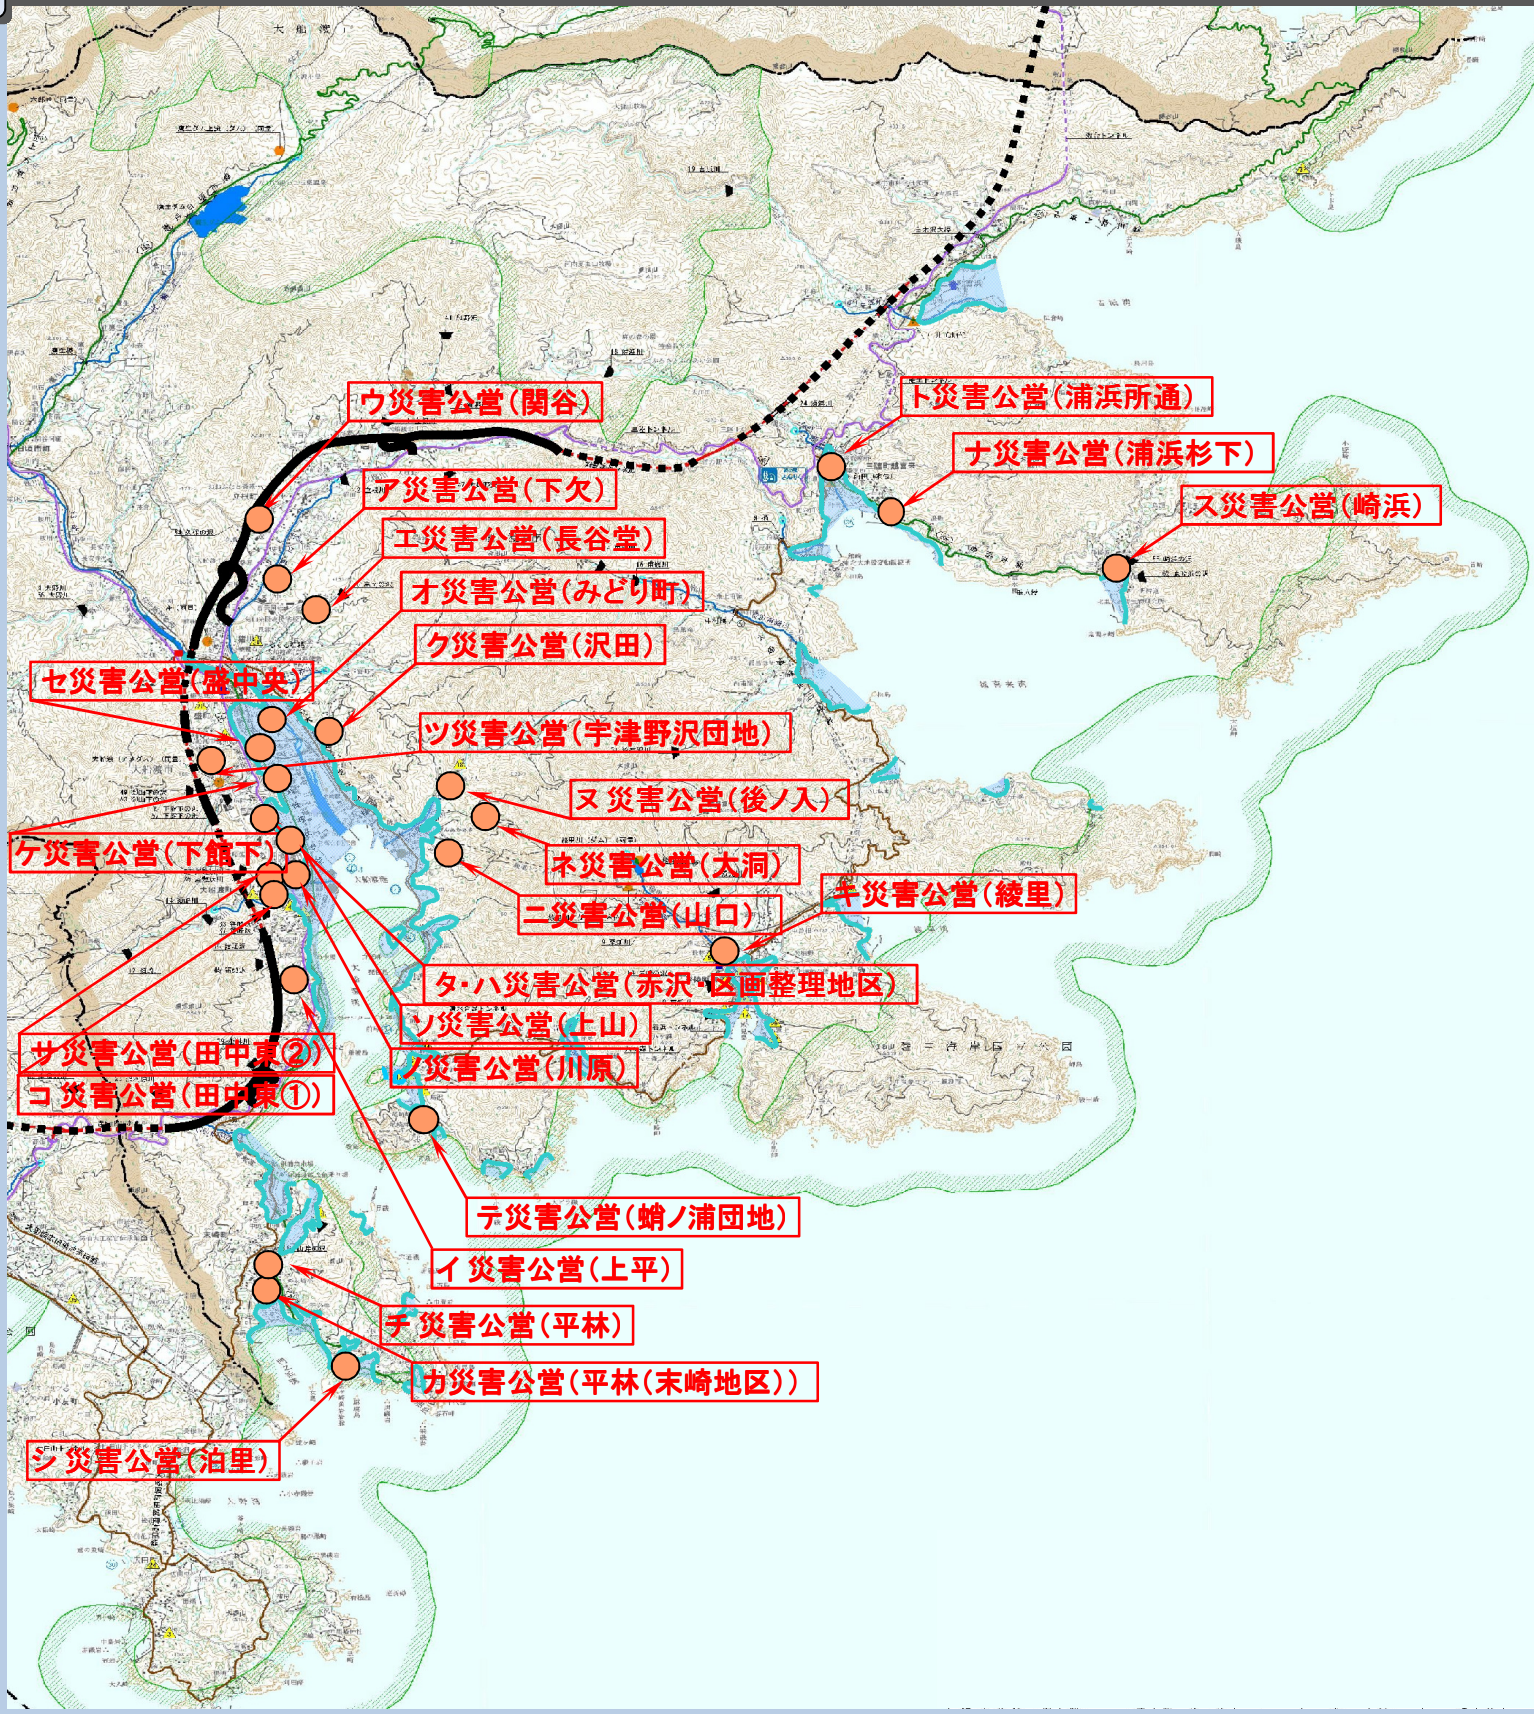


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 下欠 (単独)	RC造3階 予定戸数: 33戸	用地、設計等		★工事	33戸						
			イ 上平 (単独)	RC造7階 予定戸数: 65戸	用地、設計等		★工事		65戸					
			ウ 関谷 (単独)	RC造5階 予定戸数: 50戸	用地、設計等		工事		50戸					
			エ 長谷堂 (単独)	RC造3階 予定戸数: 53戸	用地、設計等		★工事	53戸						
			オ みどり町 (単独)	RC造6階 予定戸数: 147戸	用地、設計等		工事		147戸					
			カ 平林 (単独)	RC造4階 予定戸数: 56戸	用地、設計等		工事		56戸					
			キ 綾里 (単独)	RC造3階 予定戸数: 30戸	用地、設計等		★工事	30戸						
			ク 沢田 (単独)	RC造3階 予定戸数: 20戸	用地、設計等		工事		20戸					
	設計・施工 一括選定	県	ケ 下館下 (単独)	RC造7階 予定戸数: 53戸	用地、設計等		工事		53戸					
			コ 田中東団地① (単独)	木造2階 予定戸数: 12戸	■H25.3完成									
			サ 田中東団地② (単独)	木造2階 予定戸数: 7戸	■H26.3完成									
			シ 泊里団地 (単独)	木造平屋 予定戸数: 6戸		用地、設計等		工事	6戸					
	買取 (雇用促進住宅)	市	ス 崎浜団地 (単独)	木造平屋 予定戸数: 7戸		用地、設計等		工事	7戸					
			セ 盛中央 (単独)	RC造5階 予定戸数: 44戸	■H24.12完成									
			ソ 上山団地 (単独)	RC造3階 予定戸数: 11戸		★工事		11戸						
			タ 赤沢団地 (単独)	RC造5階 予定戸数: 23戸		★工事		23戸						
			チ 平林団地 (単独)	RC造3階 予定戸数: 11戸		★工事		11戸						
			ツ 宇津野沢団地 (単独)	RC造3階 予定戸数: 20戸		★工事		20戸						
			テ 蛸ノ浦団地 (単独)	RC造3階 予定戸数: 14戸		用地、設計等		工事	14戸					
			ト 浦浜所通団地 (単独)	RC造3階 予定戸数: 17戸		用地、設計等		工事	17戸					
			ナ 浦浜杉下団地 (単独)	木造平屋 予定戸数: 6戸		用地、設計等		工事	6戸					
			ニ 中赤崎 山口団地 (単独)	RC造3階 予定戸数: 14戸		用地、設計等		工事	14戸					
			ヌ 中赤崎 後ノ入団地 (単独)	木造平屋 予定戸数: 6戸		用地、設計等		工事	6戸					
			ネ 中赤崎 大洞団地 (単独)	木造平屋 予定戸数: 6戸		用地、設計等		工事	6戸					
			ノ 川原 (単独)	RC造3階 予定戸数: 29戸		用地、設計等		工事	29戸					
			ハ 区画整理地区 (大船渡地区) (単独)	RC造5階 予定戸数: 50戸		用地、設計等		工事		50戸				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市5/5】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

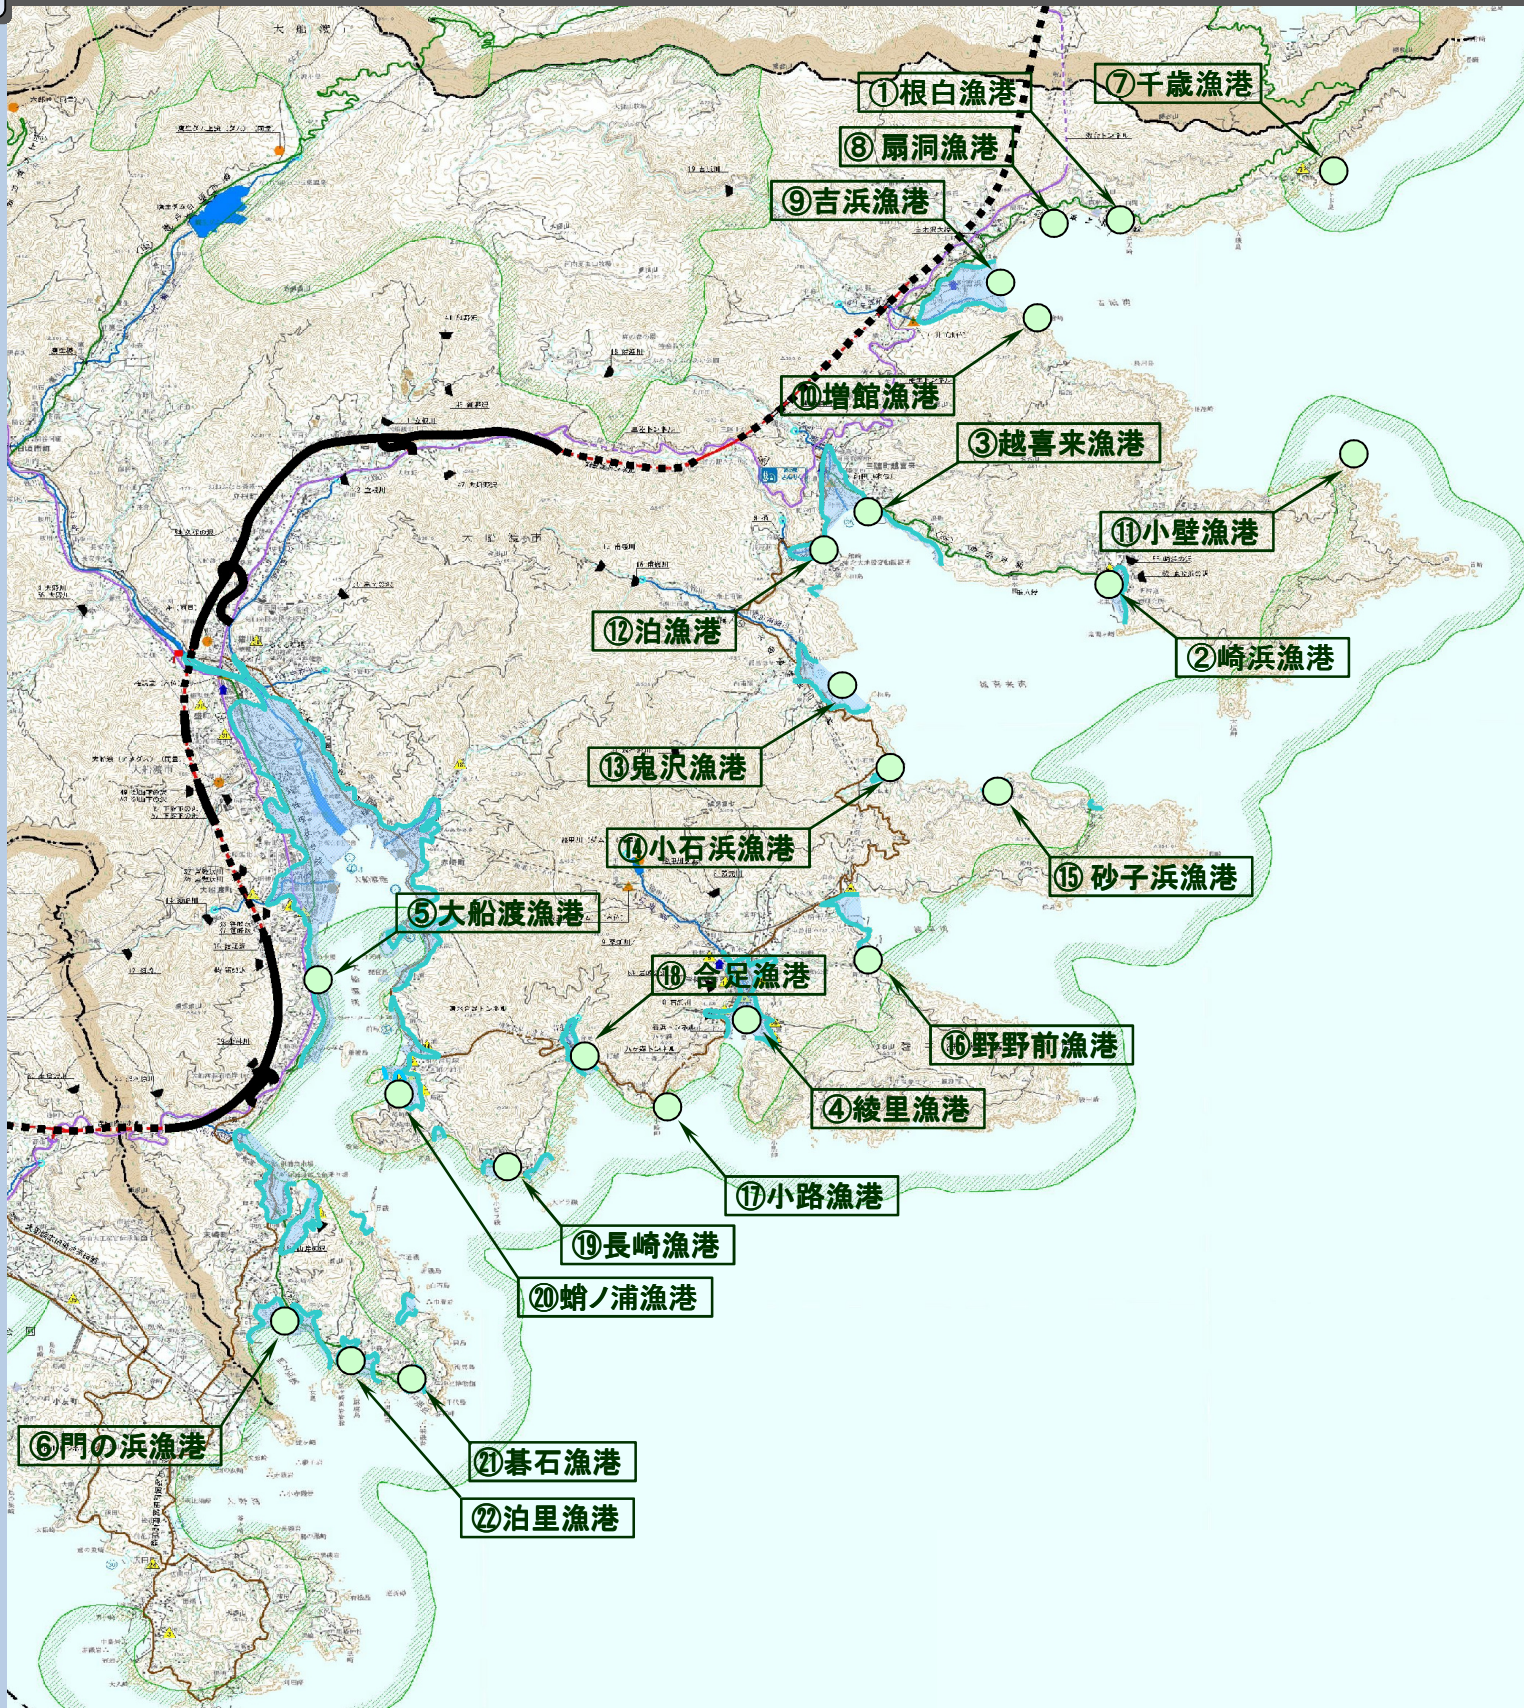


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
県	漁港	県	① 根白漁港	(漁港災害) 防波堤L=748m、 岸壁L=638m 他				★工事				
			② 崎浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=721m、 岸壁L=827m 他				★工事				
			③ 越喜来漁港	(漁港災害) 防波堤L=580m、 岸壁L=436m 他				★工事				
			④ 綾里漁港	(漁港災害) 防波堤L=402m、 岸壁L=1,102m 他				★工事				
			⑤ 大船渡漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,263m、 岸壁L=3,512m 他				★工事				
			⑥ 門の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=907m、 岸壁L=575m 他				★工事				
市	漁港	市	⑦ 千歳漁港	(漁港災害) 防波堤L=212m、 岸壁L=108m 他				★工事				
			⑧ 扇洞漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=23m 他			■H26.3完成					
			⑨ 吉浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=223m、 岸壁L=185m 他				★工事				
			⑩ 増館漁港	(漁港災害) 防波堤L=137m、 岸壁L=15m 他				★工事				
			⑪ 小壁漁港	(漁港災害) 岸壁L=44m 他				★工事				
			⑫ 泊漁港	(漁港災害) 防波堤L=283m、 岸壁L=202m 他				★工事				
			⑬ 鬼沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=329m、 岸壁L=209m 他				★工事				
			⑭ 小石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=422m、 岸壁L=239m 他				★工事				
			⑮ 砂子浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=176m、 岸壁L=247m 他				★工事				
			⑯ 野野前漁港	(漁港災害) 防波堤L=781m、 岸壁L=484m 他				★工事				
			⑰ 小路漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=65m 他				★工事				
			⑱ 合足漁港	(漁港災害) 防波堤L=81m、 岸壁L=45m 他				★工事				
			⑲ 長崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=482m、 岸壁L=475m 他				★工事				
			⑳ 蛸ノ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=239m、 岸壁L=972m 他				★工事				
			㉑ 基石漁港	(漁港災害) 防波堤L=123m、 岸壁L=104m 他				★工事				
			㉒ 泊里漁港	(漁港災害) 防波堤L=211m、 岸壁L=248m 他				★工事				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市1/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

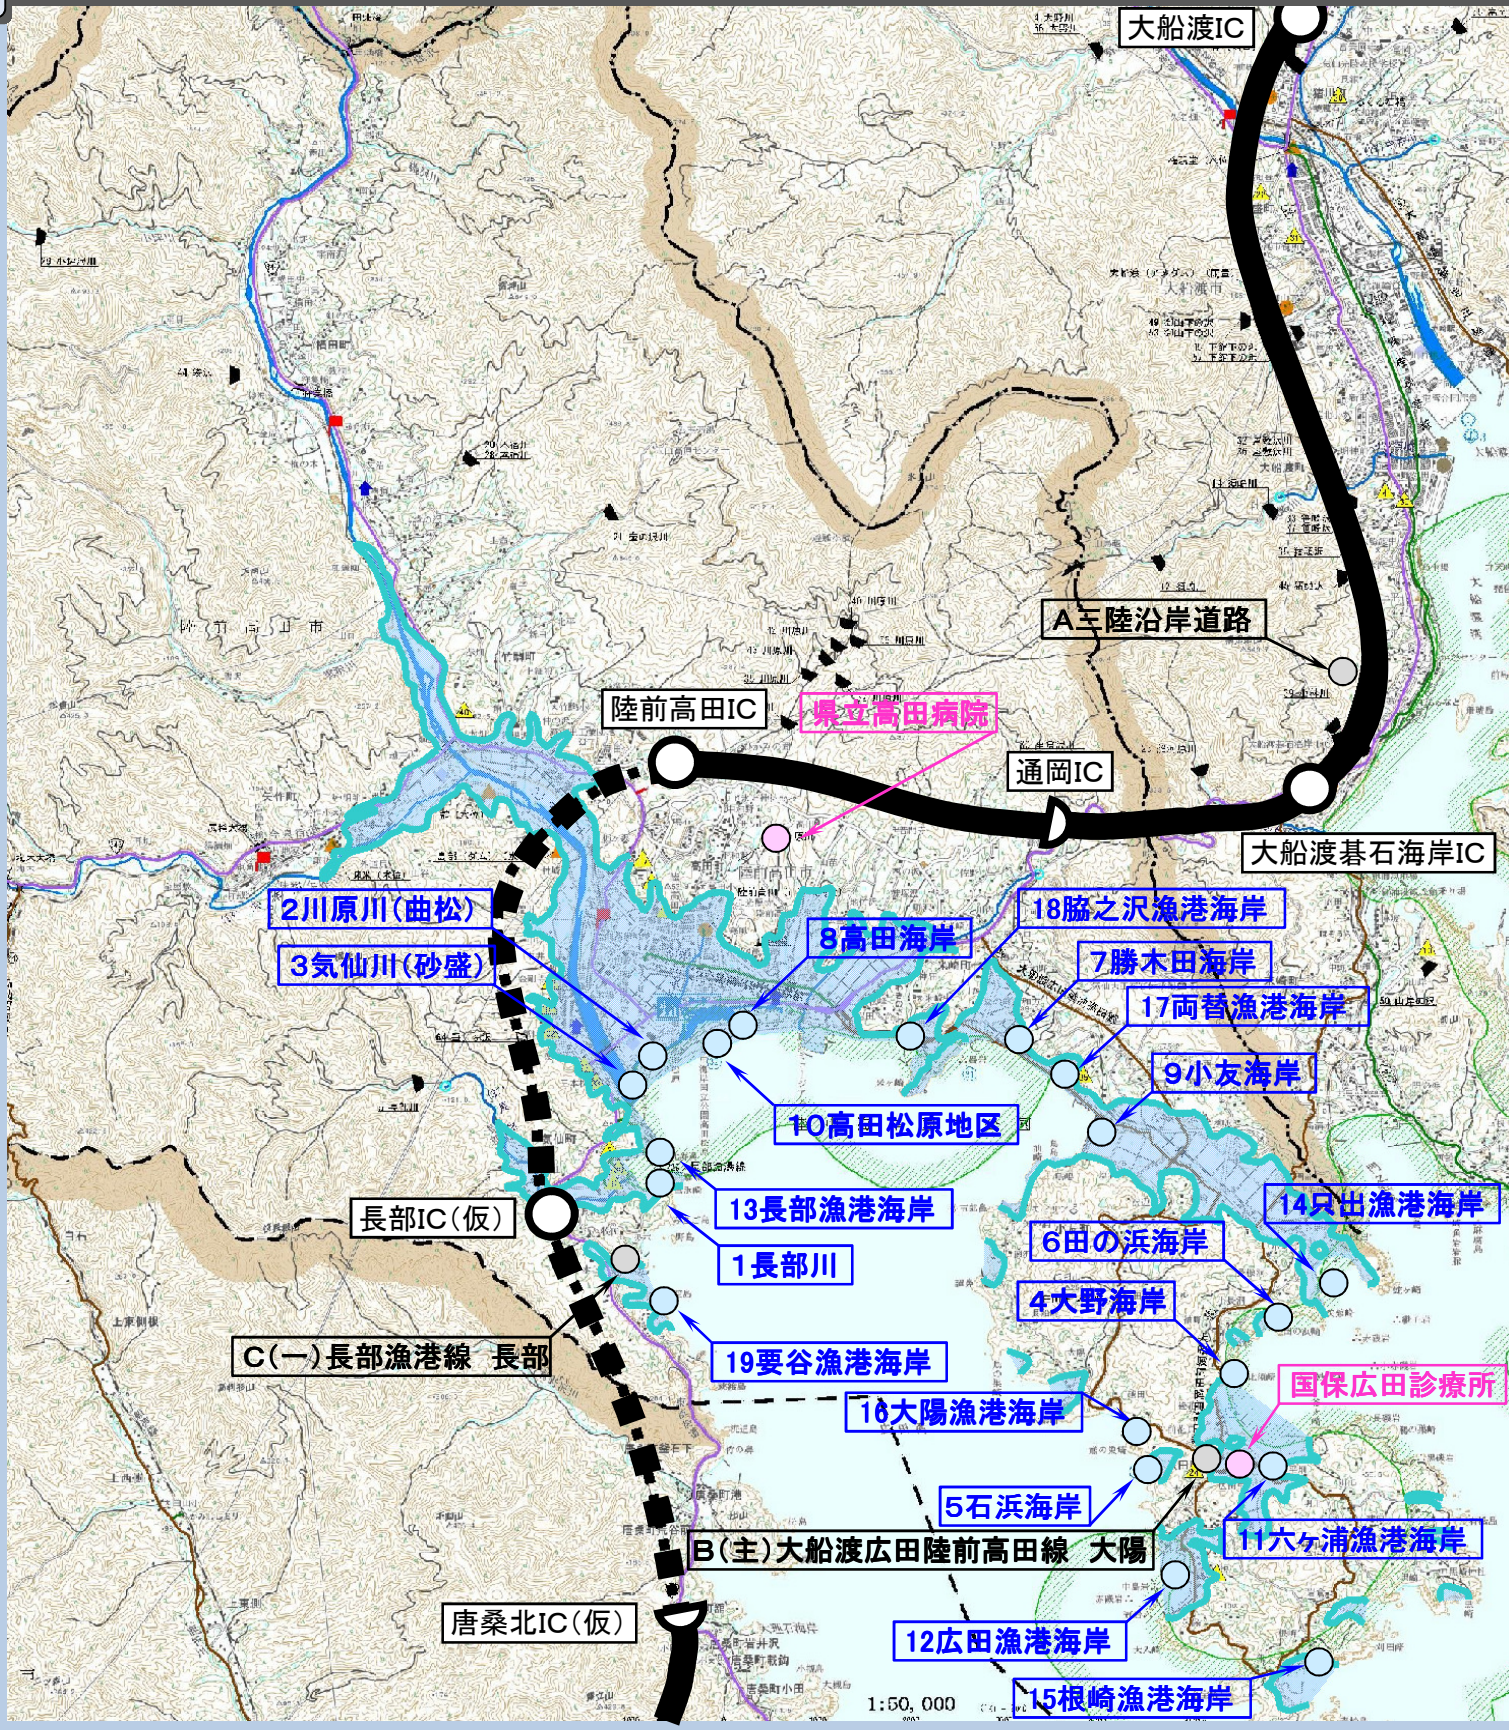


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29
海岸保全施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	用地、設計等	★工事								
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	用地、設計等	★工事								
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基		★工事								
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 離岸堤L=0.3km他	用地、設計等	★工事								
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 離岸堤L=0.12km他	■H26.3完成									
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、 消波工L=0.02km他	■H25.1完成									
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	用地、設計等	★工事								
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、 水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	用地、設計等	★工事								
	農地海岸	9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=3基	用地、設計等	★工事									
	林野海岸	10 高田松原地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=1.3km	用地、設計等	工事									
	漁港海岸	市	11-1 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事								
			11-2 六ヶ浦(本港地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他		用地、設計等				工事				
			12-1 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=10基 他		★工事								
			12-2 広田(後浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他		用地、設計等	工事							
			13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事								
			14 只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基 他	用地、設計等	工事								
			15 根岬漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他	用地、設計等	工事								
			16 大陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他	用地、設計等	工事								
			17 両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=3基 他	用地、設計等	工事								
復興道路等	復興関連道路	国	A 三陸沿岸道路	高田道路	■H26.3.23供用開始									
				唐桑高田道路 (唐桑北～陸前高田)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				◆H25.2.6起工式					
				B (主) 大船渡広田陸前高田線	大陽	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手								
医療	医科診療所	市	国保広田診療所	診療所施設整備	■H24.8.24供用開始									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市2/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

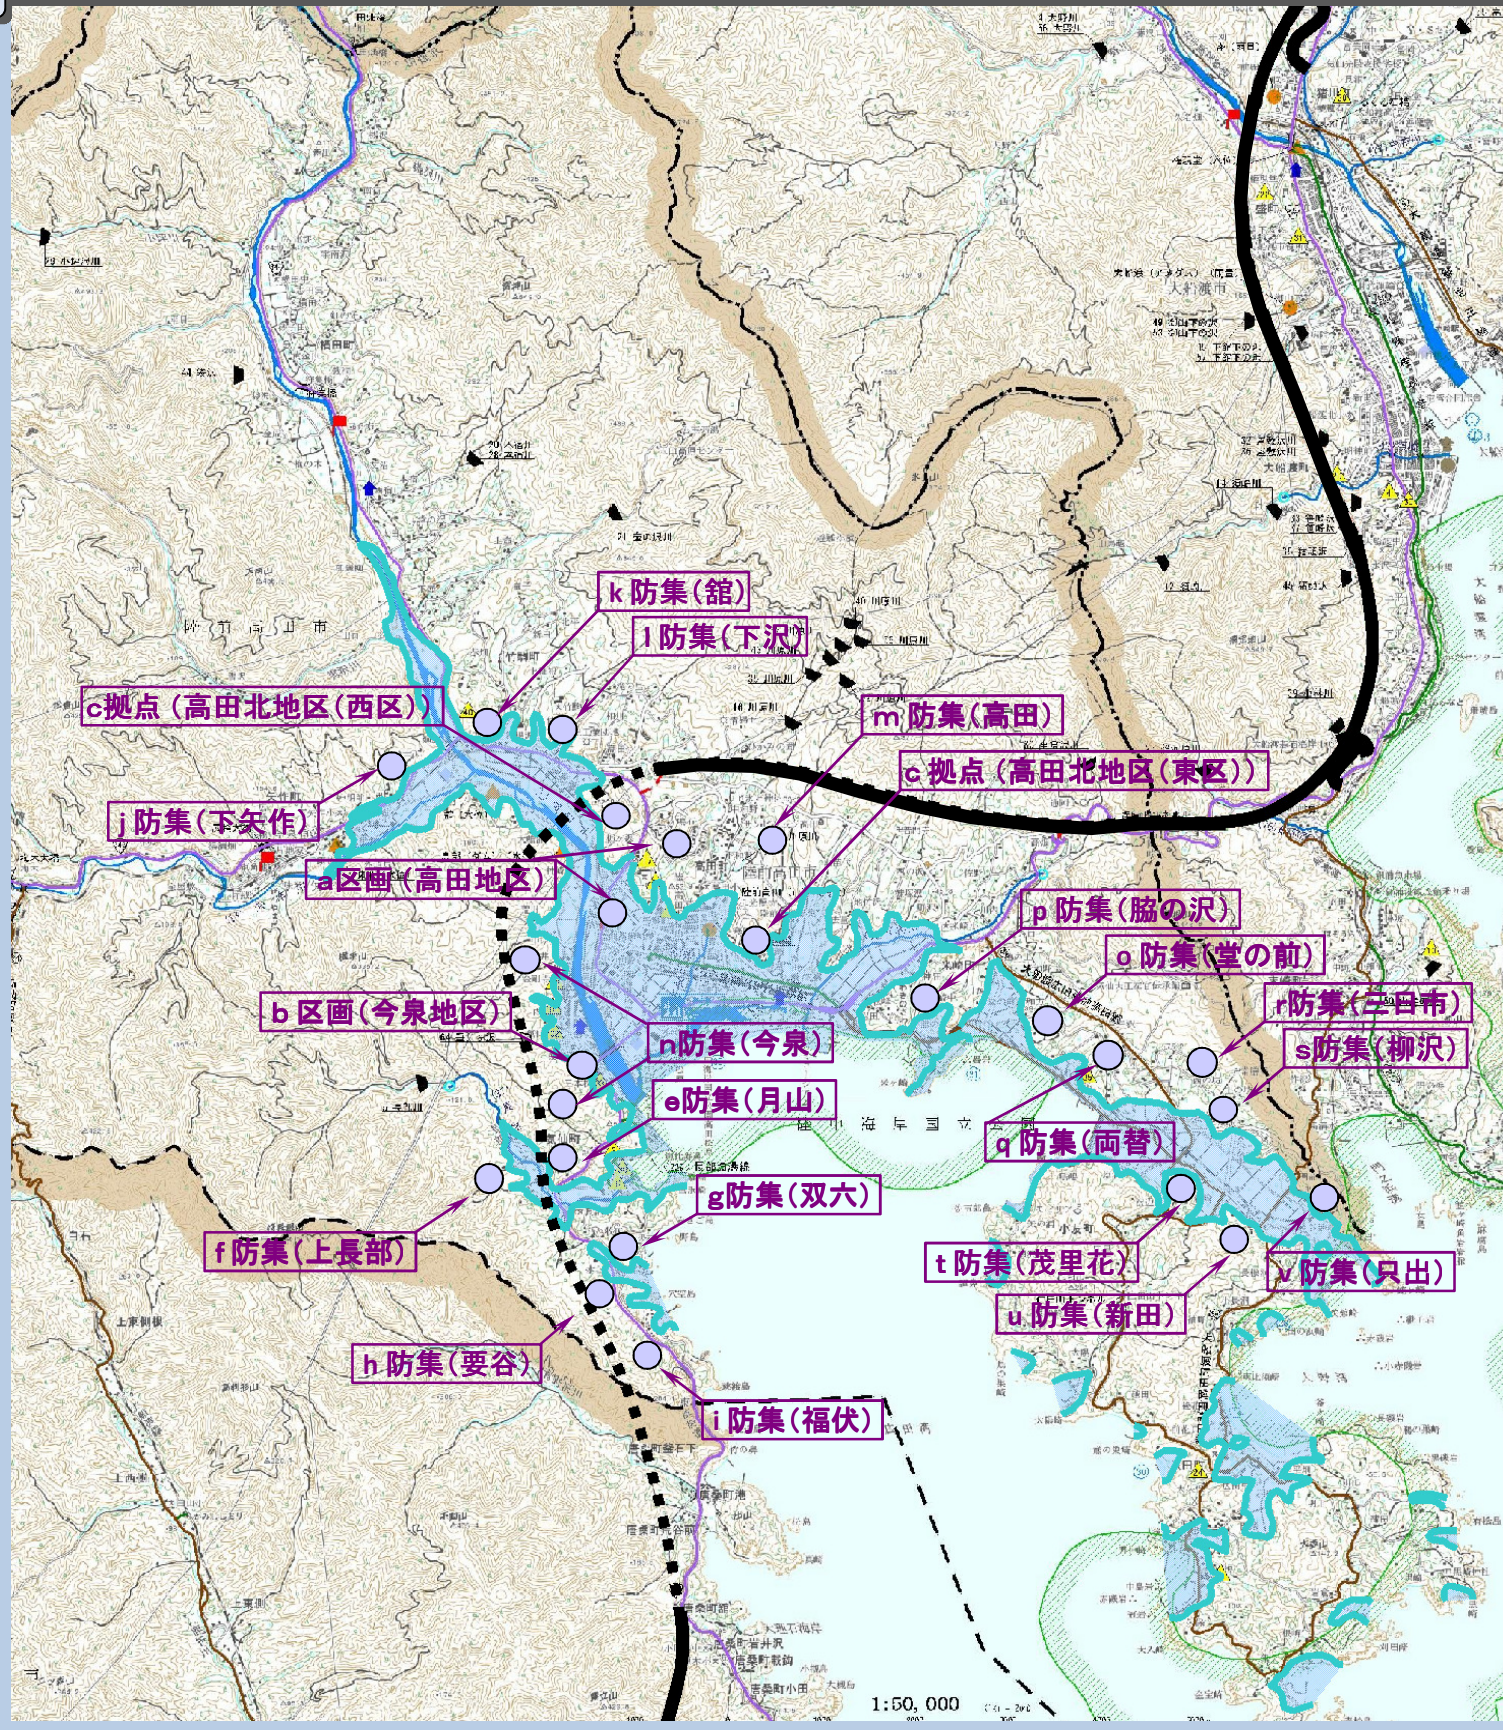


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	土地区画整理	市	a 高田地区	区域面積:189.8ha 対象戸数1,504戸 (民1,384戸・公120戸)	<div><div>用地、設計等</div><div>★工事</div></div>										
			b 今泉地区	区域面積:113.0ha 対象戸数505戸 (民341戸・公164戸)	<div><div>用地、設計等</div><div>★工事</div></div>										
			津波復興拠点	c 高田北地区	(西区) 区域面積:9.6ha	<div><div></div><div>★工事</div></div>									
				(東区) 区域面積:9.1ha	<div><div></div><div>★工事</div></div>										
	d 高田南地区		区域面積:19.8ha	<div><div>用地、設計等</div><div>工事</div></div>											
	防災集団移転		e 長部地区 (月山)	対象戸数:54戸 (民54戸)	<div><div>用地、設計等</div></div>	<div><div>★工事</div></div>									
			f 長部地区 (上長部)	対象戸数:18戸 (民18戸)	<div><div>■H26.1完成</div></div>										
			g 長部地区 (双六)	対象戸数:12戸 (民12戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>									
			h 長部地区 (要谷)	対象戸数:7戸 (民7戸)	<div><div>■H25.12完成</div></div>										
			i 長部地区 (福伏)	対象戸数:7戸 (民7戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>									
			j 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下矢作)	対象戸数:6戸 (民6戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>									
			k 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (館)	対象戸数:10戸 (民10戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>									
			l 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下沢)	対象戸数:6戸 (民6戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>									
			m 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (高田)	対象戸数:56戸 (民56戸)	<div><div>★工事</div></div>										
			n 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (今泉)	対象戸数:55戸 (民55戸)	<div><div>★工事</div></div>										
			o 米崎地区 (堂の前)	対象戸数:5戸 (民5戸)	<div><div>■H25.9完成</div></div>										
			p 米崎地区 (脇の沢)	対象戸数:131戸 (民71戸・公60戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>									
			q 小友地区 (両替)	対象戸数:15戸 (民15戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>									
			r 小友地区 (三日月市)	対象戸数:5戸 (民5戸)	<div><div>■H25.11完成</div></div>										
			s 小友地区 (柳沢)	対象戸数:9戸 (民9戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>									
t 小友地区 (茂里花)		対象戸数:5戸 (民5戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>											
u 小友地区 (新田)	対象戸数:8戸 (民8戸)	<div><div>■H26.3完成</div></div>													
v 小友地区 (只出)	対象戸数:14戸 (民14戸)	<div><div></div></div>	<div><div>★工事</div></div>												

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市3/4】

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

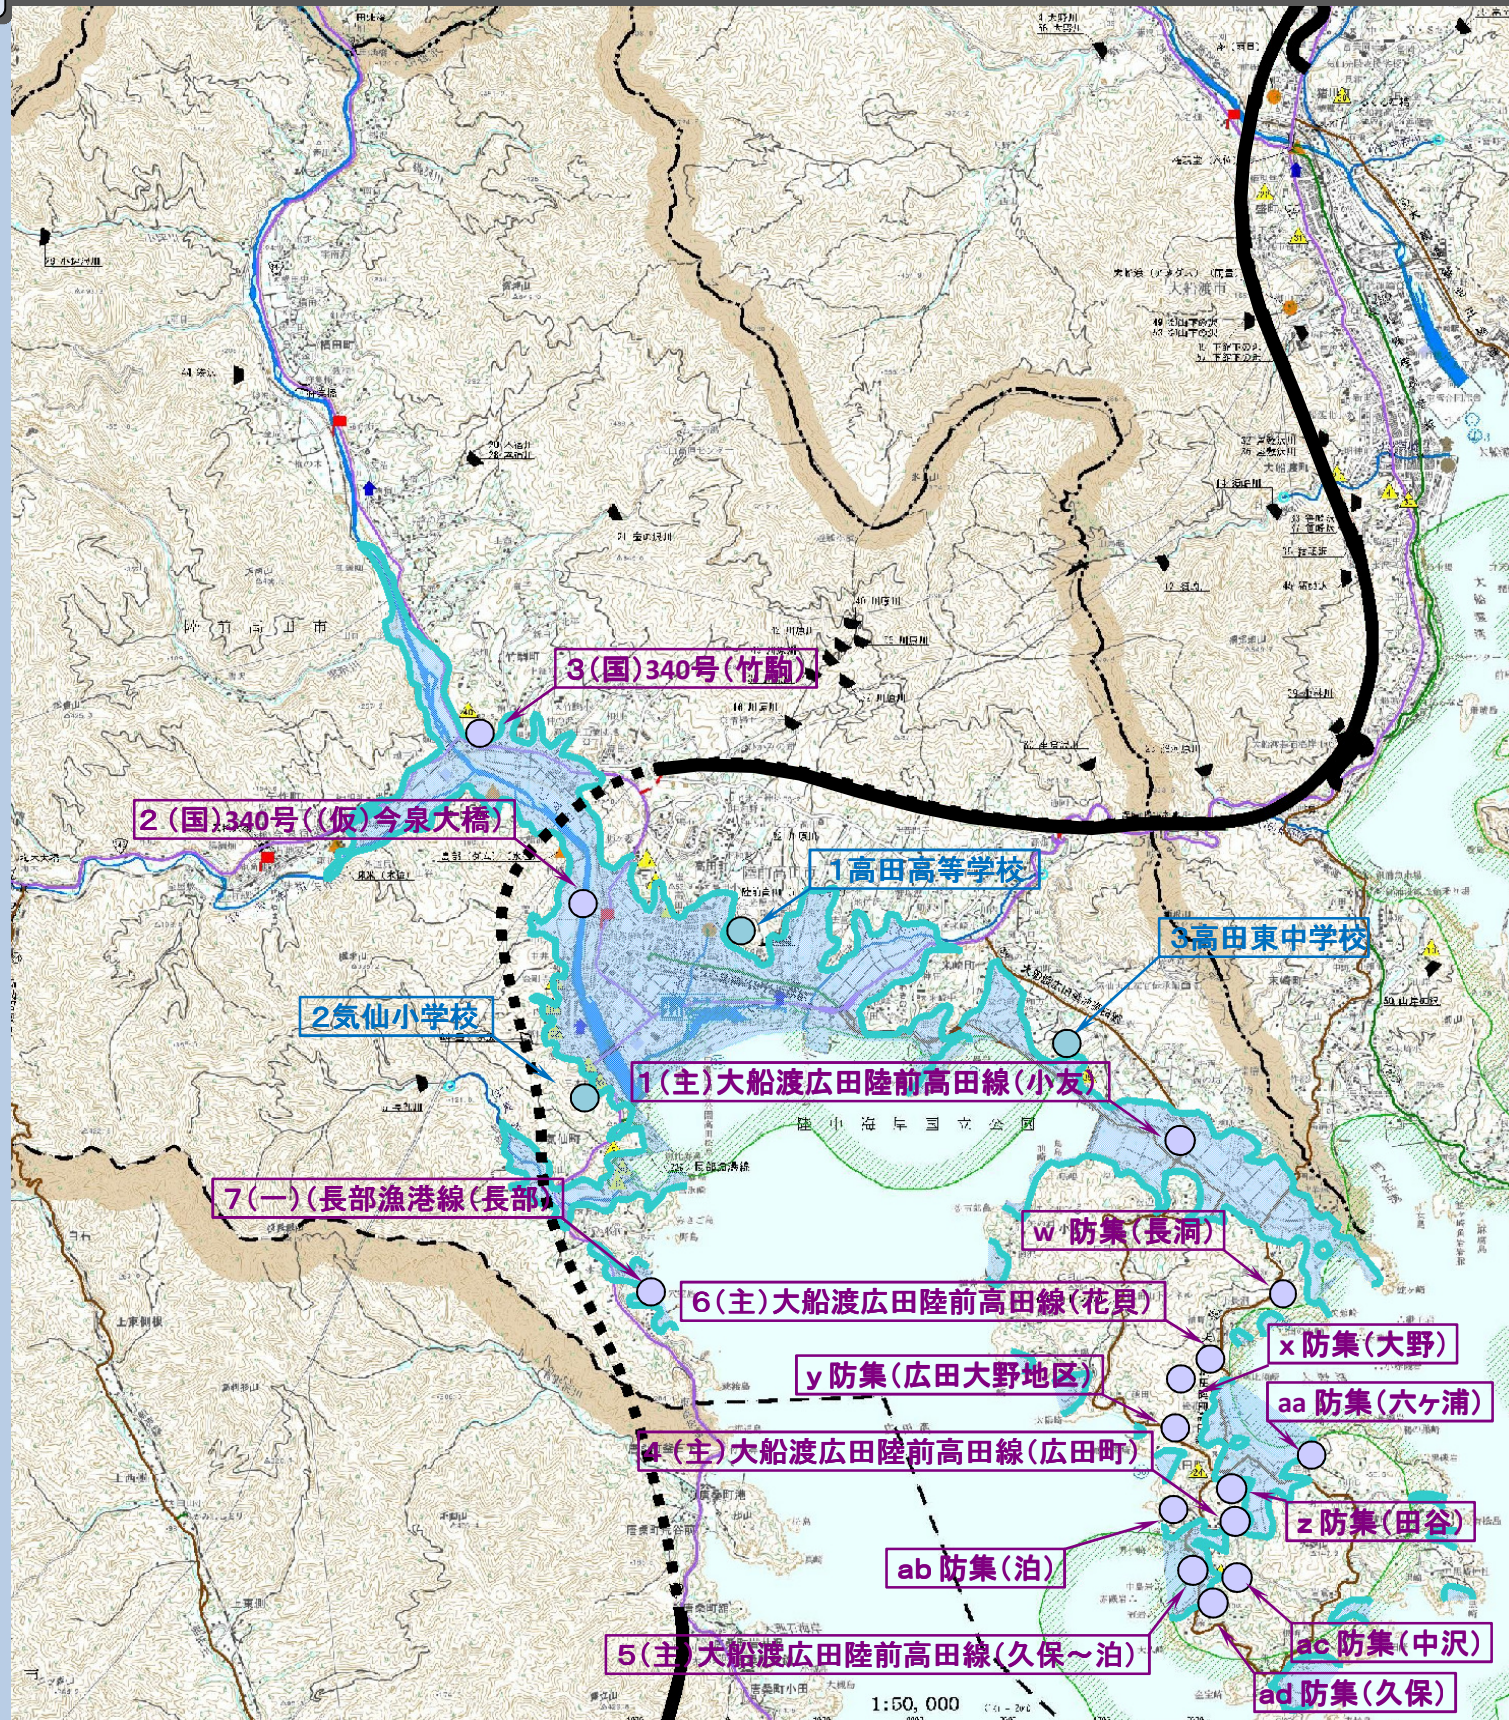


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 （基盤復興期間）		第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	防災集団移転	市	w 広田地区 （長洞）	対象戸数：14戸 （民14戸）			★工事	民14戸						
			x 広田地区 （大野）	対象戸数：7戸 （民7戸）			★工事	民7戸						
			y 広田地区 （広田大野）	対象戸数：65戸 （民25戸・公40戸）			★工事	民25戸 公40戸						
			z 広田地区 （田谷）	対象戸数：41戸 （民41戸）			★工事	民41戸						
			aa 広田地区 （六ヶ浦）	対象戸数：7戸 （民7戸）			★工事	民7戸						
			ab 広田地区 （泊）	対象戸数：25戸 （民25戸）			★工事	民25戸						
			ac 広田地区 （中沢）	対象戸数：9戸 （民9戸）		■H25.12完成	民9戸							
			ad 広田地区 （久保）	対象戸数：6戸 （民6戸）			★工事	民6戸						
まちづくり 連携道路	県		1 (主)大船渡広田 陸前高田線	小友			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			2 (国)340号	(仮)今泉大橋・ 大石沖			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			3 (国)340号	竹駒			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			4 (主)大船渡広田 陸前高田線	広田町			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			5 (主)大船渡広田 陸前高田線	久保～泊			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			6 (主)大船渡広田 陸前高田線	花貝			測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手							
			7 (一)長部漁港線	長部			測量、設計、用地買収等を行い、 順次工事に着手							
教育	高等学校	県	1 高田高等学校	(災害復旧) 校舎、第一体育館、第 二体育館・柔剣道場・ 防災対応施設		用地、 設計等	★工事							
	小学校	市	2 気仙小学校	(災害復旧) 移転									H25 長部小と統合 移転完了まで現在の長部小を使用	
	中学校	市	3 高田東中学校	(災害復旧) 移転		用地、 設計等	★工事						H25 米崎中、小友中、広田中の3校が統合 移転完了まで現在の米崎中を使用	

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市4/4】



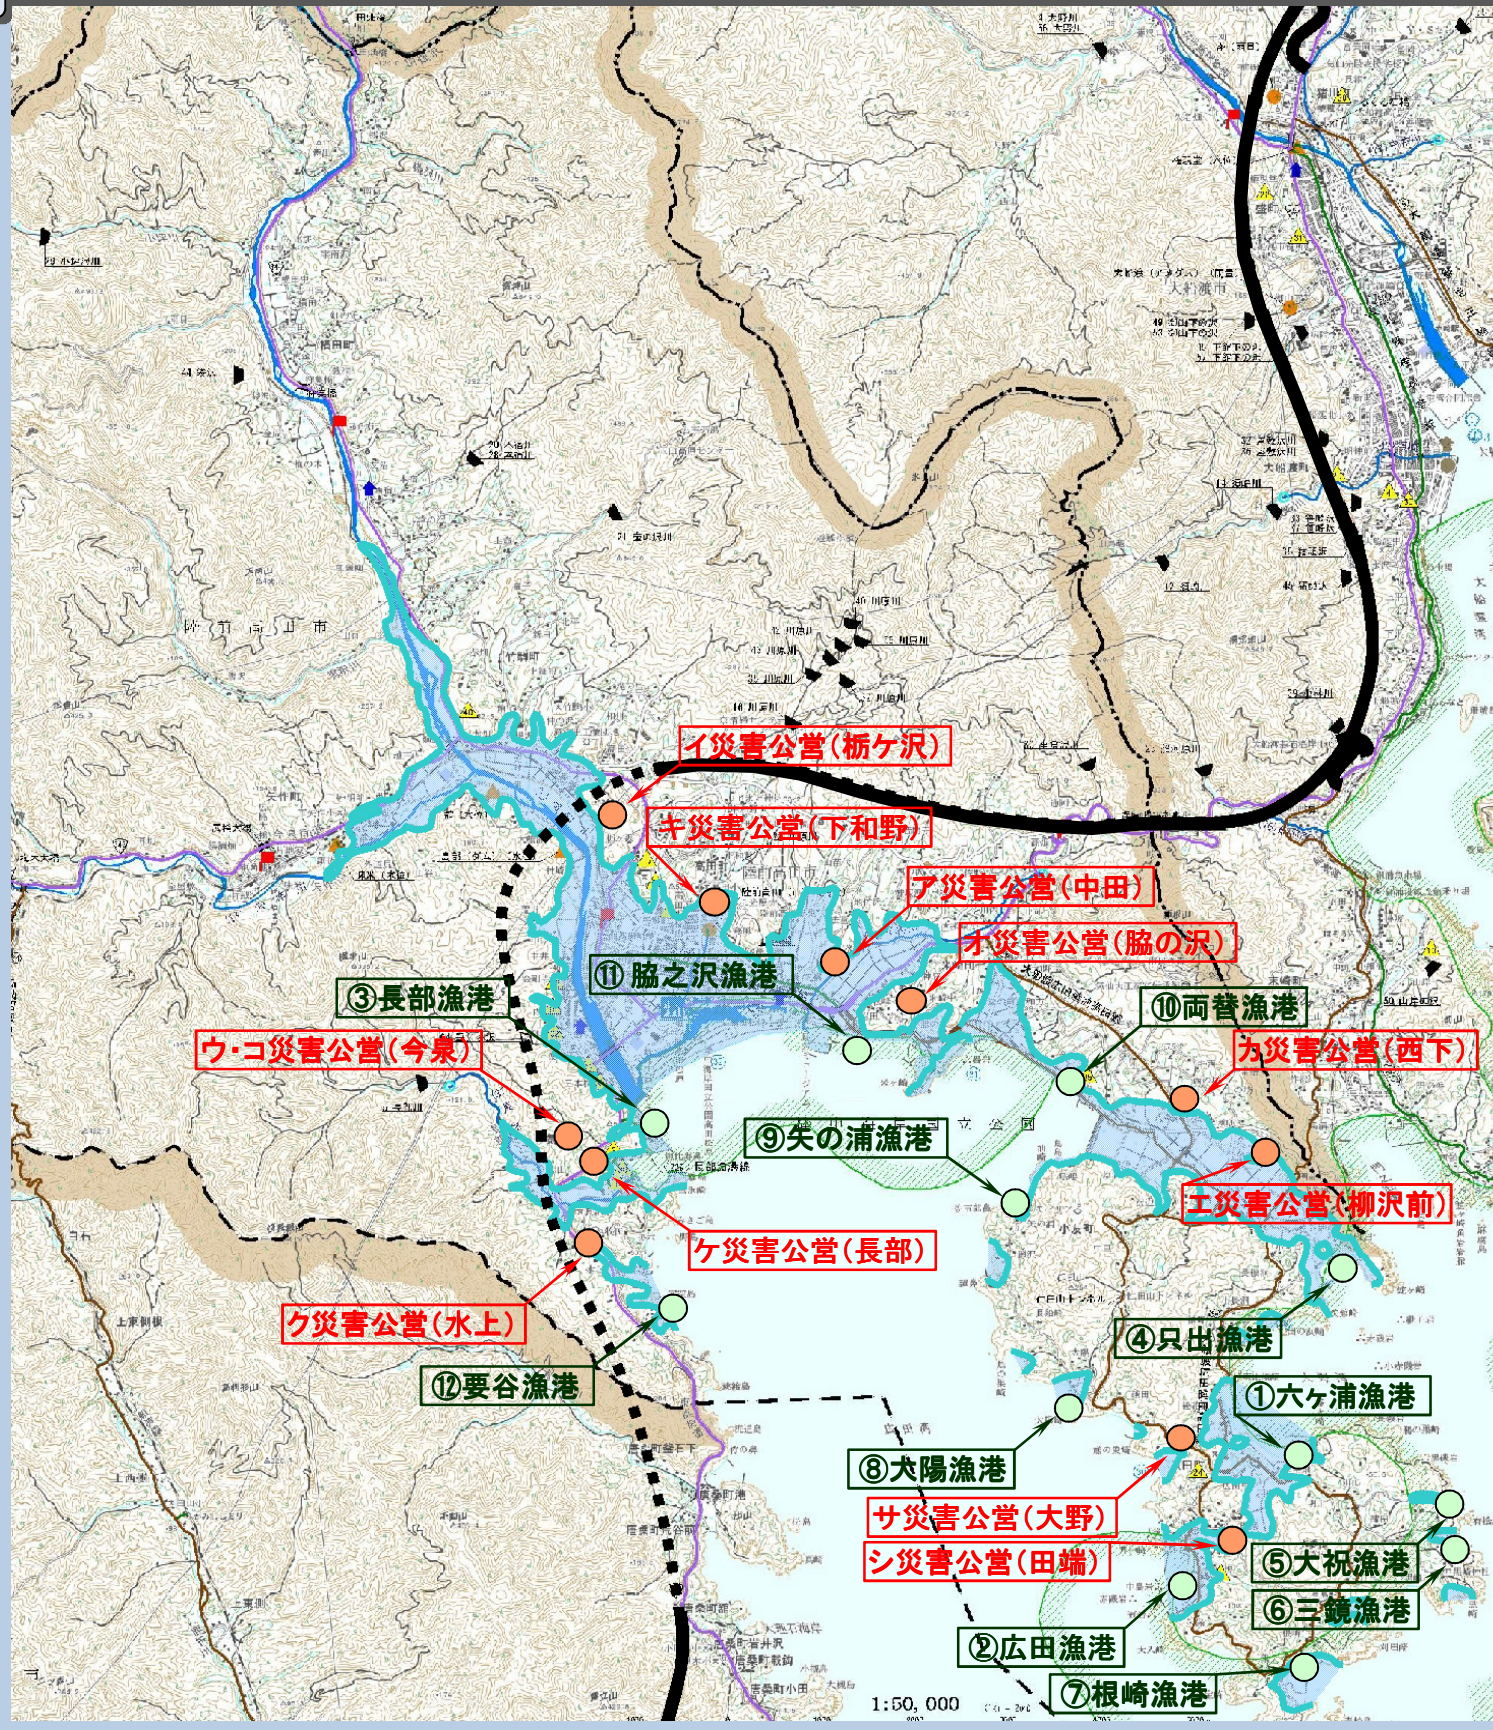

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）


「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)					第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 中田 (単独)	RC造8階 予定戸数:197戸	用地、設計等		★工事		197戸						
			イ 柄ヶ沢 (単独)	RC造8階 予定戸数:301戸	用地、設計等		工事		301戸						
			ウ 今泉 (区:今泉地区)	RC造 予定戸数:74戸	用地、設計等				74戸		工事				
			エ 柳沢前 (単独)	RC造3階 予定戸数:28戸	用地、設計等		★工事		28戸						
			オ 脇の沢 (防:米崎地区)	RC造 予定戸数:60戸			用地、設計等・工事		60戸						
	設計・施工一括選定	市	カ 西下 (単独)	RC造4階 予定戸数:40戸	用地、設計等		★工事		40戸						
			キ 下和野 (区:高田地区)	RC造7階 予定戸数:120戸	用地、設計等		★工事		120戸						
			ク 水上 (単独)	RC造3階 予定戸数:30戸	用地、設計等		★工事		30戸						
			ケ 長部 (区:今泉地区)	RC造3階 予定戸数:30戸	用地、設計等		工事		30戸						
			コ 今泉 (区:今泉地区)	RC造3階 予定戸数:60戸	用地、設計等				60戸		工事				
			サ 大野 (防:広田大野地区)	RC造3階 予定戸数:40戸	用地、設計等		工事		40戸						
			シ 田端 (単独)	RC造3階 予定戸数:20戸	用地、設計等		工事		20戸						
漁 港	漁 港	県	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、 岸壁L=474m 他	用地、設計等		★工事								
			② 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、 岸壁L=1,176m 他	用地、設計等		★工事								
			③ 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、 岸壁L=1,180m 他	用地、設計等		★工事								
		市	④ 只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=298m 他	用地、設計等		★工事								
			⑤ 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m、 岸壁L=43m 他	用地、設計等		★工事								
			⑥ 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、 岸壁L=36m 他	用地、設計等		★工事								
			⑦ 根岬漁港	(漁港災害) 防波堤L=354m、 岸壁L=150m 他	用地、設計等		★工事								
			⑧ 大陽漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=79m 他	用地、設計等		★工事								
			⑨ 矢の浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=136m、 岸壁L=183m 他	用地、設計等		★工事								
			⑩ 両替漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m、 岸壁L=254m 他	用地、設計等		★工事								
			⑪ 脇の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,149m、 岸壁L=531m 他	用地、設計等		★工事								
			⑫ 要谷漁港	(漁港災害) 防波堤L=556m、 岸壁L=279m 他	用地、設計等		★工事								

基準日：平成26年3月31日（平成26年4月24日公表）

復興道路	 : 免災後新規
	 : 継続事業
復興支援道路	 : 免災後新規
	 : 継続事業



区分	種 別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール									
						第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
						H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29
直轄事業	復興道路	東北横断自動車道 釜石秋田線	A	遠野市	遠野道路 (遠野住田～遠野)	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.6.16起工式									
			B	遠野市	遠野～宮守	★用地・工事の推進									
			C	遠野市 ～花巻市	宮守～東和	■H24.11.25供用開始									
		宮古盛岡横断道路	D	宮古市 ～盛岡市	区界道路 (区界～築川)	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
			E	盛岡市	都南川目道路	★用地・工事の推進 ※川目～田の沢 H27開通予定									
県事業	復興道路	宮古盛岡横断道路	a	盛岡市	築川道路	■H25.3.10供用開始									
	一般国道106号 (ICへアクセスする道路)	1	盛岡市	川目	■H25.3.10供用開始										
		国道107号	2	奥州市	札押道路	■H23.10.26供用開始									
	3		奥州市	梁川～口内	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	国道281号	4	岩手町	大坊	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
		5	岩手町	大坊の2	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	国道283号	6	遠野市	上郷道路	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	国道284号	7	一関市	真滝BP	■H24.8.7供用開始										
		8	一関市	室根BP	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.9着工										
		9	一関市	石法華	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	国道340号	10	遠野市	土淵BP	■H24.7.22一部供用開始 ■H25.12.25供用開始										
		11	遠野市 (宮古市)	立丸峠 ※宮古市の復興支援道路・国道340号立丸峠と同一箇所	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.3着工										
		12	九戸村	泥ノ木	★測量、設計、用地買収等を行い、 順次工事に着手 ◆H25.7着工										
	復興支援 道路	13	軽米町	駒板	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
		14	住田町	山谷	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
		15	葛巻町	四日市	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H26.3着工										
		16	九戸村	長興寺	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	国道342号	17	一関市	花泉BP	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ■H23.11.29一部供用開始										
		18	一関市	白崖	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	国道343号	19	一関市	大原	■H26.3.28供用開始										
		20	一関市	一ノ通	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	国道395号	21	軽米町	赤石峠	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	国道397号	22	住田町	子飼沢	■H25.9.30供用開始										
		23	奥州市	分限城～赤金	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
		24	住田町	高屋敷	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
		25	住田町	津付道路	★測量、設計、用地買収等を行い、 順次工事に着手										
		26	奥州市	小谷木橋	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
		(一)遠野住田線 (ICへアクセスする道路)	27	遠野市	新里	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
